


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la urbanizacion leon xiii del distrito de cayma-provincia de arequipa-departamento de arequipa iii etapa con CUI N° 2565969

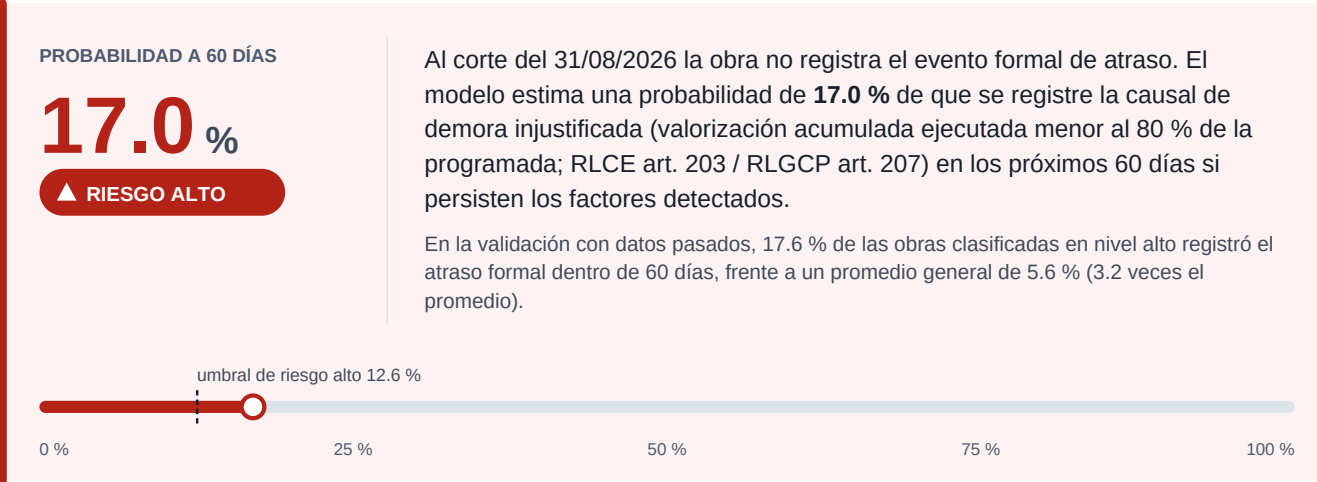


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	63 desde 15/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION LEON XIII DEL DISTRITO DE CAYMA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA III ETAPA CON CUI N° 2565969
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA
Contratista	G Y A CONTRATISTAS S R LTDA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CAYMA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2565969
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN LEÓN XIII DEL DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2405114
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,186,592.25
Cuaderno de obra digital	63 asientos entre 15/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

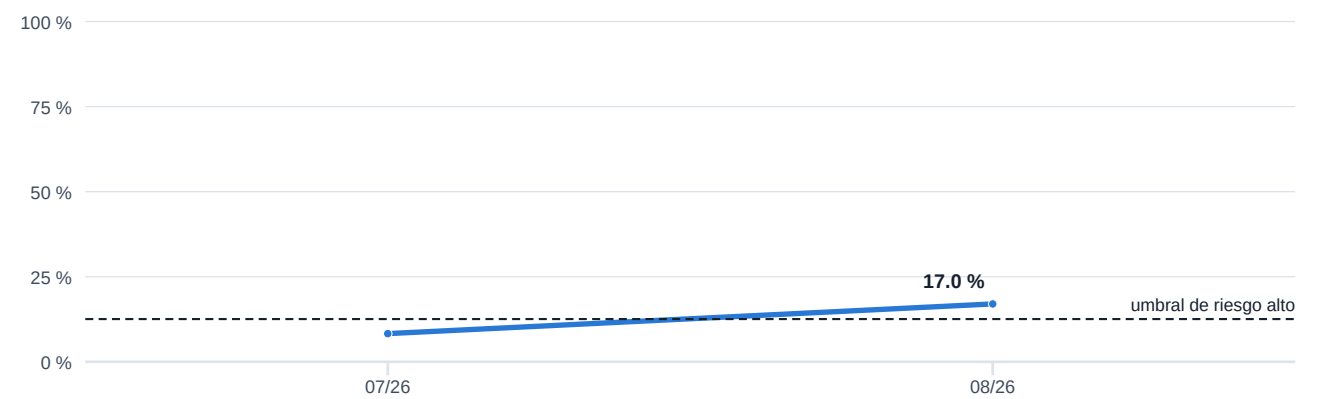

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.79 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.649
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.243
El 35 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.237
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.73 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.145
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.134
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
Extensión media de los asientos recientes: 965 caracteres	Contenido de los asientos		-0.082
Hubo registros en el cuaderno 22 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.081

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	17.0 %	17.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 63 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 31/08/2026

... del tramo del canal de tubería antigua de concreto que se encuentra en mal estado para que notifique al área correspondiente, así mismo en el asiento n 58 el residente anota sobre el riesgo n 02 del incumplimiento del cronograma de intervención de la eps sedapar s.a. y afectación a la programación de obra, por lo que esta supervisión dio a conocer a la entidad mediante la carta n 009-2026-consorciosuper...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 59 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

... es curva se complica mas, luego de un recorrido con el ingeniero pena de sedapar se ubicaron los buzones y se procede a su excavación y nuevamente esta cruzando en un extremo, estos hechos nos están retrasando en nuestro normal desarrollo puesto los buzones se excavan en forma manual y la excavación de las zanjas de la red de desagüe el cincuenta por ciento es de forma manual decido a las conexiones do...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 55 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 28/08/2026

...nto que sedapar no está realizando la colocación de los anillos de concreto de las cajas de registro colocadas solo las dejan con el primer anillo de empalme a domicilio y a la red, de no hacerlo nos retrasan en las partidas de ejecución de veredas y vías, por lo que se indica que estas demoras en colocación por parte de sedapar son causal de ampliación de plazo que deberá tomarse en cuenta de ser ne...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 54 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

ENSAYOS DE CALIDAD EN LABORATORIO DE BASE GRANULAR: En fecha se hace llegar a la Entidad la Carta N° CARTA N° 009-2026 CONSORCIOSUPERVISORLEÓNXIII/MPC, donde se adjunta el INFORME N°004-2026 MDC/CSLEONXIII/SUP.IJACZ sobre RETRASO EN OBRA por la DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS POR PARTE SEDAPAR S. A. según el convenio N° 17-2025, las cuales son causales de ampliación de plazo que no son atribuibles al contratista...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 54 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...n laboratorio de base granular . en fecha se hace llegar a la entidad la carta n carta n 009-2026 consorciosupervisorleonxiii/mpc, donde se adjunta el informe n004-2026 mdc/csleonxiii/sup.ijacz sobre retraso en obra por la demora en la ejecución de las partidas por parte sedapar s. a. según el convenio n 17-2025, las cuales son causales de ampliación de plazo que no son atribuibles al contratista.el con...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 53 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

...a actualizado del proyecto, el día de hoy 27 de agosto, se culmina con las excavaciones de zanjas de redes y conexiones domiciliarias, sin embargo, no ha sido posible culminar con dichos trabajos por atrasos que viene presentando sedapar en las instalaciones de red de tubería y domiciliarias las mismas que fueron evidenciadas por el supervisor y esta residencia, estos acontecimientos deberá de ser cons...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 52 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 26/08/2026

...rio de las calles que se están interviniendo, el contratista cumple con la ejecución de las partidas de movimiento de tierras según el presupuesto aprobado, la empresa prestadora de servicios sedapar incumple con los plazos establecidos del cronograma vigente por lo que se hará llegar a la entidad un informe situacional a la entidad, ya que las demoras de la ejecución de los trabajos por parte de sedapar...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 45 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026**

...nzando oportunamente.sedapar no viene a colocar los anillos de las conexiones domiciliarias de desagüe y por un tema de querer avanzar esta residencia lo esta ejecutando, se indica que estas demora e incumplimiento de trabajo por parte de sedapar debera de tomarse en cuenta en caso de solicitar ampliacion de plazo.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 42 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/08/2026**

OTRAS OCURRENCIAS: En la fecha, se inicia la jornada con la charla de seguridad luego se procedió con las siguientes actividades.Se continúa con el hormigonado de veredas en la calle seis y siete según las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la supervisión, se continúa con la eliminación de base hasta el nivel de la sub razante, se continúa con la humectación del área de trabajo, se continúa con la dem...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 2 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 16/07/2026**

OTRAS OCURRENCIAS: El día de hoy se inicia la jornada con la charla de seguridad cuyo tema fue el análisis de trabajo seguro.Luego se procede con el acarreo y eliminación de la carpeta asfáltica, también se ha procedido con control de polvos con cisterna.También se indica que en la fecha se ha implementado el baño químico y lavamanos.El día de hoy se procede a entregar a la Entidad los siguientes documentos:Actualiza...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
