


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de la obra: Ampliacion y mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. Enrique paillardelle, distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa - tacna - tacna

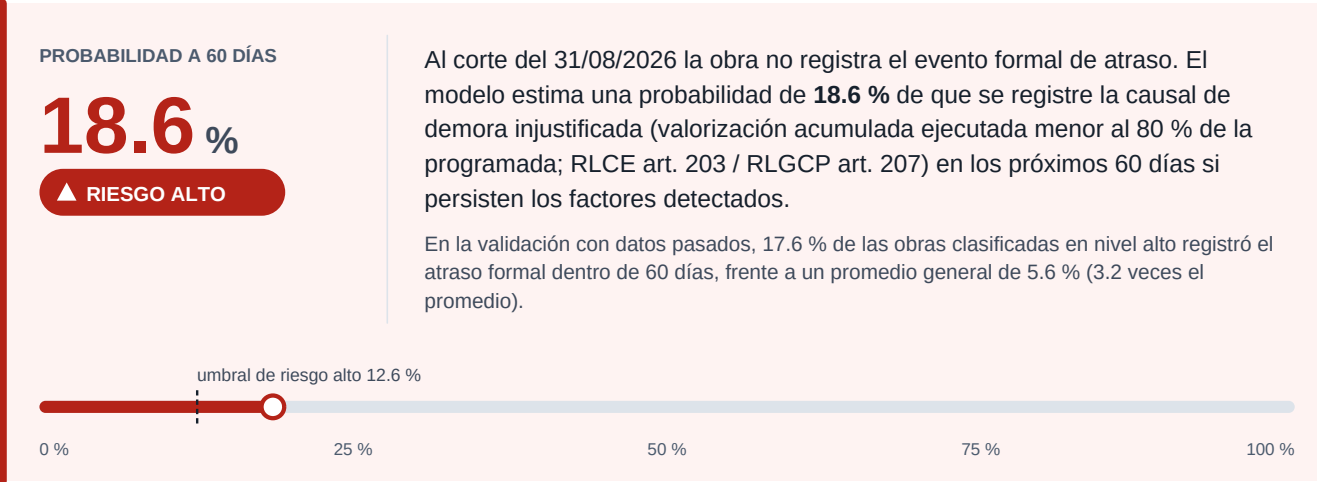


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	216 desde 20/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. ENRIQUE PAILLARDELLE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Contratista	CONSORCIO GRECO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA / TACNA / TACNA
Código Único de Inversión (CUI)	2191166
Inversión asociada	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. ENRIQUE PAILLARDELLE, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2376311
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 8,072,599.00
Cuaderno de obra digital	216 asientos entre 20/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

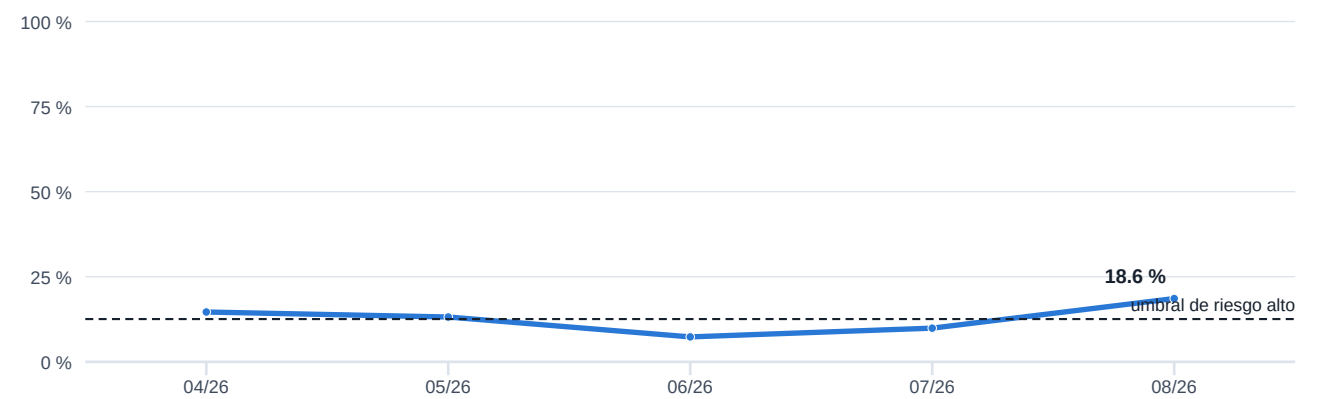

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.488
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.222
Departamento: Tacna	Características de la obra		+0.213
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.169
9 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.137
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.120
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.70 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.118
11 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.079

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	18.6 %	18.4 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	18.6 %	18.6 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	18.6 %	18.7 %	+0.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 215 · Órdenes · SOEC_RESI · 27/08/2026

ENSAYOS SOLICITADOS POR INSPECTORÍA: en la presente se reporta que se mantiene la condición de "suspensión de obra" y acorde a las ordenes emitidas en el asiento de la inspección: "...las cuales deben de realizar los nuevos ensayos el día de hoy 27 de agosto del 2026", la residencia reporta que se efectuaron 02 ensayos (se adjunta panel fotográfico), en otros puntos de contingencias "américas" y "contingencias Enc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 208 · Órdenes · SOEC_INSP · 21/08/2026

SOBRE LA SUSPENSION Y LA AFECTACION DE RUTA CRITICA EN EFECTOS DEL ADICIONAL N°04: Esta inspección toma conocimiento del asiento N°202 del residente de obra indicando: "LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES" por lo que esta inspección constata mediante ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N°02 con fecha de 17 de agosto, la suspensión de todas las actividades por las lluvias intensas que no permite garantizar el cu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 208 · Órdenes · SOEC_INSP · 21/08/2026

...estandares de calidad.por otro lado se toma conocimiento del asiento n 207 del residente de obra indicando comunicacion de perdida de holgura total, afectacion a la ruta critica e inicio de causal de atraso por demora en la aprobacion de la prestacion adicional de obra n 04 y deductivo vinculante n 01 por lo que esta inspeccion desaprueba lo que suscribe el residente de obra de acuerdo a su valorizacio...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 207 · Entregables · SOEC_RESI · 20/08/2026

...e la prestacion adicional de obra n 04 y deductivo vinculante n 01. . se comunica de manera expresa y categorica a la inspeccion de obra que al día de hoy, 20 de agosto de 2026, la entidad efectuo el incumplimiento del plazo legal y del procedimiento perentorio establecido en el articulo 194 del reglamento de la ley de contrataciones del estado (ley n 32069), acorde a normativa no ha emitido el pronuncia...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 207 · Entregables · SOEC_RESI · 20/08/2026

comunicacion de perdida de holgura total, afectacion a la ruta critica e inicio de causal de atraso por demora en la aprobacion de la prestacion adicional de obra n 04 y deductivo vinculante n 01. . se comunica de manera expresa y categorica a la inspeccion de obra que al día de hoy, 20 de agosto ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 206 · Órdenes · SOEC_INSP · 20/08/2026

APROBACION DE FICHA DE CONDUCTORES N2XOH TRIPLE Y DUPLEX: esta inspección toma conocimiento del asiento N°197 del residente de obra indicando: "APROBACION DE FICHA DE CONDUCTORES N2XOH TRIPLE Y DUPLEX" por lo que esta inspección revisa y evalúa de acuerdo al INFORME N°058-2026-RWQC-EIE-SGSLP-GEI/MDCGAL del especialista de instalaciones eléctricas de la inspección el ING. RENE W. QUISPE CHURA emite OPINION TECNICA FAV...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 198 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 13/08/2026

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE RESANE Y TRATAMIENTO DE FISURA: Se pone de conocimiento a la inspección, que acorde a los procedimientos tecnicos administrativos que implementa la contratista, relacionada a el informe de visita de control No 10577-2026-CG/GRTA-SVC se remite adjunto para su aprobacion la propuesta de procedimiento tecnico de trabajos de resane y tratamiento de fisuramiento vertical en muro de concreto,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 195 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_RESI · 12/08/2026 ... las mismas características que los anteriormente mencionados, pero separados en 5 metros de distancia como lo indica el código nacional de electricidad.en tal sentido, habiendo verificado in situ el incumplimiento de los ohmios requeridos (se adjunta informe n 018 - 2026 / duyz / et / c.g), y teniendo en cuenta que el mismo expediente contempla la incorporacion de mas pozos para cumplir con la finalidad... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 194 · Órdenes · SOEC_INSP · 12/08/2026 RESPECTO A LAS FICHAS TECNICAS: esta inspección toma conocimiento del asiento N°185 del residente de obra indicando: "OTRAS OCURRENCIAS" donde el contratista indica con respecto a los materiales del cerco perimétrico y Drywall en muros en donde anexa fichas técnicas para su revisión y evaluación, por lo que esta inspección revisa y evalúa de acuerdo al INFORME N°019-2026-AOMS-EC-SGSLP-GEI/MDCGAL del especialista de c... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 190 · Órdenes · SOEC_INSP · 10/08/2026 NO SE AUTORIZA LOS MAYORES METRADOS: esta inspección toma conocimiento del asiento N°186 del residente de obra indicando:" AUTORIZACION DE MAYORES METRADOS" por lo que esta inspección revisa y evalúa de acuerdo al INFORME N°019-2026-CESP-EA-SGSLP-GEI/MDCGAL del especialista en arquitectura de la inspección el ARQ, CARLOS EDUARDO SALCEDO PONCE emite OBSERVACIONES A LA SOLICITUD del residente de obra, por lo que esta i... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 184 · Adicionales · SOEC_RESI · 23/07/2026 ...n parte de la ruta crítica inicial, es fundamental mantener un control riguroso sobre su ejecucion. debido a la interdependencia de los recursos y la variabilidad en los tiempos de entrega, cualquier retraso acumulado en estas tareas consumira rapidamente su margen de holgura. de ocurrir esto, todas las partidas de la pao n02 y n03 corren el riesgo de convertirse en restricciones criticas, modificando l... Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 181 · Adicionales · SOEC_INSP · 20/07/2026 RATIFICACION DEL ADICIONAL N°06: ESTA INSPECCION TOMA CONOCIMIENTO DEL ASIENTO N° 180 DEL RESIDENTE DE OBRA RESPECTO A LA NECESIDAD DE EJECUTAR ADICIONAL N°06 CON RESPECTO A LA CONSULTA N°13: 07.01.03.04.02.05/07.02.03.04.02.05: PISO CON TABLERO ESTRUCTURAL OSB E=9MM: EXISTÍA UNA DIFERENCIA ENTRE LOS ESPESORES INDICADOS EN PLANO Y ACUS.... "EN CONSECUENCIA DE LA RESPUESTA DEL PROYECTISTA EXISTE UNA INCOMPATIBILIDAD POR... Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
