


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ampliacion del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas en redes de distribución primaria, subestacion de distribucion, redes secundarias, y alumbrado publico en 10 AA.HH. Distritos de arequipa, islay de las provincias de arequipa, islay del departamento de arequipa

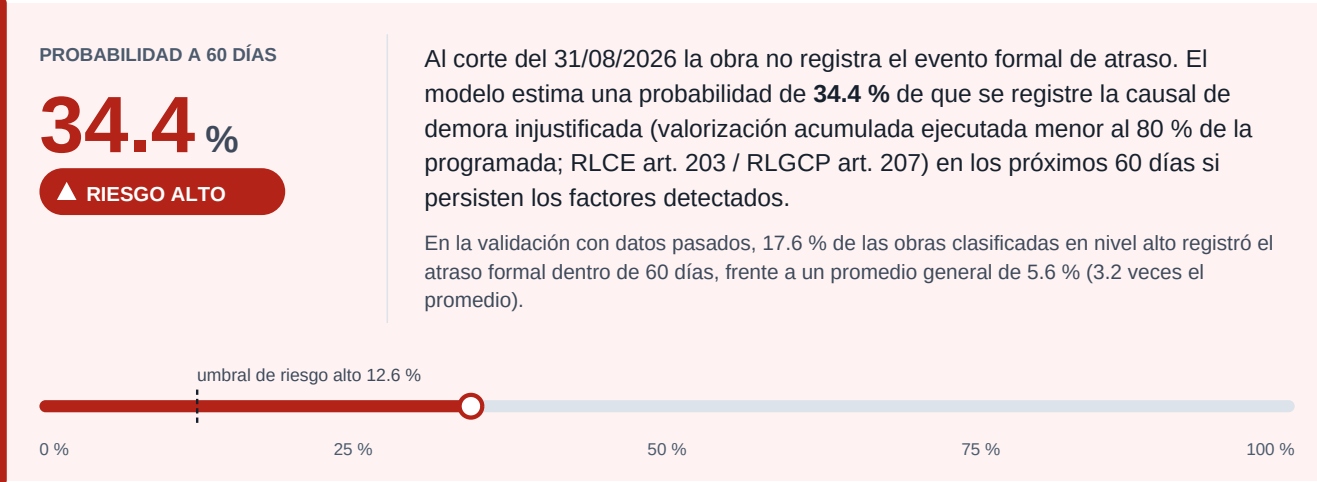

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	36 desde 02/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, REDES SECUNDARIAS, Y ALUMBRADO PUBLICO EN 10 AA.HH. DISTRITOS DE AREQUIPA, ISLAY DE LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Entidad contratante	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
Contratista	CONSORCIO OBRAS ELECTRICAS CURIMANA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2660541
Inversión asociada	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, REDES SECUNDARIAS , Y ALUMBRADO PUBLICO EN 10 AA.HH. DISTRITOS DE AREQUIPA, ISLAY DE LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	ENERGÍA
Identificador del contrato (SEACE)	2395688
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,737,115.27
Cuaderno de obra digital	36 asientos entre 02/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.75 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.780
El 67 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.227
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.206
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.198
El 15 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.196
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.73 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.116
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.100

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	34.4 %	34.1 %	-0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 27 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

... evaluacion tecnica de la red primaria proyectada segun expediente tecnico contratado de la localidad aa.hh. aivpi sr. de los milagros, por lo tanto, la sed no 2, debera ser reubicada hacia dos vanos atras quedando en la estructura no 9, con el cual se soluciona el obstaculo (cruce de redes) mencionado por el contratista, asimismo, el planteamiento de utilizar cable autoportante del tipo na2xsa2y-s 18/...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 24 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 17/08/2026

...forme detallado y sustentado, previo al analisis del estudio de coordinacion de proteccion, que a la fecha no ha sido presentado ni iniciado, por lo que sera responsabilidad del contratista cualquier atraso por modificaciones futuras que puedan realizarse y afecten el cronograma de ejecucion de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 24 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 17/08/2026

NIVEL DE TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE TRANSFORMADORES: Se toma conocimiento del asiento N° 23, del cuaderno de incidencias, al respecto de la Consulta se indica:El contratista debe cumplir con los alcances del contrato y Especificaciones Técnicas del expediente técnico contratado, de identificarse variaciones en el nivel de tensión de las redes existentes (lo cual no se describe ni presento en ninguna parte de su inform...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 22 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 13/08/2026

...etalle por localidad (zona provincias) iniciada y en proceso de revision de subsanacion- seguridad y salud ocupacional iniciada y en progreso normal.- plan de manejo ambiental no iniciada, 42 dias de atraso.- plan de monitoreo arqueologico, inc. elaboracion e implementacion del plan de monitoreo arqueologico no iniciada, 42 dias de atraso.- estudio de coordinacion de la proteccion y balance de cargas n...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 12/08/2026

...ta de redes en media tension y subestaciones, actuar de forma diligente en el desarrollo de sus funciones para lograr de forma eficiente los alcances y objetivos del contrato de obra. por lo que este incumplimiento se tomara como una primera falta.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 18 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

...ontratista cumplir con sus obligaciones contractuales, su representada debio ratificar y gestionar los puntos de diseno para formular el expediente de replanteo dentro de los plazos establecidos, las demoras por el no seguimiento de sus tramites realizados es de su unica responsabilidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 18 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

OBLIGACION CONTRACTUAL: Se toma conocimiento del asiento N° 16, y se recuerda al contratista cumplir con sus obligaciones contractuales, su representada debió ratificar y gestionar los puntos de diseño para formular el Expediente de Replanteo dentro de los plazos establecidos, las demoras por el no seguimiento de sus trámites realizados es de su única responsabilidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 7 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/07/2026

RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES: Se hace constar que, a la fecha de la presente anotación, no se ha identificado riesgos en el desarrollo de la obra, asimismo se indica al contratista cumplir con sus responsabilidades contractuales de su contrato vigente y las bases integradas, por lo que se le requiere presentar su plan de trabajo de acuerdo a lo descrito en las bases integradas, el mismo que debe detallar la nomin...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
