


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución del proyecto de inversión pública denominado ¿mejoramiento de los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes en centro cultural municipal de azángaro distrito de azángaro de la provincia de azángaro del departamento de puno¿ con CUI N° 2625740.

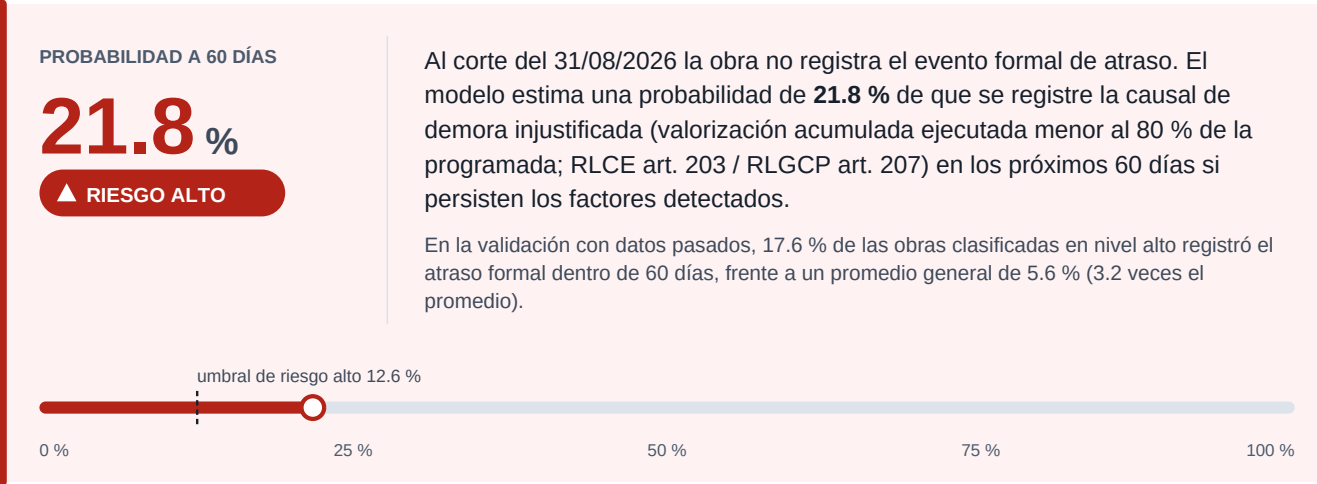

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	220 desde 18/02/2026	26/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato


Denominación oficial	EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE AZÁNGARO DISTRITO DE AZÁNGARO DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO¿ con CUI N° 2625740.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO
Contratista	CORPORATIVO EMPRESARIAL SAN ANTONIO E.I.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	AZANGARO / AZANGARO / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2625740
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE AZANGARO DISTRITO DE AZANGARO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2369707
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 13,374,491.58

Cuaderno de obra digital

220 asientos entre 18/02/2026 y 26/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

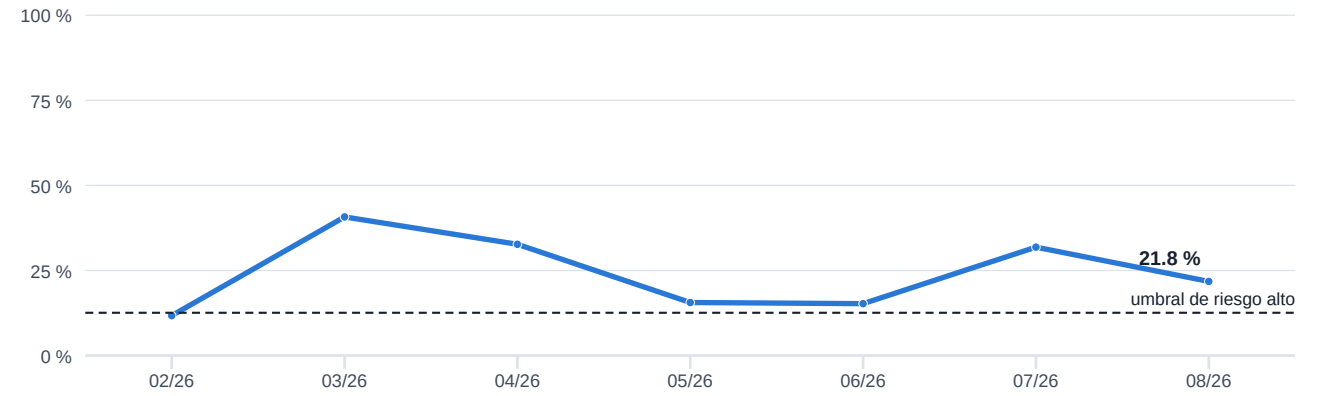

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (7 cortes, del 28/02/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.76 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.680
El 15 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.263
El 16 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.198
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.146
El último asiento se registró hace 5 días	Actividad del cuaderno de obra		-0.133
El 55 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.126
11 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.100
2 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.096

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	21.8 %	21.5 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	21.8 %	21.8 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	21.8 %	22.2 %	+0.5 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	21.8 %	29.4 %	+7.7 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

- Asiento N.º 220 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_SPV · 26/08/2026**

ratificacion de la suspension del plazo de ejecucion contractual por incumplimiento de pago de la entidad . en atencion al asiento n.o 218, mediante el cual el contratista deja constancia de la suspension por falta de pago de las valorizaciones n.o 04 y n.o 05, esta supervisi...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 216 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026**

falta de respuesta de la entidad y riesgo de resolucion del contrato tripartito de la jprd . se deja constancia que, a la fecha, no se ha recibido respuesta formal por parte de la entidad respecto de la documentacion presentada por el contratista relacionada con la re...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 218 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 25/08/2026**

...o formal de pago, otorgandose a la entidad el plazo maximo de diez (10) dias calendario, conforme al numeral 202.3 del articulo 202 del reglamento de la ley n. 32069. vencido dicho plazo, persiste el incumplimiento de la entidad, al no haberse regularizado el pago de las valorizaciones pendientes.en consecuencia, al haberse configurado el supuesto previsto en el numeral 202.3 del articulo 202 del reglame...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 219 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_SPV · 25/08/2026**

...del reglamento de la ley n. 32069.al respecto, se deja constancia que, mediante carta n. 532026consorcio azangaro/rc/movc, de fecha 05/08/2026, esta supervision comunico oportunamente a la entidad el retraso en el pago de las valorizaciones pendientes, solicitando la regularizacion correspondiente. a la fecha de la presente anotacion, no se ha recibido respuesta alguna por parte de la entidad ni se ha a...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 219 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_SPV · 25/08/2026**

...respondiente. a la fecha de la presente anotacion, no se ha recibido respuesta alguna por parte de la entidad ni se ha acreditado la regularizacion de los pagos pendientes.asimismo, se precisa que el incumplimiento de pago no solo afecta al contratista, respecto de las valorizaciones n. 04 y n. 05, sino que tambien se encuentra pendiente el pago correspondiente a los servicios de supervision, situacion q...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 214 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026**

...n de la entidad el 21/08/2026. en consecuencia, al 25/08/2026, al no haberse comunicado la absolucion correspondiente, se deja constancia del vencimiento del plazo y de cuatro (04) dias calendario de demora, sin perjuicio de verificar la fecha efectiva de recepcion por el proyectista.se deja expresa constancia que esta demora viene afectando la ejecucion de los trabajos correspondientes a los muros m16 ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 215 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026**

...os, subcontratistas y adquisicion de materiales, situacion que puede comprometer el normal desarrollo de las actividades programadas y la ruta critica de la obra.en tal sentido, cualquier afectacion, retraso, paralizacion o imposibilidad de ejecutar oportunamente las actividades que resulte como consecuencia directa de la falta de pago de las valorizaciones constituye una circunstancia no imputable al c...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 205 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026**

...n de la solicitud de ampliacion de plazo n. 01 . en atencion al asiento n. 202, mediante el cual el contratista solicita la ampliacion de plazo n. 01 por veintisiete (27) dias calendario, debido a la demora en la absolucion de la consulta de obra n. 11, la supervision deja constancia de la recepcion de dicha solicitud.al respecto, la solicitud sera evaluada y analizada conforme a la normativa contractua...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 201 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026**

SOLICITUD DE ALCANCE Y PRESENTACIÓN DEL SEGURO CAR: Se deja constancia que esta Supervisión solicita al Contratista hacer alcance y presentar el Seguro CAR vigente, correspondiente a la ejecución de la obra, a fin de verificar su vigencia, cobertura y cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas.En tal sentido, se requiere que el Contratista remita a esta Supervisión la documentación correspondiente del...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 195 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 12/08/2026**

PRESENTACIÓN Y VIGENCIA DEL SCTR DEL PERSONAL – AGOSTO 2026: En atención al Asiento N.º 187 del Cuaderno de Obra, de fecha 11/08/2026, mediante el cual la Supervisión requiere al Contratista la presentación de los Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR), correspondientes a las coberturas de Salud y Pensión del personal que viene laborando y/o ingresando a la obra durante el mes de agosto de 2026, se deja ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
