


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: Ejecución del componente i y ii del proyecto: ¿mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel primaria de la I.E. N° 00835 nuevo huancabamba del distrito de moyobamba - provincia de moyobamba - departamento de san martin, con CUI N° 2472690

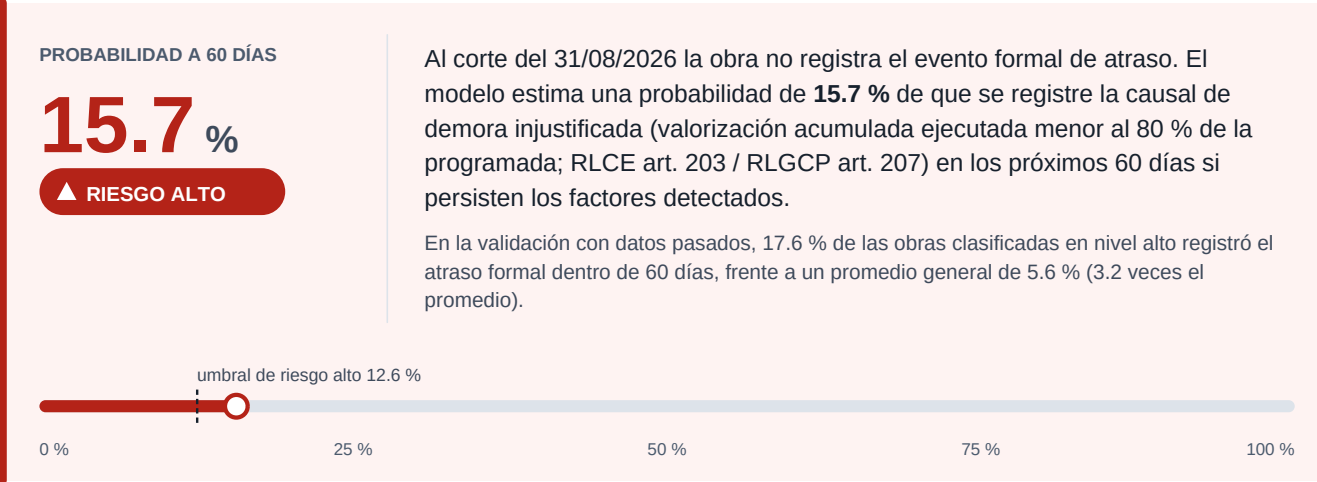


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	347 desde 02/09/2025	27/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DEL COMPONENTE I Y II DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 00835 NUEVO HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2472690
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN Sede Central
Contratista	CONSORCIO NUEVO HUANCABAMBA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	MOYOBAMBA / MOYOBAMBA / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2472690
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 00835 NUEVO HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2341192
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 8,375,026.20
Cuaderno de obra digital	347 asientos entre 02/09/2025 y 27/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

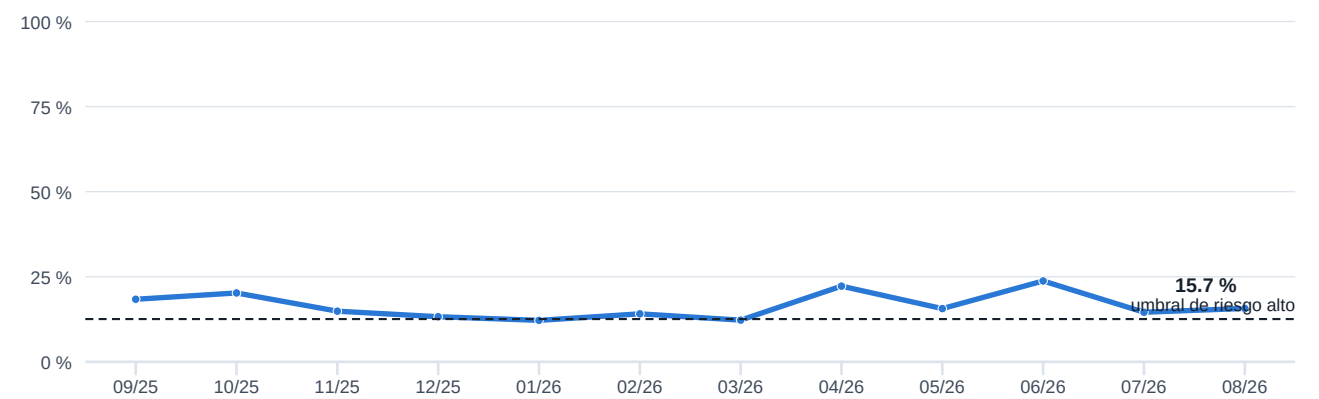

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (12 cortes, del 30/09/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.549
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.219
El 64 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.184
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.151
5 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.143
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 1,929,138	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.134
El último asiento se registró hace 4 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.121
Presupuesto inicial asignado este año (PIA): S/ 12,000,000	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.045

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	15.7 %	15.5 %	-0.2 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	15.7 %	15.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 346 · Órdenes · SOEC_SPV · 26/08/2026

ABSOLUCION DE CONSULTA ANTE ANTE INCOMPATIBILIDAD EN EL E.T CON RESPECTO A LA PARTIDA 03.04.02.07: Se informa a la residencia que ante el tramite de la consulta respecto a la incompatibilidad en la partida 03.04.02.07 - (PISO TERMINADO DE POLIURETANO /PISO DE BALDOSA DE POLIPROPILENO), la ENTIDA a manifestado su pronunciamiento mediante los siguientes documentos: CARTA MULTIPLE N° 0521-2026-GRSM-GRIINFORME TECNICO 12-...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 342 · Órdenes · SOEC_SPV · 25/08/2026

TENER EN CONSIDERACION LO INDICADO POR LA ENTIDAD: En atención a la consulta sobre la incompatibilidad en la cobertura del Módulo Aulario formulada por el Contratista, esta Supervisión traslada formalmente la absolución definitiva emitida por la Entidad mediante Carta Múltiple N° 0458-2026-GRSM/GRI, Nota Informativa N° 2141-2026-GRSM/GRI-SGSyLO e Informe Técnico N° 11-2026-CARA, declarando PROCEDENTE la sustitución d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 343 · Órdenes · SOEC_SPV · 25/08/2026

CONTINUA ASIENTO ANTERIOR: En consecuencia, se ORDENA al Residente de Obra proceder de inmediato con el suministro, montaje y liberación de estos frentes de trabajo, cautelando el estricto cumplimiento de la ruta crítica del Cronograma de Ejecución de Obra Vigente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 344 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 25/08/2026

...ipitacion pluvial en forma permanente desde horas de la madrugada, nos hemos visto obligados a no tener que laborar hasta que se mejore el temporal de lluvia. se deja constancia porque esto significa atraso en el avance normal de la obra por las dificultades provocadas por este fenomeno atmosferico.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 345 · Órdenes · SOEC_SPV · 25/08/2026

TRASLADO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD: Esta Supervisión deja constancia de la recepción de la Carta Múltiple N° 0513-2026-GRSM/GRI, mediante la cual la Gerencia Regional de Infraestructura traslada la Nota Informativa N° 2355-2026-GRSM/GRI-SGSyLO y el Informe N° 190-2026-RRM del Coordinador de Obra, comunicando la OPINIÓN FAVORABLE a la solicitud del Contratista (Carta N° 232-2026/RC/CNH) para constitui...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 333 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

EJECUCION DE PARTIDAS CONTRACTUALES: Se verifica la continuidad de los trabajos por parte del contratista, en donde se ha podido apreciar que al día de hoy ha tenido una baja significativa con respecto al personal que venia laborando en obra hasta el sábado pasado, es por lo cual que se le exige que deberá de mejorar o incrementar frentes de trabajo con mas personal y así no tener problemas de retraso injustificado....

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 333 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

...ecto al personal que venia laborando en obra hasta el sabado pasado, es por lo cual que se le exige que debera de mejorar o incrementar frentes de trabajo con mas personal y asi no tener problemas de retraso injustificado.se verifica que la ejecucion de las diferentes partidas en el modulo del aulario (en los 3 niveles), modulo sum, modulo de servicios generales, cerco perimetrico, y modulos exteriores....

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
