


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución del saldo de obra del proyecto de inversión: ¿rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado y conexiones domiciliarias del agrupamiento cesar vallejo, distrito de ilo, provincia de ilo, departamento de moquegua¿ con CUI N°2189368

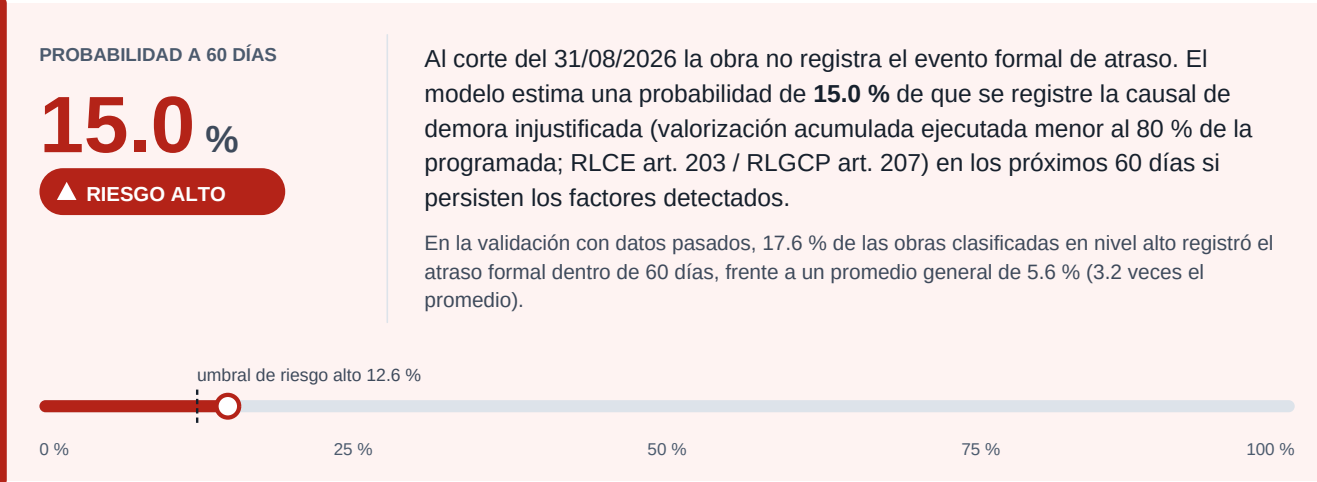


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 2,932,417.81	150 días	97 desde 02/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: ¿REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿ con CUI N°2189368
Entidad contratante	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE ILO SA
Contratista	CONSORCIO CLEMESI
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ILO / ILO / MOQUEGUA
Código Único de Inversión (CUI)	2189368
Inversión asociada	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AGRUPAMIENTO CESAR VALLEJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2386734
Monto del contrato	S/ 2,932,417.81
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,762,047.00
Cuaderno de obra digital	97 asientos entre 02/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

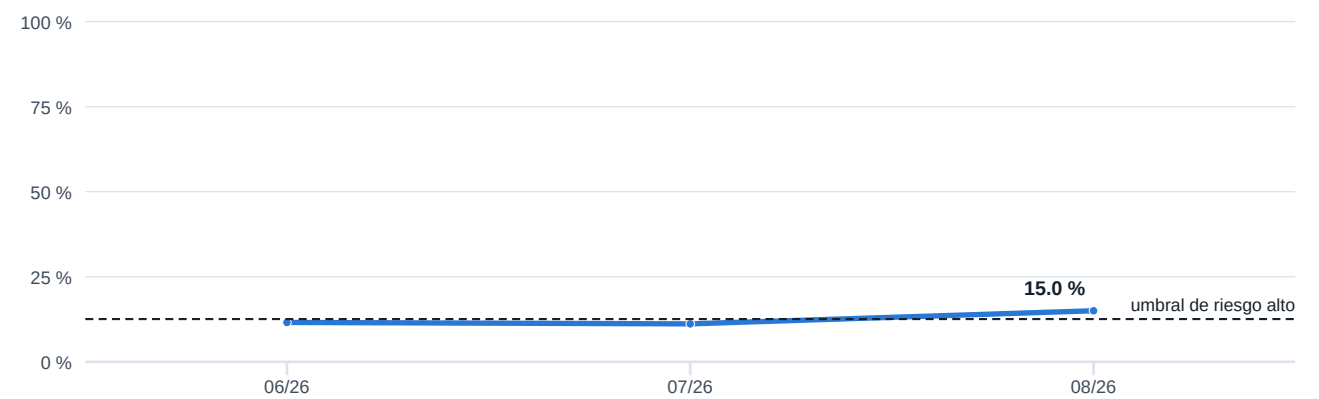

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.651
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.198
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.168
Departamento: Moquegua	Características de la obra		+0.127
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.115
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.100
Extensión media de los asientos recientes: 1,459 caracteres	Contenido de los asientos		-0.084
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.074

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	15.0 %	14.1 %	-0.9 pp
Absolver todas las consultas pendientes	15.0 %	14.9 %	-0.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 90 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 22/08/2026

...los empalmes previstos y continuar con la ejecución de las redes de desagüe en dicho sector, generando un riesgo de afectación al normal desarrollo de las actividades programadas y pudiendo ocasionar retrasos en la ejecución de los trabajos. En tal sentido, y en el marco de la gestión de riesgos de la obra, se solicita a la supervisión realizar las gestiones correspondientes ante la entidad la eps ilo, a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 68 · Consultas · SOEC_RESI · 14/08/2026

PRECISIÓN Y RESPUESTA AL PRONUNCIAMIENTO DE SUPERVISIÓN – CONSULTA DE OBRA N.º 05: ... vienen asiento... En consecuencia, se solicita a la Supervisión precisar y/o complementar dicho numeral, indicando de manera expresa el alcance de su conclusión y las acciones que correspondan, a efectos de evitar interpretaciones respecto de la procedencia técnica de la intervención y del trámite que debe seguirse ante la Entidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 56 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

RESPUESTA A LA CONSULTA N.º 04 Y ATENCIÓN AL ASIENTO N.º 52 Y N.º 53: PRIMERO. – En atención al asiento N.º 52 y 53 de acuerdo a la verificación de las actividades, se ha encontrado que las fisuras y deficiencias de adherencia existentes entre los anillos y los muros de las buzonetas existentes no constituyen una condición aceptable para su incorporación al sistema de alcantarillado, debido a que comprometen la continuidad es...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 55 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 08/08/2026

aprobación cambio de personal clave . por el presente asiento se comunica a la supervisión de obra el cambio de personal clave de especialista de calidad, de acuerdo a la aprobación de la entidad mediante el documento carta n 021...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 53 · Consultas · SOEC_RESI · 07/08/2026

...iente de la supervisión y entidad, se paraliza los trabajos en dicho frente además de ser una actividad de la ruta crítica por lo que se considera también un hito de causal de ampliación de plazo, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, en los elementos que presenten las condiciones descritas, salvo las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 53 · Consultas · SOEC_RESI · 07/08/2026

CONSULTA N.º 04, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA REPARACIÓN DE BUZONETAS EXISTENTES CON FISURAS Y DEFICIENCIAS DE ADHERENCIA ENTRE ANILLOS: vienen asiento 52.- Realizar la reparación de las fisuras y el tratamiento de la junta entre los anillos inferior y superior mediante materiales y procedimiento técnicamente aprobados.- Ejecutar el desmontaje y/o retiro del anillo superior que presente deficiente adherencia, para posterior...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
