


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Creación de los servicios deportivos de natación y recreación en el centro poblado de avis porto alegre distrito de islay - provincia de islay - departamento de arequipa, con CUI N° 2508280

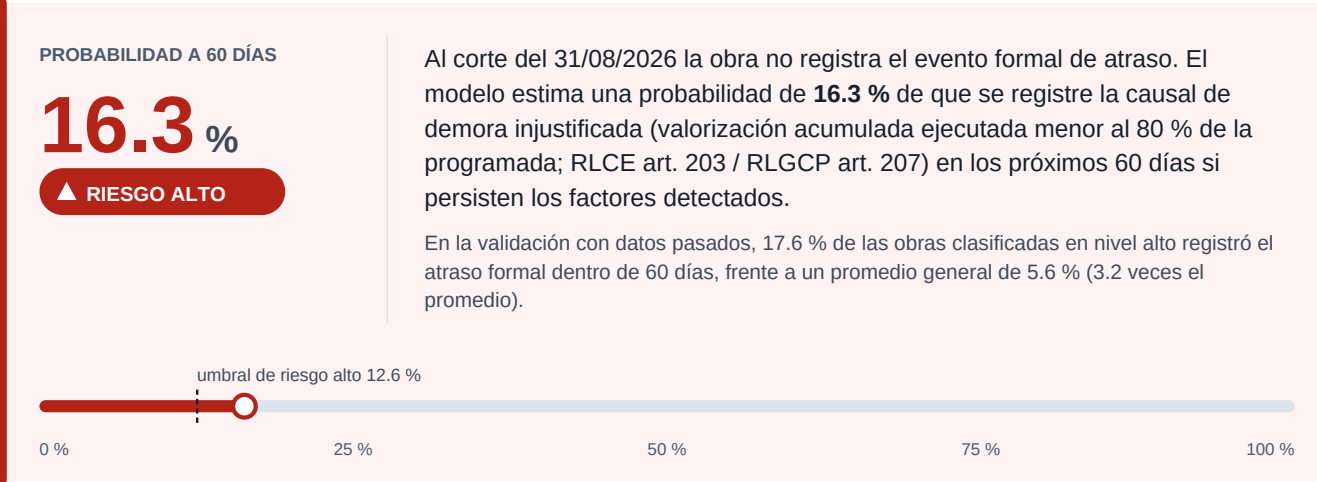


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	76 desde 13/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACIÓN Y RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE AVIS PORTO ALEGRE DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI N° 2508280
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
Contratista	CONSORCIO MASURCA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ISLAY / ISLAY / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2508280
Inversión asociada	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACION Y RECREACION EN EL CENTRO POBLADO DE AVIS PORTO ALEGRE DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2405971
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,903,293.20
Cuaderno de obra digital	76 asientos entre 13/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

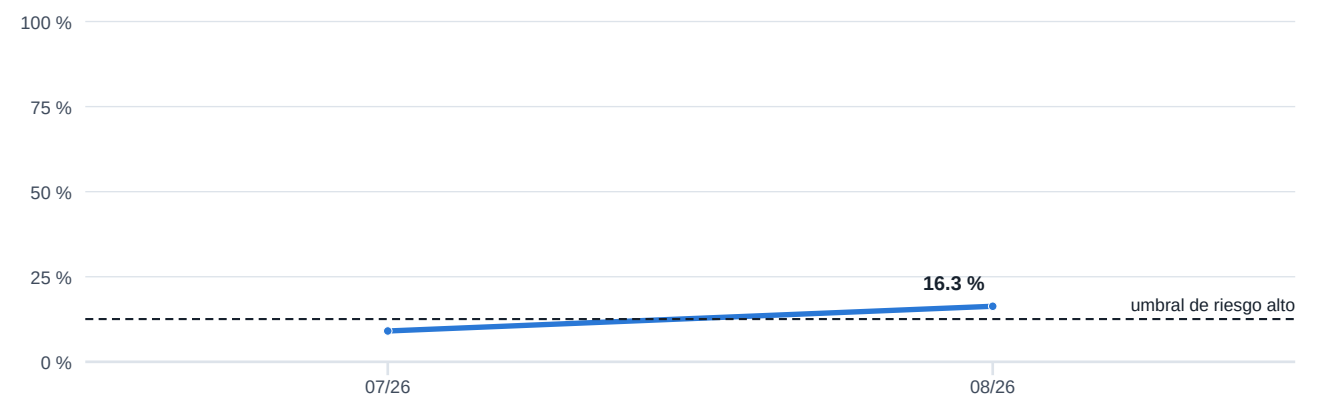

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.69 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.545
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.198
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.160
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.131
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		-0.130
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.089
Hubo registros en el cuaderno 22 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.073
Se ha gastado el 14 % del presupuesto inicial del año	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.066

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	16.3 %	16.3 %	+0.0 pp

05

Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 76 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/08/2026

CONCILIACION DE METRADOS: - Habiendo conciliados metrados, se da conformidad a los metrados de la valorización N° 02, por lo que se recomienda al contratista preparar los documentos de forma y cumplir con los plazos que indica el reglamento vigente.- El día de hoy se hace el vaciado del muro de contención, por lo que previamente se hizo el control del Slump y se recogió las muestras de mezcla de concreto para las pru...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 76 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/08/2026

...cia, se recomienda al contratista preveer el curado una vez desencofrado el muro.- tambien se indica que debera cumplir con la identificacion de riesgos e indicarlo en el cuaderno para evitar caer en penalidades que indica las bases y contrato.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026

RECEPCION DE DOCUMENTOS Y AVANCE DE OBRA: - De acuerdo a los asientos N° 09 y 10 del Residente se recepcionó las cartas del contratista, donde se verifico las actividades de Seguridad, estos, plasmados en los formatos ATS.- Se realizan partidas que se encuentran dentro de Obras Preliminares (trazo y replanteo inicial), Movimiento de Tierras (corte masivo en terreno semi rocoso y rocoso)- Se reitera al Residente que d...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 8 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 16/07/2026

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 1.- Se verifica participacion del personal clave, asumiendo sus funciones pertinentes2.- Se continua con las actividades de los asientos N° 4 y 5 del residente.3.- se indica al contratista que debera cumplir en forma estricta las partidas del Plan de Seguridad y Salud en Obra, partidas de obras provisionales. Con respecto a la partida del movimiento de tierras se debera mitigar el polucion ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
