


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: Mejoramiento de redes de media tensión del alimentador I-201, morrope, árbol sol, lagunas, casa blanca, alto médano, pósitos, distrito de morrope - provincia y departamento de lambayeque.

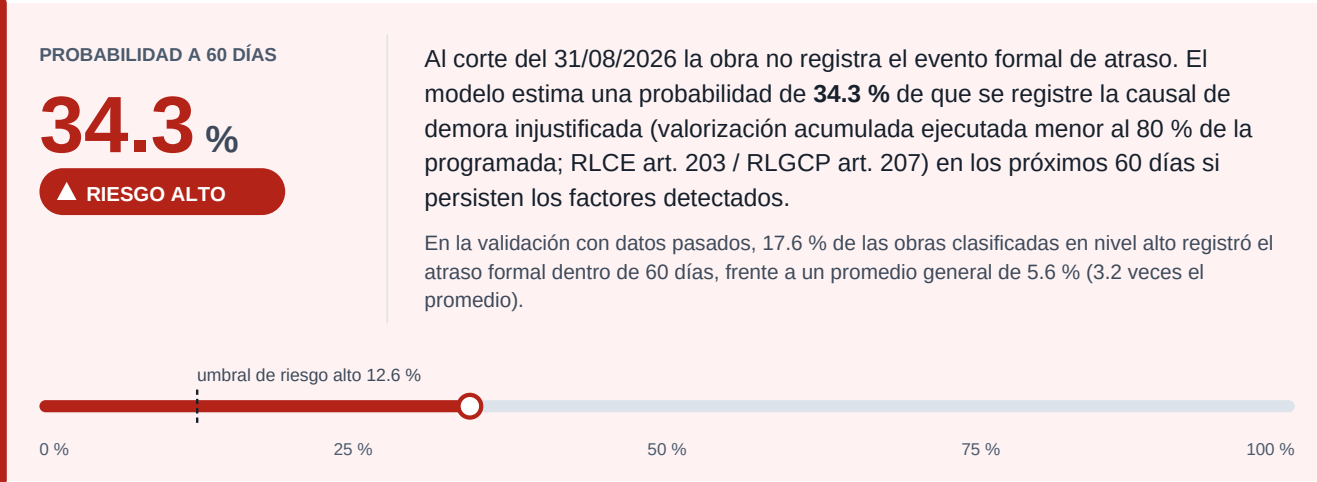


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	121 desde 06/04/2026	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR I-201, MORROPE, ÁRBOL SOL, LAGUNAS, CASA BLANCA, ALTO MÉDANO, PÓSITOS, DISTRITO DE MORROPE - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
Entidad contratante	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR CMR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	MORROPE / LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2382201
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	121 asientos entre 06/04/2026 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

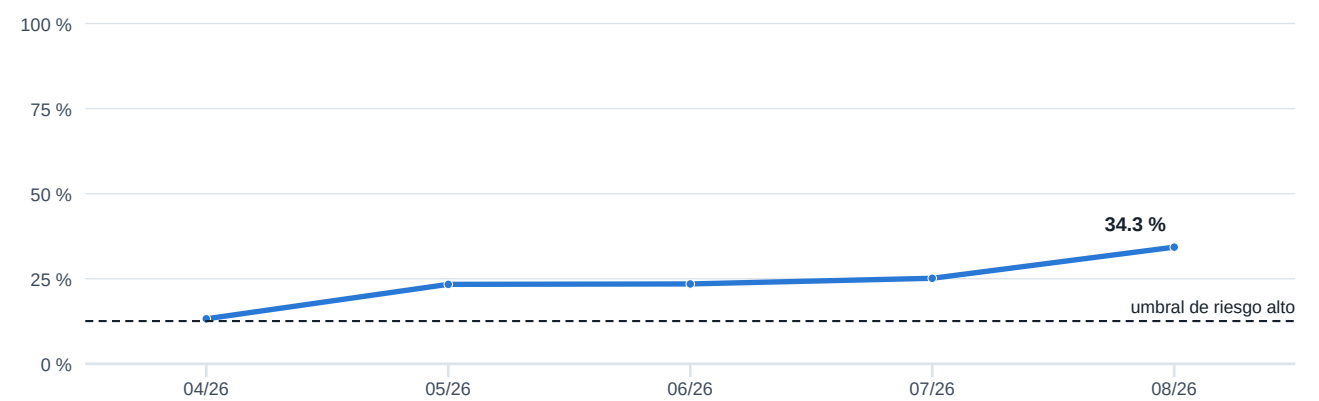

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.718
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.348
El 18 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.273
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.188
Extensión media de los asientos recientes: 474 caracteres	Contenido de los asientos		+0.125
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
2 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.71 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.113

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	34.3 %	34.3 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	34.3 %	34.3 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 121 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 28/08/2026

acciones ante posible fenomeno del nino . de las actuales comunicaciones se tiene previsto un fenomeno del nino de gran magnitud el cual puede ocasionar retrasos o paralizaciones en la obra, por lo cual la contratista debe tener presente este riesgo para realizar acciones y sepueda mitigar los danos de producirse:en caso se presente un evento extraordinario...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 116 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 25/08/2026

... calles donde aun no se culminan los trabajos en pistas y veredas por otra empresa contratista y otra entidad impidiendo el acceso para realizar trabajos de excavacion e izaje, lo que puede ocasionar demoras en la ejecucion y culminacion de la obra en esos tramos, en este caso el consorcio ejecutor cmrdebe coordinar y solicitar el acceso a estas zonas para continuar con los trabajos pendientes.el consor...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 114 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 19/08/2026

CONSULTA SOBRE USO DE NEUTRO CORRIDO: SE COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA QUE DEBE ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DEBIDAMENTE SUSTENTADO RESPECTO A SU CONSULTA, CASO CONTRARIO NO PUEDE SER ATENDIDO POR ESTA SUPERVISIÓN ESTO EN BASE AL:Artículo 190. Consultas sobre incidencias en obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción190.2. Cuando la anotación formulada por el contratista conlleve a u...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 109 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026

...encia donde no se pueden realizar actividades y cuantifique las partidas impedidas de realizar.por el momento al existir otros frentes de trabajo puede continuar en estos hasta definir la solucion al retraso indicado.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 103 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 14/08/2026

acciones ante posible fenomeno del nino . de las actuales comunicaciones se tiene previsto un fenomeno del nino de gran magnitud el cual puede ocasionar retrasos o paralizaciones en la obra, por lo cual la contratista debe tener presente este riesgo para realizar acciones y se pueda controlar o mitigar los danos de este riesgo.tener presente:en caso se pres...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 104 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

...el calendario de utilizacion de maquinaria y equipo, lo cual debe respetarse estrictamente teniendo presente que segun su contrato el no cumplimiento de este calendario esta sujeto a la aplicacion de penalidades (clausula decima quinta: penalidades, otras penalidades, penalidad 11).

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 94 · Órdenes · SOEC_SPV · 05/08/2026

SOLICITUD DE INFORME DE MONITOREO AMBIENTALES EN OBRA: SE REITERA AL CONTRATISTA LO INDICADO EN EL ASIENTO 89 RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PRIMER MONITOREO AMBIENTAL, QUE PUEDE SER CAUSAL DE APLICACIÓN DE PENALIDADES.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 94 · Órdenes · SOEC_SPV · 05/08/2026

... de monitoreo ambientales en obra . se reitera al contratista lo indicado en el asiento 89 respecto a la presentacion del informe del primer monitoreo ambiental, que puede ser causal de aplicacion de penalidades.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 83 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 23/07/2026

REALIZACIÓN DE TRABAJOS SEGUROS Y CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD: SE COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA QUE SE DEBEN REALIZAR LOS TRABAJOS CUMPLIENDO CON EL EXPEDIENTE DE SEGURIDAD APROBADO, CUMPLIENDO CON LOS PETS, ATS, EL RESESATE 2013, LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD DADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ENSA DURANTE LA INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y ESTA SUPERVISIÓN, CUMPLIR CON LO INDICADO EN LAS BASES INTEGRADA...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
