


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de obra del proyecto de inversión: Creación del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en el AA. Hh monte sion del distrito de ventanilla ¿ provincia constitucional del callao ¿ departamento de callao¿ con CUI N° 2510455.

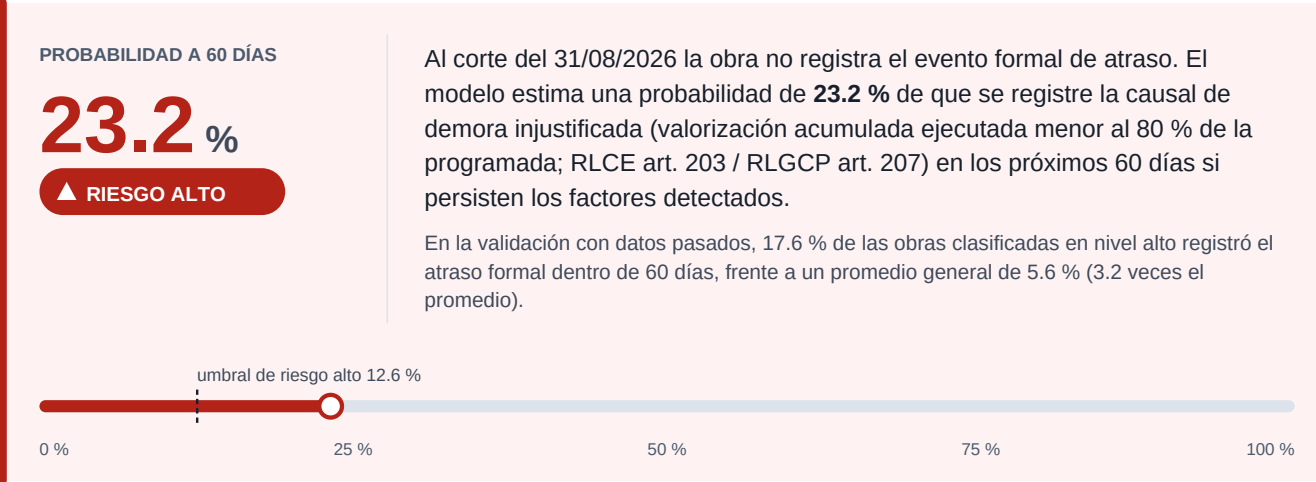


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 4,439,220.70	150 días	28 desde 11/07/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO ¿ DEPARTAMENTO DE CALLAO¿ CON CUI N° 2510455.
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL
Contratista	CONSTRUCTORA CONSARQ S.A.C. CONSARQ S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VENTANILLA / CALLAO / CALLAO
Código Único de Inversión (CUI)	2510455
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2333770
Monto del contrato	S/ 4,439,220.70
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,532,667.56
Cuaderno de obra digital	28 asientos entre 11/07/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

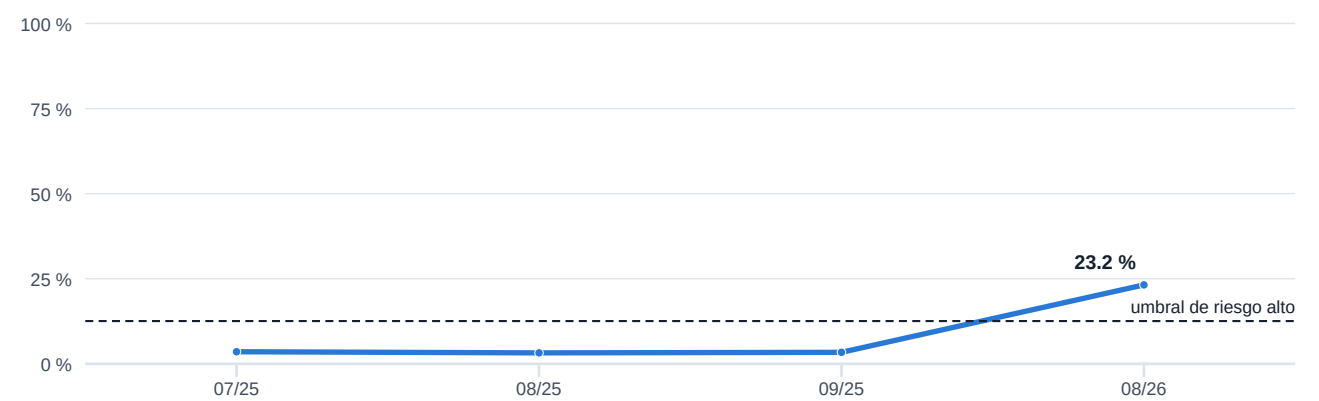

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/07/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.611
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.204
Departamento: Callao	Características de la obra		+0.199
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.186
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.172
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.120
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.108
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 19,429	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.075

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	23.2 %	23.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 27 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

directiva n 012-2017-osce/cd . en cumplimiento de la directiva n 012-2017-osce/cd, debemos manifestar que por causal de retraso en obra y/o costos adicionales en obra podrian darse por las posibles interferencias que podrian dar por el contacto en obra con las redes de agua, desagüe y gas, asimismo por la variacion en el dis...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 26/08/2026

SOLICITUD DE PLANO DE REPLANTEO DE CALLES QUE NO TIENEN PROBLEMS: Se le comunica que el día miércoles 19 de agosto de 2026, el suscrito en compañía de los topógrafos, su persona, el suscrito y la Ing. Evelyn como asistente de la inspección, se realizó el recorrido por todas las calles de la obra, por lo cual se registró el Asiento del Cuaderno de Obra N° 12, que indica lo siguiente:El día de hoy en el recorrido en ob...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 26/08/2026

...s situaciones asi mismo se indicara la justificacion y sustento tecnico para cada uno de los casos, por lo cual se les solicita que dicha presentacion se realice en el menor plazo posible para evitar retrasos en la ejecucion de la obra, y en la areas en las que no se presentan problemas se puede continuar con los trabajos de acuerdo al expediente tecnico.al respecto, las calles que actualmente presentan...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

RIESGOS POR INTERFERENCIAS: SE INICIO LAS ACTIVIDADES PREVIA LA CHARLA DEL SSOMA, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRAFICO, ASIMISMO SE ESTA COMPLETANDO LAS PARTIDAS REFERIDAS A LAS OBRAS PROVISIONALES. ASIMISMO LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA DOTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRA, ASIMISMO EN CONFORMIDAD DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA REFERIDO A PENALIDADES EN EL NUMERAL 15, DONDE SE INDICA QUE S...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

... partidas referidas a las obras provisionales. asimismo las instalaciones provisionales para la dotacion de energia electrica en obra, asimismo en conformidad de la clausula decima segunda referido a penalidades en el numeral 15, donde se indica que se debe hacer una evaluacion del desarrollo de la administracion de riesgos (el cual se reportara semanalmente todos los sabados), por cual en esta semana mani...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 15 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 21/08/2026

ocurrencias en obra . se ha tomado conocimiento de las acciones desarrolladas hasta el momento en obra, se le solicita que cumpla con lo indicado en su contrato para evitar la aplicacion de penalidades

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Otras modificaciones contractuales · SOEC_INSP · 19/08/2026

...s situaciones asi mismo se indicara la justificacion y sustentomtecnico para cada uno de los casos, por lo cual se les solicita que dicha presentacion se realice en el menor plazo posible para evitar retrasos en la ejecucion de la obra, y en la areas en las que no se presentan problemas se puede continuar con los trabajos de acuerdo al expediente tecnico.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Otras modificaciones contractuales · SOEC_INSP · 19/08/2026

PRESENTACIÓN DE PLANO DE REPLANTEO DE OBRA: El día de hoy en el recorrido en obra que se realizó en presencia de su persona y su topógrafo, y con la asistente de la Inspección, se verificaron varias situaciones que implicarían modificaciones al expediente técnico como el caso de adicionales, reducciones de prestaciones y posibles mayores metrados, para lo cual se ha comprometido que a la brevedad presentará un Plano ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 5 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 13/08/2026

cambio de residente de obra . mediante la presente yo francisco cardenas lagones con cip 74221 asumo la residencia desde mi habilitacion al cuaderno de obra de incidencias con fecha 12 de agosto 2026, de la obra creacio...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
