


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución del proyecto: Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud de uchiza nivel I-4, distrito uchiza, provincia de tocache ¿ san martin con CUI N° 2377763

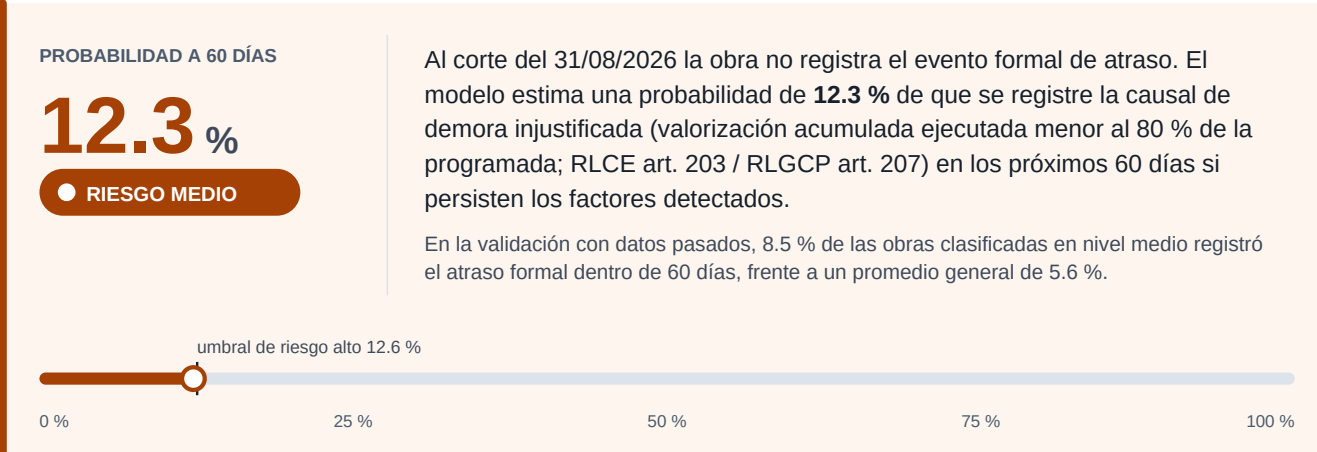


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	711 desde 24/09/2024	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UCHIZA NIVEL I-4, DISTRITO UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE ¿ SAN MARTIN CON CUI N° 2377763
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - ALTO HUALLAGA TOCACHE
Contratista	CONSORCIO TOKIO SALUD
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	UCHIZA / TOCACHE / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2377763
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE UCHIZA NIVEL I-4, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2274576
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 19,865,188.00
Cuaderno de obra digital	711 asientos entre 24/09/2024 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

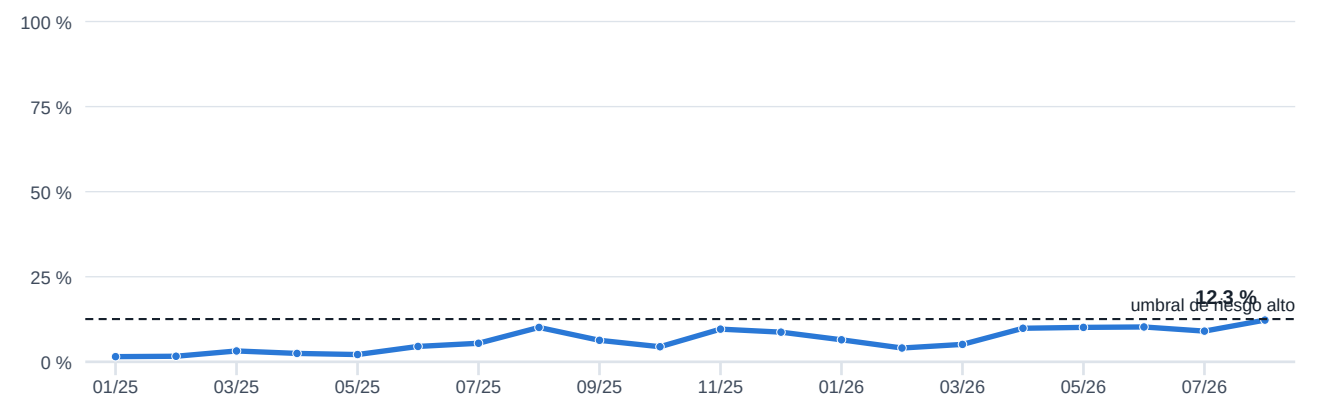

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (20 cortes, del 31/01/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.584
El 15 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.223
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.171
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 3,861,909	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.099
Gasto devengado en lo que va del año: S/ 13,169,727	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.072
30 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.069
Extensión media de los asientos recientes: 1,545 caracteres	Contenido de los asientos		-0.066

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	12.3 %	12.1 %	-0.2 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	12.3 %	12.3 %	+0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	12.3 %	12.3 %	+0.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 744 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 31/08/2026

IDENTIFICACION DE RIESGO DE AMPLIACION DE PLAZO POR DEMORA EN ABSOLUCION DE CONSULTA 80 POR PARTE DE LA ENTIDAD: 1) SE DEJA CONSTANCIA EN EL PRESENTE CUADERNO DE INCIDENCIAS DE OBRA QUE LA CONSULTA DE OBRA N° 80 - PROPUESTA DE CERRAMIENTO PARA VANOS Y/O, ABERTURAS EN ED. PRESENTADA MEDIANTE ASIEN TO N° 720 DEL 12/08/2026 Y CARTA 122-2026-CTS-AEH/RO, Y QUE ESTA A SU VEZ PRESENTADA A LA ENTIDAD POR EL SUPERVISOR MEDIANTE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 744 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 31/08/2026

identificacion de riesgo de ampliacion de plazo por demora en absolucion de consulta 80 por parte de la entidad . 1) se deja constancia en el presente cuaderno de incidencias de obra que la consulta de obra n 80 - propuesta de cerramiento para vanos y/o, abe...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 739 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 28/08/2026

PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD SOBRE LA CONSULTA DE OBRA N°77 – COMPLEMENTACIÓN TÉCNICA A LA PROPUESTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS PANELES DE CABECERO.: Mediante CARTA MÚLT. N°073-2026-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G, la Gerencia Territorial Alto Huallaga - Tocache remite a la Contratista CONSORCIO TOKIO SALUD y a la Supervisión CONSORCIO SUPER SALUD el INFORME N°0948-2026-GRSM-GTAHT/MRAH-T/INFRA, mediante el cual la En...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 734 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 21/08/2026

identificacion de riesgo de ampliacion de plazo por demora en la aprobacion de la pao n08 y deductivo vinculante n06. . mediante el presente asiento del cio, se deja constancia de lo siguiente:1. sobre el tramite para la aprobacion de la prestacion adicional...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 734 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 21/08/2026

... la supervision implementar accion alguna de la procedencia o no de la pao n08 y deductivo vinculante n06. este hecho configura un riesgo de ampliacion de plazo por causal atribuible a la entidad por incumplimiento de la normativa en el tramite de aprobacion de la pao n08.3. por otro lado, solicitamos al la contratista verificar la anotacion de inicio de causal de ampliacion de plazo, que eindic a en el a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 730 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 19/08/2026

identificacion de riesgo de ampliacion de plazo por demora en aprobacion del adiciOnal de obra 07 y deductivo de obra 05 . 1) se deja constancia en el presente cuaderno de incidencias de obra que el adicional de obra n 07 y deductivo vinculante de obra n 05 ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 731 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 19/08/2026

identificacion de riesgo de ampliacion de plazo por demora en aprobacion del adiciOnal de obra 08 y deductivo 06 . 1) se deja constancia en el presente cuaderno de incidencias de obra que el adicional de obra n 08 y deductivo vinculante de obra n 06 presenta...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 723 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

...de cabecero en camas de hospitalizacion en la que se plantea la incorporacion de circuitos independientes para iluminacion y tomacorrientes y/o fuerza, que no se determina en el proyecto contractual, incumpliendo las solicitudes de la nts n113-minsa/dgiem-v-01.3. cabe senalar que las incorporaciones y/o modificaciones planteadas, de ser aprobadas, pueda redundar en un mayor monto en el presupuesto de obr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
