


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ioarr: ¿construcción de pileta publica y línea de aducción, reparación de ptap: Adquisición de transformador de potencia, además de otros activos en la (la) sistema de agua potable de los caseríos ayar aucar y ayar cachi del valle de los incas, distrito de tambo grande, provincia piura, departamento

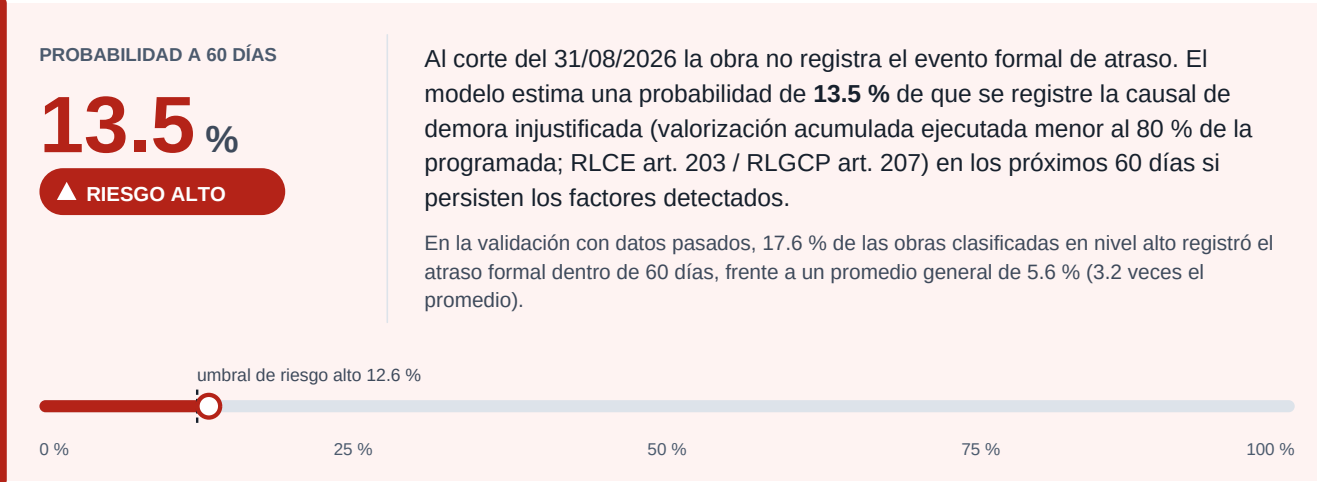


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	70 desde 24/06/2026	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	IOARR: ¿CONSTRUCCIÓN DE PILETA PUBLICA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, REPARACIÓN DE PTAP: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN LA (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERÍOS AYAR AUCAR Y AYAR CACHI DEL VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Contratista	CONSORCIO LIBERTAD
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	TAMBO GRANDE / PIURA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2676138
Inversión asociada	CONSTRUCCION DE PILETA PUBLICA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN REPARACION DE PTAP ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS AYAR AUCA Y AYAR CACHI DEL VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2396166
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 963,590.22
Cuaderno de obra digital	70 asientos entre 24/06/2026 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

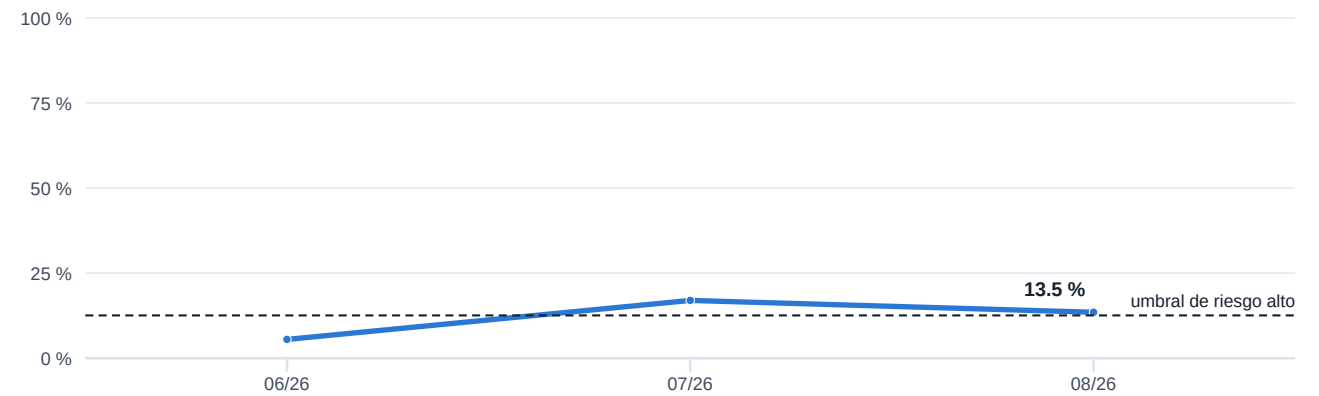

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.594
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.197
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.167
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.090
6 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.063
Registros del último mes: 0.77 veces el promedio mensual del trimestre	Actividad del cuaderno de obra		-0.054
Extensión media de los asientos recientes: 1,545 caracteres	Contenido de los asientos		-0.052

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.5 %	13.3 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.5 %	13.5 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	13.5 %	13.5 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	13.5 %	13.9 %	+0.4 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 68 · Adicionales · SOEC_SPV · 26/08/2026

... y afectacion al plan de trabajo.mediante carta n. 021-2026/ct-mdt-aaac/rkch-r se remite a la entidad la carta n. 019-2026/ct-mdt-aaac/lab-c-so y el informe tecnico de ratificacion. se advierte que la demora en el tramite puede afectar las actividades de puesta en servicio, la ruta critica y la fecha de termino contractual. la presente ratificacion no aprueba el expediente tecnico, presupuesto o plazo ni...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 62 · Adicionales · SOEC_RESI · 22/08/2026

NECESIDAD DE EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01: VIENE DE ASIENTO ANTERIOR:ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N° 02Mediante CARTA N° 193-2026/MDT-GjyC-SGEyP, de fecha 21/07/2026, la Entidad absuelve la Consulta N° 02, disponiendo que el tramo inicial de aproximadamente 1300 m sea adecuado para conformar la salida de la línea de aducción, utilizando la tubería existente de F•H• de 6", por trãarse de un tramo expuesto...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 60 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_SPV · 18/08/2026

SE SOLICITA LEVANTAMIENTO GENERAL DE LAS LÍNEAS E INFORME TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DE MAYORES METRADOS: EN ATENCIÓN AL ASIENTO N.º 59 DEL RESIDENTE DE OBRA, MEDIANTE EL CUAL SE ADVIERTE LA EXISTENCIA DE MAYORES METRADOS EN LAS TUBERÍAS DE 63 MM, 1 1/2" Y 1", ASÍ COMO EN LAS PARTIDAS CONTRACTUALES ASOCIADAS, ESTA SUPERVISIÓN TOMA CONOCIMIENTO DE LO COMUNICADO.CONFORME A LO COORDINADO, SE SOLICITA AL CONTRATISTA EFEC...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 39 · Consultas · SOEC_RESI · 21/07/2026

...rol hidraulico, que segun cronograma de ejecucion de obra debio empezar desde la fecha de inicio de obra 20/06/2026, tiene una duracion de 90 d.c. hasta la fecha de culminacion de obra 17/09/2026, su demora en la absolucion de la consulta n 03 estaria afectando la ruta critica del cronograma actualizado de obra, y por ende la afectacion del plazo de ejecucion de obra, por causas no atribuibles al contra...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 35 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 17/07/2026

inicio de causal de ampliacion de plazo por demora de absolucion de consulta 03 . del asiento que se enlaza, esta residencia dejo constancia respecto a la consulta 03 presentada a la supervision de obra, donde se solicito planos de detalles del siste...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 31 · Consultas · SOEC_RESI · 16/07/2026

... la fecha de inicio de obra 20/06/2026, tiene una duracion de 90 d.c., plazo de ejecucion de la obra, sin embargo hasta la fecha no se cuenta con planos de detalle de esta especialidad, por lo que la demora en la absolucion de esta consulta estaria afectando la ruta critica del cronograma actualizado de obra, y por ende la afectacion del plazo de ejecucion de obra, por causas no atribuibles al contratis...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 31 · Consultas · SOEC_RESI · 16/07/2026

VENCIMIENTO DE PLAZO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS N° 02 Y N°03: Se deja constancia en el presente asiento que con fecha de hoy se vence el plazo de absolución de CONSULTAS 02 ACLARACION DE ESPECIFICACIONES DE TUBERIA EN LINEA DE ADUCCIÓN y 03 CONSTATACIÓN DE PLANOS FALTANTES DE DETALLES AL EXPEDIENTE TECNICO por parte de la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la Entidad, respecto a la consulta 02 esta partida forma ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
