


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de la ejecución del saldo de obra: Mejoramiento de la vía vecinal R-21 (emp. TA-573 cinto ¿ caoña) prog. 6+186.49 al 10+923.49 anexo caoña, distrito de ilabaya, provincia jorge basadre, departamento de tacna CUI: 2502915

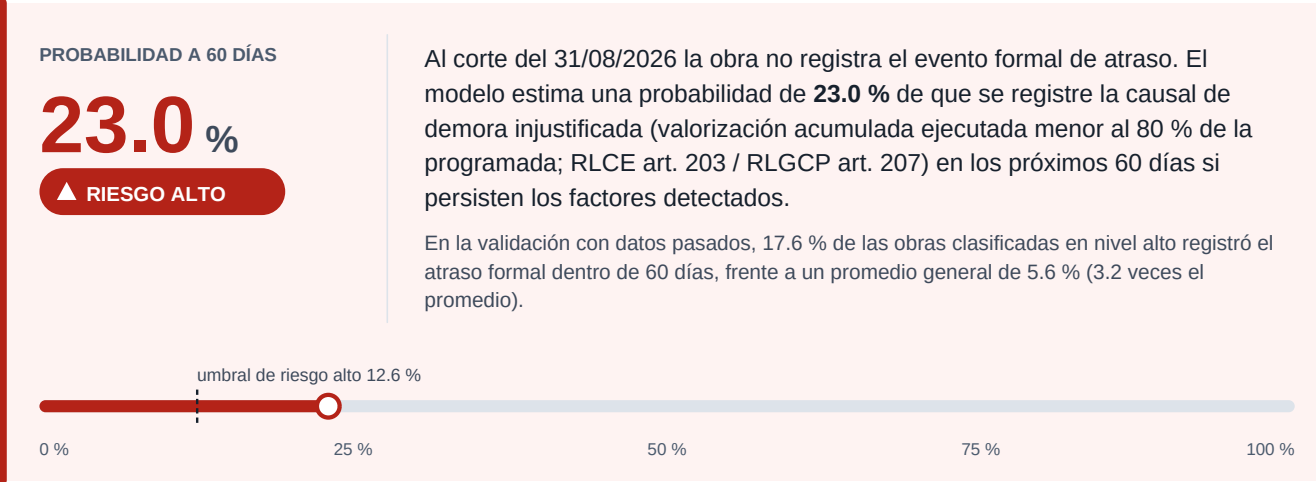


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	42 desde 09/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL R-21 (EMP. TA-573 CINTO ¿ CAOÑA) PROG. 6+186.49 AL 10+923.49 ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA CUI: 2502915
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Contratista	CONSORCIO MALLKU
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ILABAYA / JORGE BASADRE / TACNA
Código Único de Inversión (CUI)	2502915
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL R-21 (EMP. TA-573 CINTO ¿ CAOÑA) PROG. 6+186.49 AL 10+923.49 ANEXO CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA.
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2403279
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,028,376.93
Cuaderno de obra digital	42 asientos entre 09/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

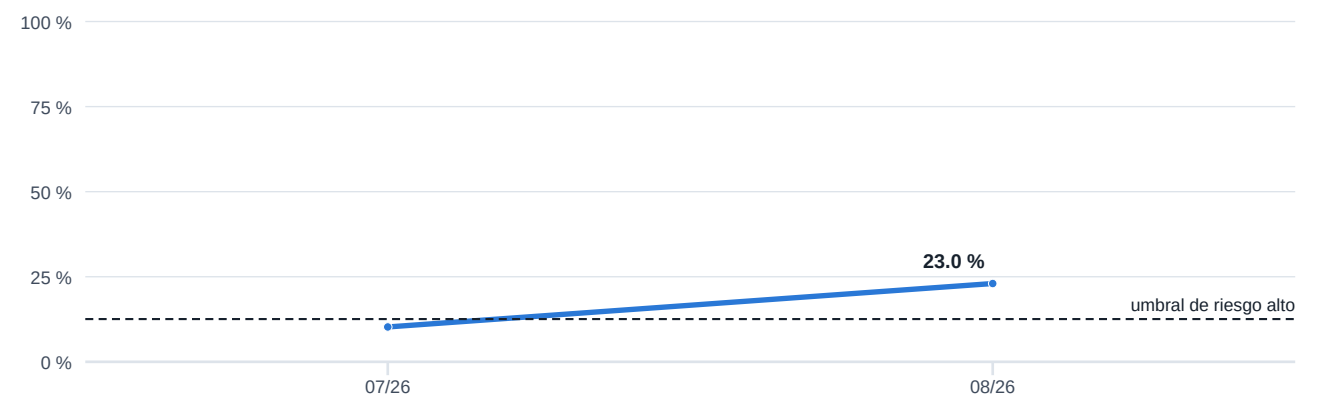

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.71 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.681
Departamento: Tacna	Características de la obra		+0.274
El 40 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.261
El 14 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.183
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.072
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 6,875	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.067
Extensión media de los asientos recientes: 1,675 caracteres	Contenido de los asientos		-0.066

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	23.0 %	23.0 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	23.0 %	23.0 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 42 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 31/08/2026

...de metrados de la valorización n 02 periodo agosto 2026 (pag 2-2) . viene... se ratifica que la totalidad de los frentes descritos se ejecutan bajo autofinanciamiento, dado que la entidad continua en incumplimiento de su obligación legal de transferir el adelantos solicitados, este evento restringe la adquisición de acero corrugado para badenes y alcantarillas, limitando el inicio del ítem ii (obras de a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 42 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 31/08/2026

...rada por la entidad. eventos de fuerza mayor por precipitación pluvial. amparados en el artículo 120.4 y el artículo 198.1, literal a) del reglamento, se deja constancia de que estos hechos configuran atrasos debidamente justificados y no imputables al contratista, manteniendo plenamente abierto y activo el hecho generador de atraso para sustentar eventuales solicitudes de ampliación de plazo y eximir a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...terferencia física generada por la vivienda no liberada en la prog km 10+785 sigue obstruyendo el trazo y restringe el inicio de las obras de arte, manteniendo plenamente activo el hecho generador de atraso justificado no imputable al contratista

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026

...rreno por la vivienda no liberada en la prog km 10+785 continua bloqueando el trazo proyectado para la construcción de obras de arte. ambos hechos mantienen configurado y activo el hecho generador de atraso justificado no imputable al contratista (art. 120.4 y art. 198.1, l. a)

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

...ajo descritos mediante autofinanciamiento, puesto que la entidad aun no efectúa la transferencia del adelanto directo al patrimonio fideicometido, manteniendo plenamente abierto el hecho generador de atraso no imputable de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 26 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 12/08/2026

...s en este frente de trabajo, el suscrito deja constancia de que el ritmo de ejecución se ve limitado por los hechos reportados en los anteriores asientos de cuaderno de incidencias. se reitera que el incumplimiento en el depósito de los adelantos directo y de materiales por parte de la entidad, y la falta de definición técnica sobre los laboratorios inacal, mantienen vigente el hecho generador de atraso ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

SUSTENTO DE ATRASOS NO IMPUTABLES, LIMITACIONES DE CERTIFICACIÓN LOCAL Y ALERTA DE PRESTACIONES ADICIONALES POR DEFICIENCIA DE EXPEDIENTE: EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL ASIENTO N.º 19, EL CONTRATISTA EXPONE LOS SIGUIENTES FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES:1. SE RATIFICA QUE LA SATURACIÓN DE LOS LABORATORIOS CON ACREDITACIÓN INACAL ES UNA CIRCUNSTANCIA EXTERNA A LA ESFERA DE CONTROL DEL CON...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 10/08/2026

inicio de hecho generador de atraso y afectación de ruta crítica por incumplimiento en depósito de adelantos (directo y materiales). . se informa a la supervisión de obra y a la entidad el inicio de una situación de atraso no imputable al contratista en la ejecución de la obr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 9 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/07/2026**

...tida 107.a3) y colectiva. se mantiene la senalización temporal de seguridad (partida 107.a4) en los frentes de trabajo, dando estricto cumplimiento a la normativa de seguridad laboral para evitar las penalidades señaladas en la cláusula decima sexta del contrato.- se ejecutan acciones del programa de prevención y control ambiental (partida 900.a), incidiendo en el manejo de residuos solidos (partida 900.c)...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 8 · Consultas · SOEC_RESI · 24/07/2026**

COMUNICACIÓN DE RIESGO POR SATURACIÓN DE LABORATORIOS ACREDITADOS Y SOLICITUD DE REUNIÓN DE CAMPO.: SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN Y A LA ENTIDAD QUE, HABIÉNDOSE INICIADO LA FASE DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS EN CANTERAS Y CONTROL DE CALIDAD PRELIMINAR, SE HA DETECTADO UNA LIMITACIÓN LOGÍSTICA CRÍTICA REFERIDA A LA EXIGENCIA DE LAS BASES SOBRE EL USO EXCLUSIVO DE LABORATORIOS ACREDITADOS POR INACAL O EN PROCESO DE ACREDITAC...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
