


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de la obra construccion de modulo de procesamiento primario de miel awajun en marco al proyecto de inversion mejoramiento del servicio de apoyo a la adopcion de tecnologias en la cadena apicola en los productores de miel en 10 provincias del departamento de san martin con CUI N. 2472299

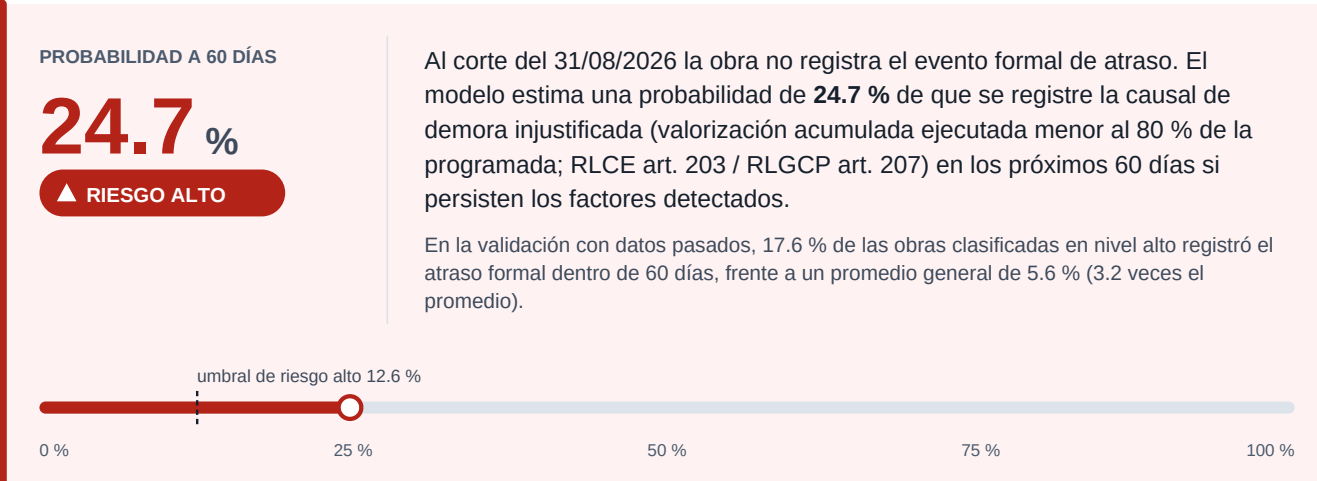

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	30 desde 12/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO DE PROCESAMIENTO PRIMARIO DE MIEL AWAJUN EN MARCO AL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS EN LA CADENA APICOLA EN LOS PRODUCTORES DE MIEL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CON CUI N. 2472299
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE SAN MARTIN
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR AWAJUN
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ELIAS SOPLIN VARGAS / RIOJA / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2472299
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LA CADENA APÍCOLA,EN LOS PRODUCTORES DE MIEL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Identificador del contrato (SEACE)	2411521
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,864,516.86

Cuaderno de obra digital

30 asientos entre 12/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.565
El 17 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.288
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.244
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.122
1 asiento de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.104
4 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.099
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.097
El 53 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.095

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	24.7 %	21.6 %	-3.1 pp
Absolver todas las consultas pendientes	24.7 %	24.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 29 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

...e, se recomienda al contratista continuar con la ejecución de las partidas programadas, adoptando las medidas necesarias para mantener el ritmo de ejecución previsto en el cronograma de obra y evitar retrasos, debiendo comunicar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de los trabajos.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA: En la fecha, la Supervisión de Obra realizó la verificación en campo de los trabajos ejecutados por el Contratista, constatándose la realización del trazo y replanteo de la estructura de almacén, verificándose la correcta ubicación, alineamiento y disposición de los elementos de acuerdo con los planos y documentos técnicos del expediente técni...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...l incremento de recursos, personal, equipos y/o frentes de trabajo, según corresponda, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra vigente y recuperar cualquier atraso que se pudiera estar presentando. se deja expresa constancia que el contratista debiera realizar el seguimiento permanente de su avance físico y adoptar oportunamente las medidas correctivas que corr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

REQUERIMIENTO DE SCTR Y DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGOS: Tomando en consideración que el día 13 de agosto de 2026, se inició el plazo de ejecución de obra, en la fecha, la Supervisión de Obra REQUIERE al Contratista que, en un plazo de 02 dc, haga llegar la documentación correspondiente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), Pensión y...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 13 · Órdenes · SOEC_SPV · 21/08/2026

aceleración y cumplimiento de la programación contractual ante atraso en la ejecución de partidas. se deja constancia que, a la fecha, efectuada la verificación del avance físico de la obra y su contrastación con el cronograma de ejecución de obra vigente, se adviert...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 18/08/2026

INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO VALORIZADO ADECUADO A LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: En calidad de SUPERVISOR DE OBRA, dejo constancia que la ejecución de la obra se inició el 13 de agosto de 2026, correspondiendo dicha fecha al inicio del plazo contractual, en el marco del Contrato de Ejecución de Obra N.º 004-2026-GRSM/DIREPRO. Al respecto, de conformidad con lo establecido en la Cláusul...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 18/08/2026

incumplimiento en la presentación del calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. en calidad de supervisor de obra, dejo constancia que la ejecución de la obra se inició el 13...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 9 · Órdenes · SOEC_SPV · 17/08/2026

...ecesaria para efectuar las coordinaciones oportunas con la entidad respecto a la ubicación definitiva del área de construcción. la entrega oportuna de dicha documentación resulta necesaria para evitar retrasos en la toma de decisiones y prevenir cualquier afectación al normal desarrollo de las actividades programadas, considerando que la definición de la ubicación del área de construcción se encuentra di...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 10 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 17/08/2026

REITERA SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMAS CONTRACTUALES: Esta Supervisión de Obra REITERA al Contratista, a través de su Residente de Obra, el requerimiento efectuado mediante asiento anterior, respecto a la presentación de la documentación contractual necesaria para el adecuado control y seguimiento de la ejecución de la obra, conforme a la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, su Reglamento y...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
