


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: ¿creación del servicio de sistema de agua potable y sistema de saneamiento básico rural en el centro poblado de sullcaray del distrito de chuschi - provincia de cangallo - departamento de ayacucho¿, con CUI nº 2517563

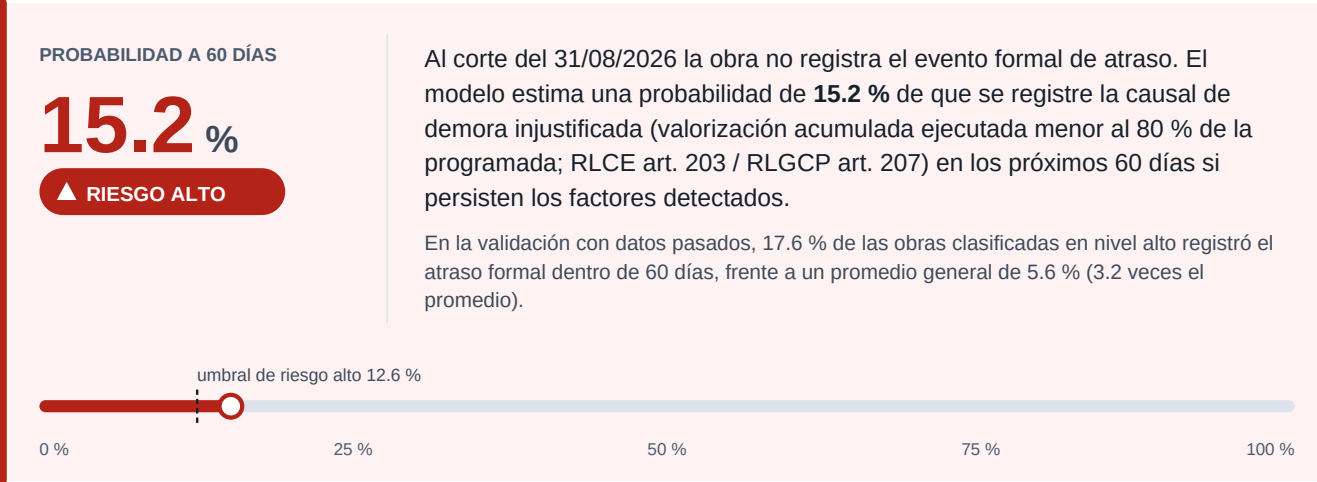


|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 106<br>desde 02/06/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE SULLCARAY DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO¿, CON CUI Nº 2517563 |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contratista                                     | CONSORCIO SALUD PONGO                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | CHUSCHI / CANGALLO / AYACUCHO                                                                                                                                                                                                                                        |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2517563                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inversión asociada                              | CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE SULLCARAY DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                  |
| Función                                         | SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2397815                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Monto del contrato                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 2,025,206.73                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cuaderno de obra digital                        | 106 asientos entre 02/06/2026 y 31/08/2026                                                                                                                                                                                                                           |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

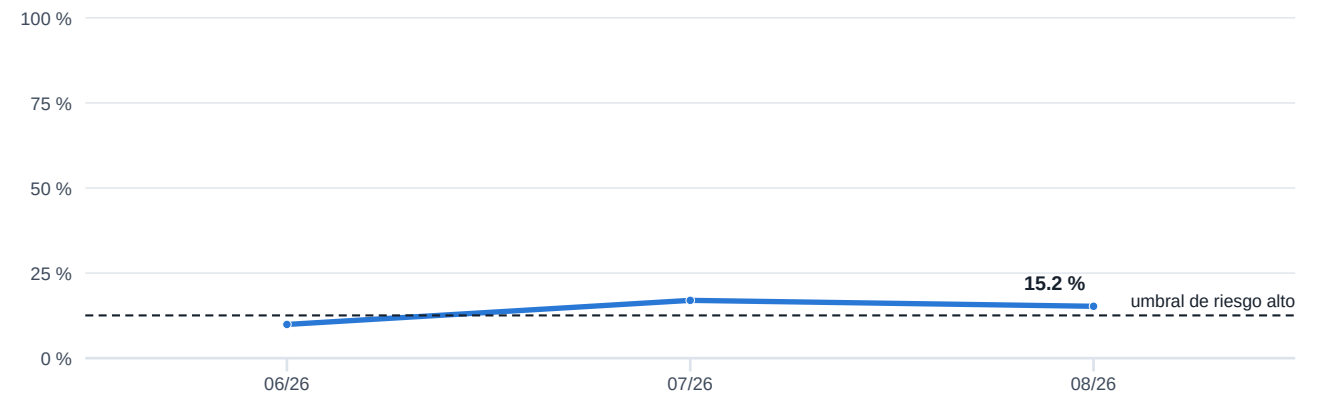

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                                    | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.48 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos                | <div></div>    | +0.219 |
| El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos                | <div></div>    | +0.212 |
| El 63 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección           | Actividad del cuaderno de obra           | <div></div>    | +0.187 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra           | <div></div>    | +0.127 |
| Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes                                                    | Actividad del cuaderno de obra           | <div></div>    | +0.120 |
| El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                         | Contenido de los asientos                | <div></div>    | +0.103 |
| 3 obras anteriores del contratista tuvieron atraso formal                                               | Historial de la entidad y el contratista | <div></div>    | +0.068 |
| El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad                         | Contenido de los asientos                | <div></div>    | +0.062 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días | 15.2 % | 15.0 %    | -0.2 pp |
| Absolver todas las consultas pendientes                 | 15.2 % | 15.2 %    | +0.0 pp |

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

**Asiento N.º 88 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 17/08/2026**

OCURRENCIAS EN LA OBRA: A LA PRESENTE, SE VERIFICAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES A LA HABILITACIÓN DE ENCOFRADO Y ACERO PARA OBRAS DE ARTE. ASIMISMO, SE REALIZA LA PRUEBA HIDRÁULICA EN LOS TRAMOS INSTALADOS, ASÍ COMO EL TAPADO DE TUBERÍAS. TAMBIÉN SE VERIFICA EL MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL Y EL TRAZO Y REPLANTEO EN MUROS PARA LAS INSTALACIONES DE AGUA Y SANITARIAS.FINALMENTE, SE VERIF...

Fuente: cod-asientos202608.csv

**Asiento N.º 88 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 17/08/2026**

...copio y disposicion de los residuos generados durante la construccion.tambien se hace entrega al residente de la carta n 032-2026-supervision-css/ypg/rc, mediante la cual se remite la notificacion de apercibimiento por atraso critico y el requerimiento formal de presentacion obligatoria del plan de recuperacion y cronograma de ejecucion acelerado actualizado.

Fuente: cod-asientos202608.csv

**Asiento N.º 69 · Respuestas a consultas · SOEC\_SPV · 29/07/2026**

...ando accesibilidad y adecuado uso por parte del beneficiario.se deja constancia que la presente aprobacion no exime al contratista de su responsabilidad sobre la calidad de ejecucion, y que cualquier incumplimiento sera motivo de no conformidad y no reconocimiento para valorizacion.

Fuente: cod-asientos202607.csv

**Asiento N.º 58 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 20/07/2026**

OCURRENCIA EN OBRA: SE VERIFICA LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATIS EN LOS DIFERENTES FRENTES PROGRAMADOS: EXCAVACION DE ZANJAS CON MATERIAL SUELTO EN REDES DE DISTRIBUCION, INSTALACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, ASENTADO DE LADRILLO TIPO SOGA UNA CARAVISTA (LADRILLO ARTESANAL 18 HUECOS), SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES SIGUIENTES:1. PREVEER PASE DE MADERA (PASA...

Fuente: cod-asientos202607.csv

**Asiento N.º 49 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 13/07/2026**

OCURRENCIA EN OBRA: A LA PRESENTE, SE VERIFIAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN VACIADO DE CONCRETO 1:10 + 30%PG EN CIMIENTO CORRIDO, ASI COMO VACIADO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN ZAPATAS DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO.SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA:1. REALIZAR EL CURADO PERMANENTE DEL CONCRETO RECIENTEMENTE VACIADO, LA MISMA QUE QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD SU CUMPLIMIENTO.2. REALIZAR LA LIMPIEZA DE...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
