


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución del saldo de obra "reconstrucción y rehabilitación de infraestructura vial de la zona oeste del distrito de tumbes - tumbes - tumbes, ítem i CUI N° 2431423"

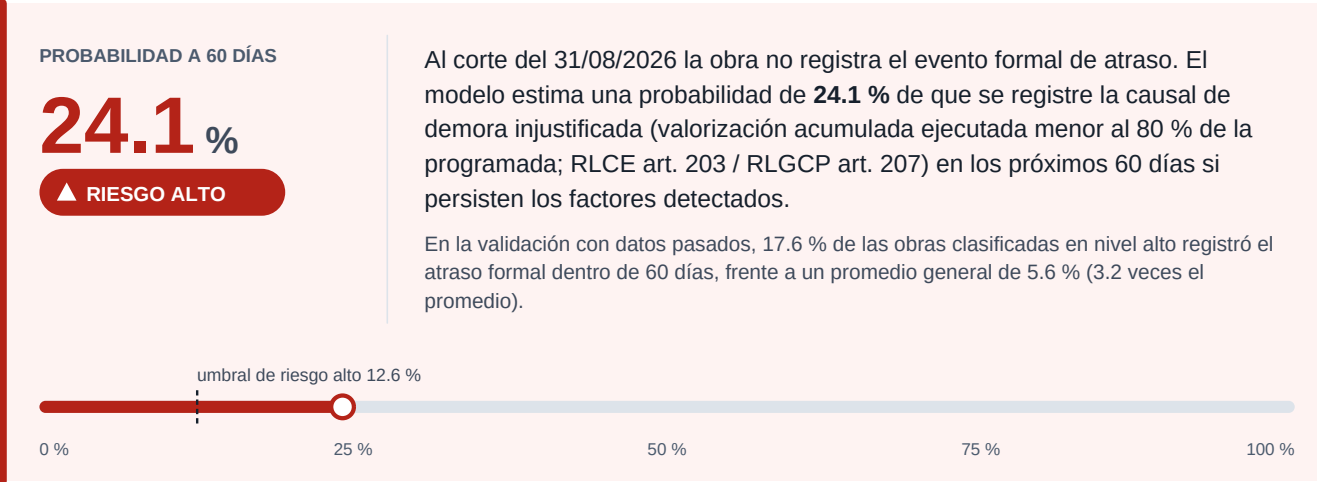


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	41 desde 24/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES, ÍTEM I CUI N° 2431423"
Entidad contratante	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - Administración General
Contratista	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	TUMBES / TUMBES / TUMBES
Código Único de Inversión (CUI)	2431423
Inversión asociada	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES ¿ TUMBES.
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2407550
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 10,269,012.84
Cuaderno de obra digital	41 asientos entre 24/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

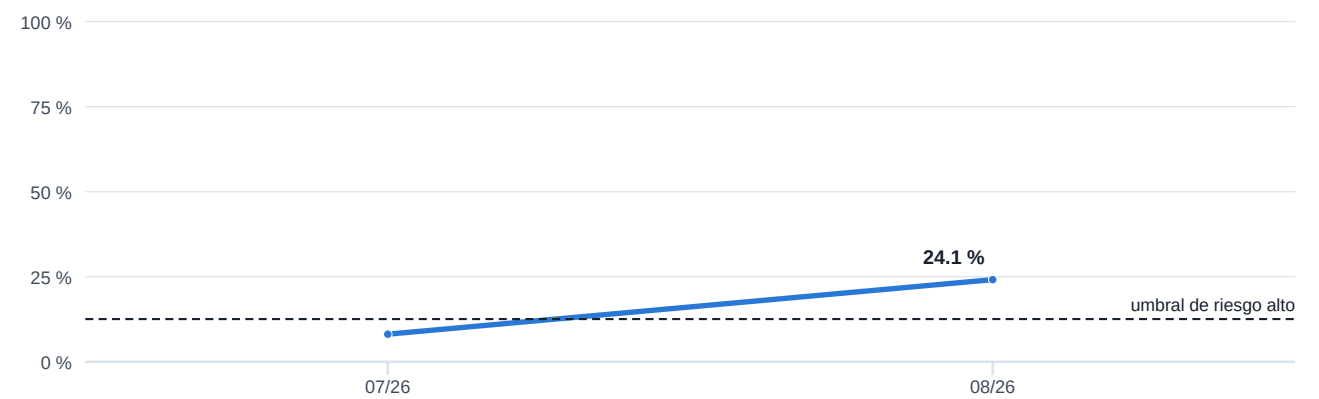

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.71 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.634
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.283
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.245
El 54 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.163
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.121
10 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.100
Hubo registros en el cuaderno 20 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.088
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.081

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	24.1 %	24.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 41 · Órdenes · SOEC_INSP · 31/08/2026

VERIFICACIÓN DE CORRECCIÓN DE TUBERÍA, PRESENTACIÓN DE VALORIZACIÓN Y REITERACIÓN DE RECURSOS PARA RECUPERACIÓN DE AVANCE: *n la inspección realizada en la fecha, se verificó que el Contratista viene ejecutando trabajos de corrección de la tubería PVC UF DN 315 mm, NTP-ISO 1452, Clase 10, en el tramo comprendido entre las progresivas 0+250 y 0+270. Al respecto, se deja constancia que resulta necesario completar el tra...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 41 · Órdenes · SOEC_INSP · 31/08/2026

... que correspondan para disponer de mayor cantidad de personal, equipos y maquinaria, considerando que existen frentes de trabajo disponibles para su atencion. se deja expresa constancia que cualquier retraso, menor rendimiento o afectacion al cumplimiento de las metas y plazos contractuales que se origine por insuficiencia de recursos, inadecuada planificacion o falta de atencion oportuna de los frentes...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 40 · Órdenes · SOEC_INSP · 28/08/2026

...ama de obra, la partida 03.01.07 reposicion de tuberia pvc uf dn 315 mm ntp iso 1452 c-10 debio ejecutarse del 28/07/2026 al 04/08/2026, habiendose registrado en asientos anteriores las incidencias y retrasos atribuibles al contratista.por otro lado, se autoriza el abastecimiento de material proveniente de la cantera la pena (san jacinto), considerando que cuenta con los ensayos correspondientes, con la...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Adicionales · SOEC_INSP · 25/08/2026

COMUNICACIÓN DEL INFORME DE NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE: *En atención al asiento precedente, se deja expresa constancia que, mediante Asiento de Cuaderno de Obra N.º 23 de fecha 19.08.2026, el suscrito comunicó que la Entidad, con fecha 18.08.2026, había remitido vía correo electrónico la absolución de la Consulta de Obra N.º 01. En consecuenc...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Adicionales · SOEC_INSP · 25/08/2026

... residente de obra, en el ambito de sus funciones y con la debida diligencia, efectuar la anotacion de la necesidad de ejecutar la prestacion adicional, no resultando atribuible al suscrito cualquier demora derivada de la falta de actuacion oportuna del residente.sin perjuicio de lo anterior, y con la finalidad de garantizar la continuidad del procedimiento y cautelar los intereses de la entidad, en la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 31 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 20/08/2026

...mplimiento de las cotas y dimensiones previstas.asimismo, se deja constancia que, a fin de incrementar el rendimiento de las actividades de movimiento de tierras y contribuir a la recuperacion de los atrasos acumulados, se requiere al contratista evaluar y disponer la incorporacion de una excavadora adicional y un mayor numero de volquetes, de manera que se garantice la continuidad del ciclo de excavac...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Órdenes · SOEC_INSP · 05/08/2026

...idos para la presentacion de la compatibilizacion del expediente tecnico, debiendo efectuar las acciones administrativas y tecnicas necesarias para su presentacion oportuna. la responsabilidad por el incumplimiento de dicha obligacion recae exclusivamente en el contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 8 · Participación del personal clave · SOEC_INSP · 03/08/2026

REITERACIÓN DE DISPOSICIONES DE LA INSPECCIÓN: En la reunión de coordinación realizada en oficina se dejó constancia de la inasistencia del Especialista Ambiental, del Especialista en Mecánica de Suelos y Pavimentos y del Administrador de Obra, conforme al acta adjunta. Durante la inspección en campo, SE REITERA al Residente de Obra incrementar de manera inmediata los frentes de trabajo, cuadrillas y recursos, a fin d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
