


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Remodelacion de sistema de abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado, en el(la) servicio de saneamiento del sector casalla distrito de tupac amaru inca, provincia pisco, departamento ica"con CUI N°2696398¿

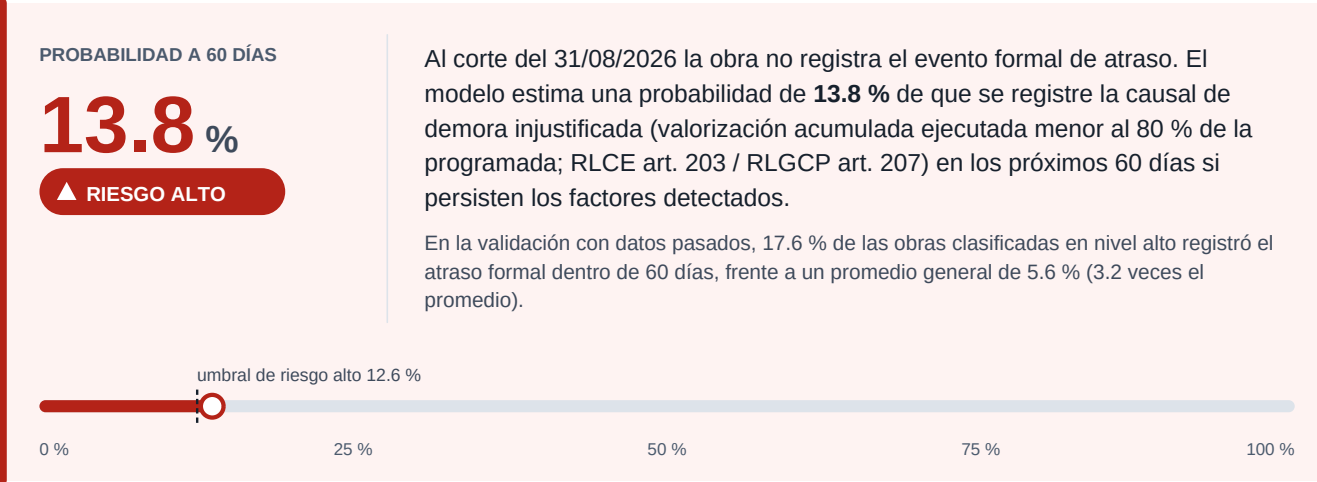


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	48 desde 22/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	REMODELACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL(LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL SECTOR CASALLA DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA"CON CUI N°2696398¿
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
Contratista	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	TUPAC AMARU INCA / PISCO / ICA
Código Único de Inversión (CUI)	2696398
Inversión asociada	REMODELACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL SECTOR CASALLA DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2396580
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,083,855.87
Cuaderno de obra digital	48 asientos entre 22/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

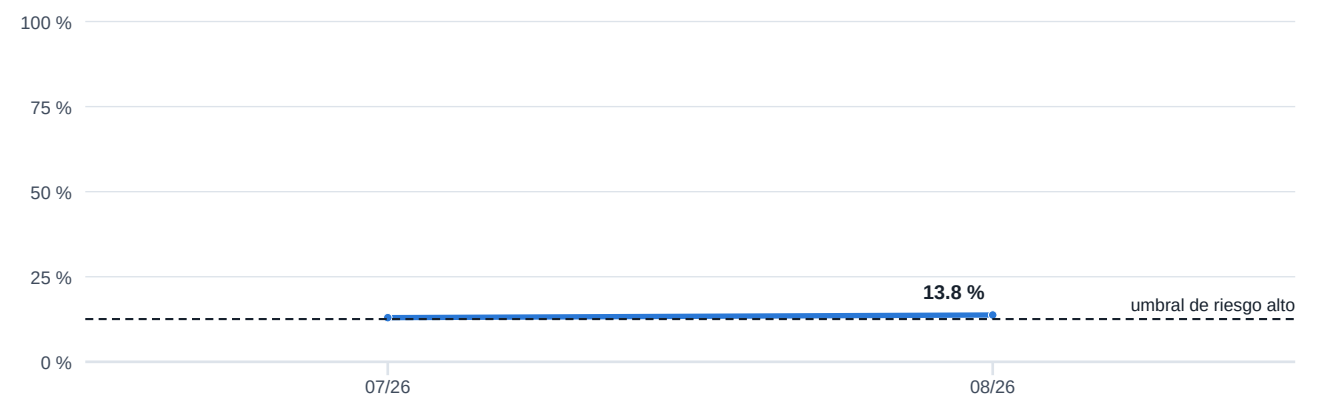

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.70 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.668
El 56 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.273
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.211
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.093
Extensión media de los asientos recientes: 1,431 caracteres	Contenido de los asientos		-0.077
Hubo registros en el cuaderno 21 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.076
Departamento: Ica	Características de la obra		-0.074
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.068

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	13.8 %	13.8 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 37 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS: Se toma conocimiento de lo expresado respecto a la existencia de interferencias de redes no contempladas en los planos entregados por la empresa EMAPISCO S.A., entregados por la Municipalidad con CARTA N°550-2026 MPPGIP/SGIOPUB donde deriva los planos emitidos por EMAPISCO. Se le recuerda al Contratista que toda modificación o propuesta de variación debe tramitarse formalmente según el proc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

... a la entidad y se encuentra a la espera de las acciones a realizar, solicitando la pronta liberación para mitigar mayores impactos en la ruta crítica de la obra. se toma conocimiento de los posibles retrasos generados en la programación contractual por causas no imputables al contratista. se recuerda a la residencia realizar el registro detallado de las incidencias técnicas y la cuantificación de los d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026

...a, no ha efectuado el saneamiento físico-legal de los inmuebles involucrados, impidiendo disponer de las áreas requeridas para la ejecución de las partidas programadas. esta condición viene generando retrasos y desfases respecto de la programación contractual, por causas no imputables al contratista. en tal sentido, se solicita a la supervisión comunicar formalmente esta eventualidad a la municipalidad y...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 16/08/2026

...ciones informales (comerciantes, casetas, talleres, jardines) entre el bz 5 y el bz 1. o se precisa al contratista que esta supervisión ya ha comunicado a la entidad respecto a estas dificultades que retrasan los trabajos de avance de la obra. inicio de excavación red hdpe dn 110 mm: o se verifican trabajos en av. los marinos - las garzas. se autoriza la prosecución de los trabajos de excavación bajo el ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 15 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

SUPERVISIÓN DE TRABAJOS: • Se AUTORIZA la excavación de los buzones N° 08 y N° 09 de acuerdo con los trazos definidos en el Plano de Replanteo Inicial. • Se toma conocimiento de lo coordinado con la Gerencia de Obras de EMAPISCO respecto a la inoperatividad de la red existente de CSN de 4". No obstante, el Contratista deberá ejecutar los trabajos de excavación del tramo Bz-08 a Bz-09 con el debido cuidado y proteccio...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 03/08/2026

...ta a la supervisión efectuar las coordinaciones y gestiones necesarias ante la entidad para que se otorgue oportunamente la libre disponibilidad física y legal de las áreas afectadas, a fin de evitar retrasos en la programación de la obra y las consecuencias que ello pudiera generar sobre el plazo contractual.

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
