


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecucion de la obra: Remodelación de línea primaria, en el (la) alimentador OCC-204 (tramo la succha - hacienda STA. Lucia) - distrito de cañaris, provincia de ferreñafe, departamento de lambayeque

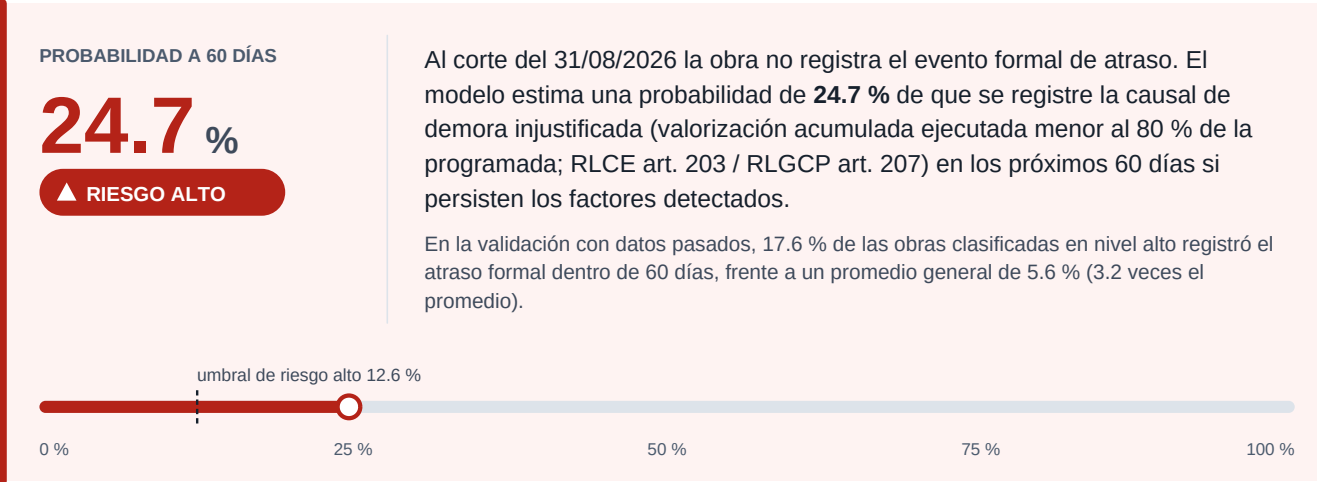


|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 119<br>desde 05/05/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR OCC-204 (TRAMO LA SUCCHA - HACIENDA STA. LUCIA) - DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE |
| Entidad contratante                             | EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.                                                                                                                                          |
| Contratista                                     | CONSORCIO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | CAÑARIS / FERREÑAFE / LAMBAYEQUE                                                                                                                                                                       |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2536758                                                                                                                                                                                                |
| Inversión asociada                              | REMODELACION DE LINEA PRIMARIA EN EL(LA) ALIMENTADOR OCC-204 (TRAMO LA SUCCHA - HACIENDA STA LUCÍA) - DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                |
| Función                                         | ENERGÍA                                                                                                                                                                                                |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2377133                                                                                                                                                                                                |
| Monto del contrato                              | -                                                                                                                                                                                                      |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 1,878,051.83                                                                                                                                                                                        |
| Cuaderno de obra digital                        | 119 asientos entre 05/05/2026 y 31/08/2026                                                                                                                                                             |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

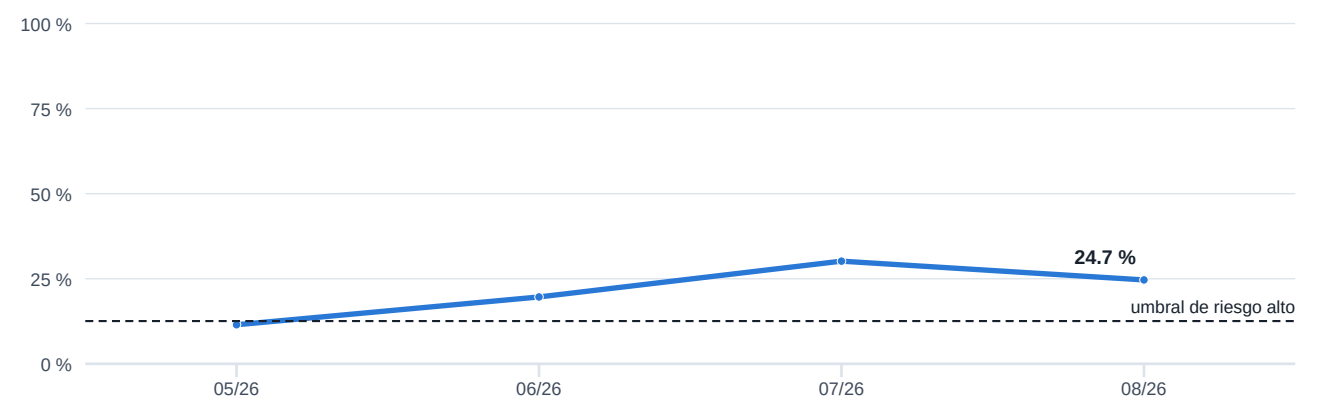

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.78 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.707 |
| El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.275 |
| El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                         | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.189 |
| Departamento: Lambayeque                                                                                | Características de la obra     | <div></div>    | +0.185 |
| El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal                       | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.152 |
| Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.78 (escala de 0 a 1)                     | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.116 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.112 |
| Entidad contratante: otra entidad pública                                                               | Características de la obra     | <div></div>    | +0.092 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días | 24.7 % | 24.4 %    | -0.3 pp |
| Absolver todas las consultas pendientes                 | 24.7 % | 24.6 %    | -0.1 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 115 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 28/08/2026

*...iterativa de su arqueologo asignado, esta en proceso del informe pertinente, y se comunicara oportunamente al consorcio universitario, en cumplimiento del contrato de obra n gr-006-2026 - clausula xv penalidades.finalmente, en merito al contenido del asiento n 112 y el presente, se le solicita que remita con caracter de urgente, las charlas de seguridad de 5 minutos, a partir del 17.08.2026 hasta la fecha,...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 112 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 26/08/2026

*...nacistencia reiterada de especialista en monitoreo arqueologico . en respuesta al asiento n 111 y otros anteriores, en las partes referidas a excavaciones para pat y cimentacion de torretas, se viene incumpliendo los objetivos de plan de monitoreo arqueologico, debido a: inasistencia del profesional especialista, y se reitera que: en forma obligada, debe ser presenciada y supervisada por el arqueologo de...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 105 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 18/08/2026

*... su pts n 16, segun cartas nos. 64-2026-cu-ro y 65-2026-cu-ro, contienen estos errores u omisiones, es su defecto, se esta transgrediendo lo estipulado en el contrato n gr-006-2026: clausula xv otras penalidades, numerales 4 y 7, y dispositivos legales cuya competencia le corresponde al ministerio de cultura. se tomaran las debidas evidencias en campo, para proceder a los correctivos necesarios.*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 100 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 12/08/2026

*...026, se requiere la participacion y acompanamiento de parte de un profesional en arqueologia, como minimo, durante la ejecucion de las referidas actividades de obras de infraestructura y servicios su incumplimiento habria transgredido lo estipulado en el contrato n gr-006-2026, porque vuestro arqueologo estaba programado para charla de induccion del area de seguridad de ensa en chichlayo y no efectuaba su...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 96 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 10/08/2026

*DOCUMENTOS CURSADOS - ATENCIONES VARIAS: DE LOS DOCUMENTOS CURSADOS:1) El Supervisor de Obra, mediante Informe Técnico N° 006-2026-SSCS/SO del 06.08.2026 ha dado respuesta a la carta N° 054-2026-CU-RO del Contratista y a la anotación del Asiento 85 del Residente de Obra, respecto a la Revisión del Expediente de Replanteo de Obra e Ingeniería de Detalle, presentado por el Contratista, dada la magnitud de las observaci...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 90 · Respuestas a consultas · SOEC\_RESI · 05/08/2026

*...026-cu/ro.al respecto, precisamos lo siguiente:apertura de causal: mediante asiento n 30 de fecha 15.06.2026, esta residencia dejo constancia formal del inicio de causal de ampliacion de plazo por la demora en la absolucion de consultas tecnicas formuladas al proyectista, situacion no imputable al contratista que afecto la ruta critica del programa de ejecucion de obra.cierre de causal: con la recepcion...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 88 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 03/08/2026

*...azo segun cuaderno de incidencia n 30 y 31, por no respuesta de absolucion de consultas por parte del proyectista.solicitud de ampliacion de plazo segun asiento de cuaderno de incidencias n 35 por la demora en la aprobacion de planos de replanteo de obra.acceso denegado segun asiento n 041 a la absolucion de consultas por parte del proyectista.cuantificacion de retraso segun residente de obra anotado en...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Asiento N.º 79 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 23/07/2026</b></p> <p>...o el contratista se abocara a ejecutar actividades pendientes en el frente de trabajo que no estan vinculadas a la ejecucion de este elemento (actividad critica), por tanto se deja constancia que, el retraso y por consiguiente afectacion directa a la ruta critica debido a la demora y/o falta de definicion dentro de los plazos establecidos no seran imputables al contratista, toda vez que la contratista h...</p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p>           |
| <p><b>Asiento N.º 77 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 23/07/2026</b></p> <p>ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL PTS N° 12: En atención al Asiento 76, se reitera que el Residente de Obra no está cumpliendo con el estricto cumplimiento con el Plan de Trabajo N°12 (debidamente aprobado), y se le recomienda que revise el referido Plan de Trabajo aprobado. Respecto al Izado de Torretas, el Supervisor de Obra, precisa que dicha actividad no está incluida en este Plan de Trabajo, y el motivo principal e...</p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p> |
| <p><b>Asiento N.º 72 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 20/07/2026</b></p> <p>...erdo con el cronograma de ejecucion de obra y el plan de trabajo aprobado (n 11 y n 12), el inicio del izado de torretas estaba programado para el 06 de julio de 2026, sobre el cual, a fin de mitigar demoras, nuestra representada viene realizando el traslado de las estructuras a los puntos de izaje.3. por lo expuesto, advertimos que la falta de pronunciamiento oportuno sobre el diseno tecnico propuesto,...</p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p>   |
| <p><b>Asiento N.º 66 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 16/07/2026</b></p> <p>documentacion de cambio de residente adjunto . se comunica que la entidad mediante carta n ensa-adp-jvc-0849-2026 de fecha 08.07.2026 ha solicitado informe de penalidad por la no presentacion de sustento, para la sustitucion de personal...</p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Asiento N.º 66 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 16/07/2026</b></p> <p>DOCUMENTACIÓN DE CAMBIO DE RESIDENTE ADJUNTO: Se comunica que la Entidad mediante carta N° ENSA-ADP-JVC-0849-2026 de fecha 08.07.2026 ha solicitado Informe de Penalidad por la no presentación de sustento, para la sustitución de personal clave (Residente Adjunto), por parte de su representada. En mérito a lo indicado, se solicita a la Contratista, que precise con qué documentación realizó la presentación del actual Re...</p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p> |

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
