


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Creación del servicio educativo en la i.e.i jorge Chávez de la asociación de vivienda jorge Chávez, distrito de cerro colorado, arequipa-arequipa¿ con CUI 2330010

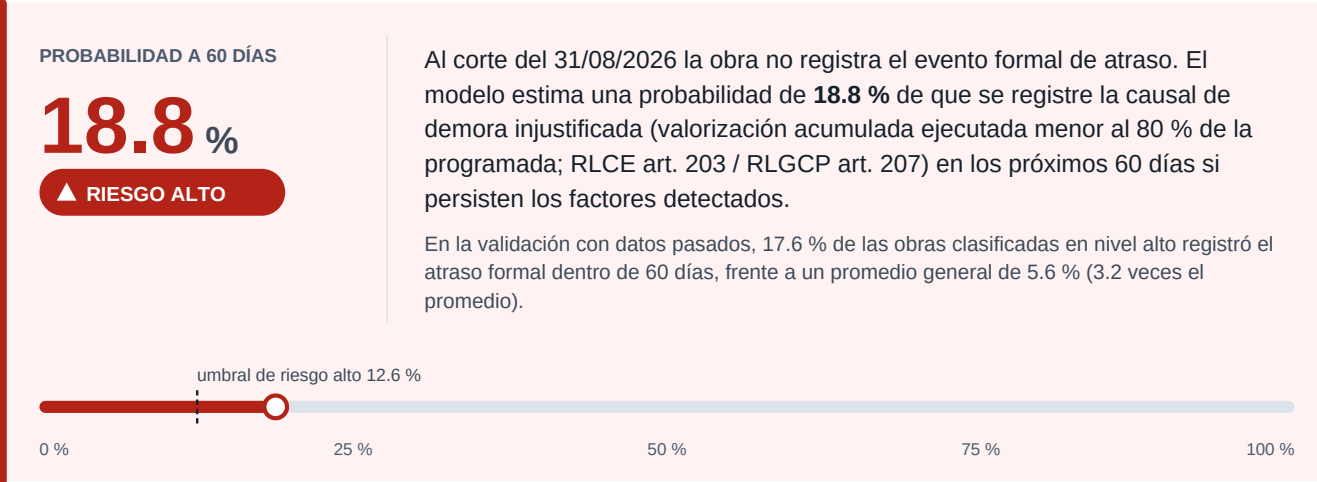


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	54 desde 04/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I JORGE CHÁVEZ DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA JORGE CHÁVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA-AREQUIPA¿ CON CUI 2330010
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Contratista	CONSORCIO EDUCATIVO COAR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CERRO COLORADO / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2330010
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. JORGE CHAVEZ DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2407328
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,811,972.00
Cuaderno de obra digital	54 asientos entre 04/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

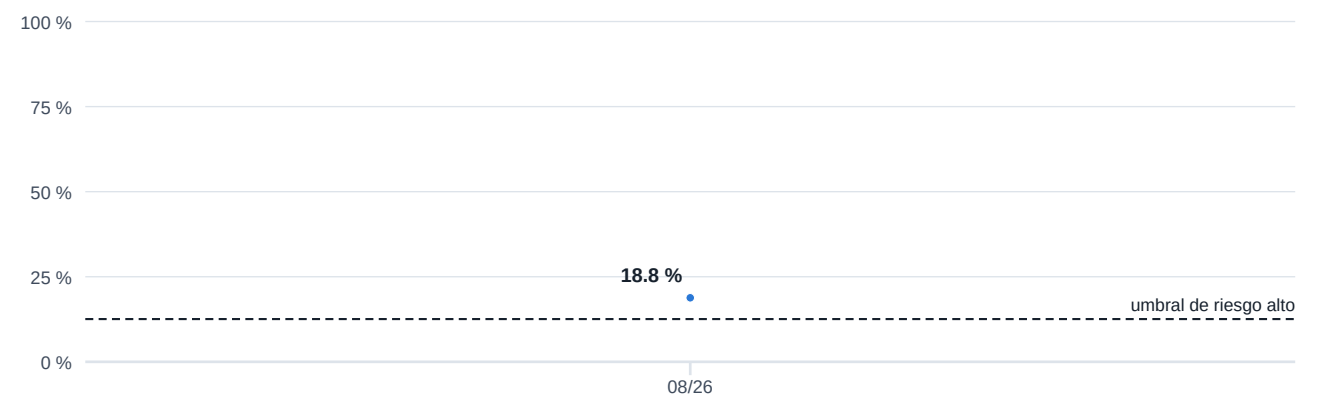

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.74 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.650
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.189
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.149
El 54 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.123
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.74 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.120
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.115
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
Hubo registros en el cuaderno 18 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.074

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	18.8 %	18.6 %	-0.2 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	18.8 %	18.8 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	18.8 %	18.8 %	+0.0 pp

05

Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

- Asiento N.º 41 · Consultas · SOEC_RESI · 24/08/2026

...solidadora, priorizando por su riesgo de ruta crítica las observaciones n 01, 03, 13, 14, 15, 17 e iiss n01, 04, 05, 06 e iiee n01, 02.se deja constancia expresa que esta presentacion no convalida el incumplimiento ya producido del plazo de 10 días hábiles del art. 171.3, vencido sin pronunciamiento formal de la entidad sobre el informe n04-2026-arq.erm (asiento n28) pese a lo reiterado en el asiento n3...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 31 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

REITERATIVO DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS.: Reiterativo en la Solicitud de presentación de la siguiente documentación de la contratista:- Documentación del Depósito de materiales excedentes (DME) – Solicitado en el Asiento N° 12- Plan de Mitigación y Manejo Ambiental – Solicitado en el Asiento N° 12- Presentación de los Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR) – Solicitado en el Asiento N° 13 - Cronogra...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 18 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTOS CON RESPECTO AL PMAR: Con respecto a lo mencionado en el Asiento de Obra N° 17 de la Residencia de Obra, se toma de conocimiento que con fecha 11 de Agosto del 2026 se tuvo la visita técnica del Personal del Ministerio de Cultura, con la finalidad de realizar una inspección y emitir recomendaciones relacionadas al Plan de Monitoreo Arqueológico tal como se menciona en el Asiento ...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

EJECUCION DE OBRA Y DOCUMENTACION SOLICITADA: El día de hoy se vienen ejecutando los trabajos correspondientes a la Partida 01.01.02. Almacén Provisional de Obra, los cuales vienen siendo verificados y supervisados en campo. Se recomienda aumentar los frentes de trabajo para poder cumplir con las metas.Finalmente, se solicita al Contratista la presentación de los SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) corr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
