


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion ejecución de la obra correspondiente a la ioarr: Renovación de captación de agua y línea de conducción en el sistema de agua potable del distrito de juanjui, provincia de mariscal CÁCERES, departamento de san martín, con CUI nº 2597796

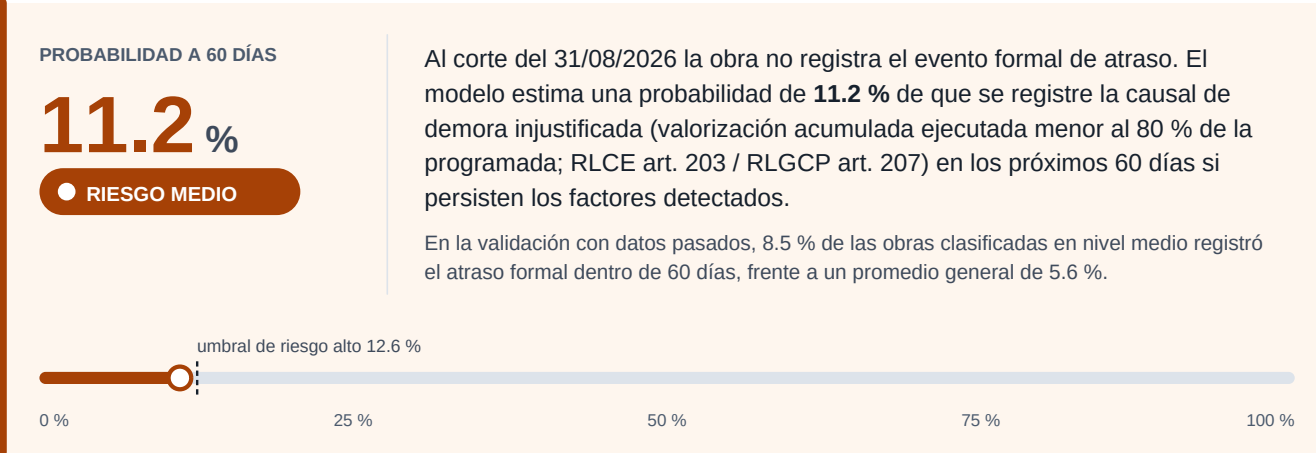


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	208 desde 09/02/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION EJECUCIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA IOARR: RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, CON CUI N° 2597796
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN Sede Central
Contratista	CONSORCIO ATLANLLER
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	JUANJUI / MARISCAL CACERES / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2597796
Inversión asociada	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2374345
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,745,426.20
Cuaderno de obra digital	208 asientos entre 09/02/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

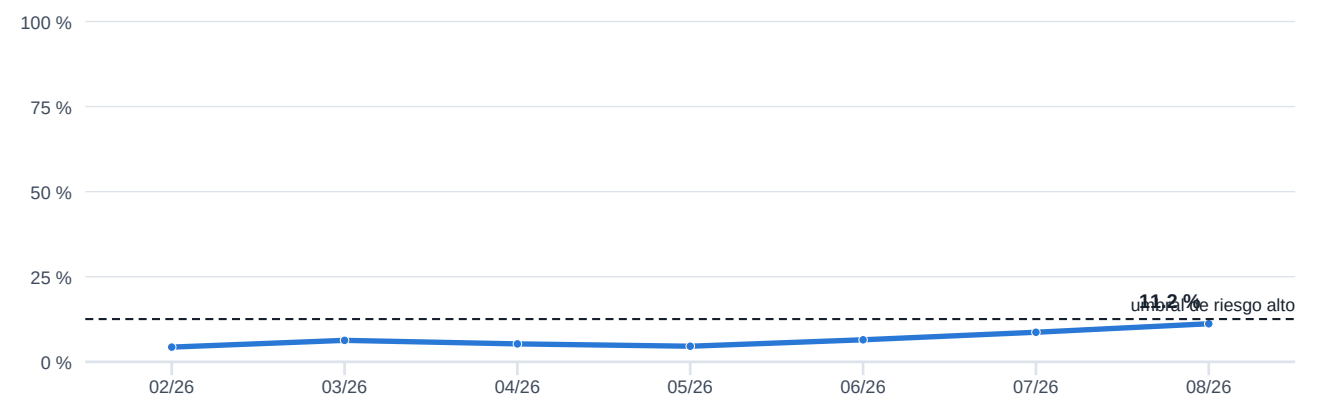

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (7 cortes, del 28/02/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.50 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.433
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.191
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.182
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.113
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.108
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.080
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		-0.054
Extensión media de los asientos recientes: 956 caracteres	Contenido de los asientos		-0.053

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.2 %	11.0 %	-0.2 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.2 %	11.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 191 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

RESPUESTA A CONSULTA DEL RESIDENTE DE OBRA: ESTA SUPERVISOR EN RESPUESTA A LOS ASIENTOS N° 189 Y N° 190 DONDE EL RESIDENTE PROPONE TÉCNICAMENTE, 1. MODIFICAR EL TRAZO DEL MURO DE GAVIONES ENTRE LAS PROGRESIVAS 0+057.60 AL 0+167.17. 2. REUBICAR LA CASETA DE BOMBEO HACIA UN TERRENO ADYACENTE QUE YA CUENTA CON DISPONIBILIDAD FÍSICA LEGAL Y ÓPTIMAS CONDICIONES GEOTÉCNICAS, SEGÚN PLANO DE REPLANTEO ADJUNTO POSTERIOR A DIC...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 189 · Consultas · SOEC_RESI · 06/08/2026

CONSULTA SOBRE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE TRAZO Y REUBICACIÓN DE CASETA DE BOMBEO: Se pone en conocimiento de la Supervisión de obra que, durante las verificaciones de campo en el tramo de la defensa ribereña proyectada (Progresivas 0+057.60 al 0+167.17, según Plano GV-02 de Estructuras), se constataron graves discrepancias altimétricas respecto al Expediente Técnico. El proyectista consideró una sección de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 185 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 05/08/2026

...amiento de san martin (cui no 2597796), tramite que fue gestionado por el contratista desde el 26 de febrero de 2026. se registra que el tiempo transcurrido para la obtencion de este permiso genero un retraso involuntario que impacto directamente en la ruta critica del proyecto (del 19.02.2026 al 10.04.2026, equivalente a 51 dias calendario). esta situacion afecto la ejecucion del presupuesto 02 (sistema...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 188 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 05/08/2026

... publicas), el contratista puede solicitar la ampliacion del plazo pactado en obras por causales no imputables a el, siempre que alteren la ruta critica del programa de ejecucion vigente. ítem a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, por tales circunstancias se procedera a tramitar la ampliacion de plazo. bajo esa premisa, y de acuerdo con el procedimiento del literal...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 186 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 05/08/2026

...amiento de san martin (cui no 2597796), tramite que fue gestionado por el contratista desde el 26 de febrero de 2026. se registra que el tiempo transcurrido para la obtencion de este permiso genero un retraso involuntario que impacto directamente en la ruta critica del proyecto (del 19.02.2026 al 10.04.2026, equivalente a 51 dias calendario). esta situacion afecto la ejecucion del presupuesto 02 (sistema...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 173 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 24/07/2026

...ente para la ejecucion de obras en fuentes naturales de agua. dicha situacion se informo oportunamente mediante los asientos n 044, 061,074, 075, 104, 138, 148 y 154 del cuaderno de incidencias. este retraso genera un impacto irreversible, ya que los trabajos debieron ejecutarse al 100%. ademas, provocara un atraso acumulado que probablemente situe el avance por debajo del 80%, afectando la gestion admi...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 169 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026

DESESTIMA MAYORES METRADOS N°05 Y RECOMIENDA ELEVAR A CONSULTA: EN RESPUESTA AL ASIENTO N°167 DEL RESIDENTE DE OBRA Y LA CARTA N°041-2026-CEAT/RC, DONDE EL RESIDENTE NOS INIDICA: "CONSISTE ESPECÍFICAMENTE EN DESPLAZAR CUATRO METROS EL EJE DEL PROYECTO ORIGINAL HACIA LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUALLAGA", Y QUE TAMBIEN NOS INDICA EN LA LAMINA DEL PLANO DE ARQUITECTURA PLANTA GV-02. ESTA SUPERVISION CONSIDERA QUE LO IN...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 163 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/07/2026

... de acuerdo con lo señalado en el artículo 201. 197.4. en caso con la aprobacion de los mayores metrados se supere el limite para prestaciones adicionales del 50% del componente obra, se procede a la resolucion del contrato.

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
