

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Ioarr "renovacion de pista, en el(la) las calles internas del club campestre las lagunas iii etapa distrito de la molina, provincia lima, departamento lima" - CUI N°2684101

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

13.2 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **13.2 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	40 desde 03/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: IOARR "RENOVACION DE PISTA, EN EL(LA) LAS CALLES INTERNAS DEL CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS III ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" - CUI N°2684101
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
Contratista	CONSORCIO RODRIGUEZ
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LA MOLINA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2684101
Inversión asociada	RENOVACION DE PISTA EN EL(LA) LAS CALLES INTERNAS DEL CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS III ETAPA DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2409201
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,481,582.06
Cuaderno de obra digital	40 asientos entre 03/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

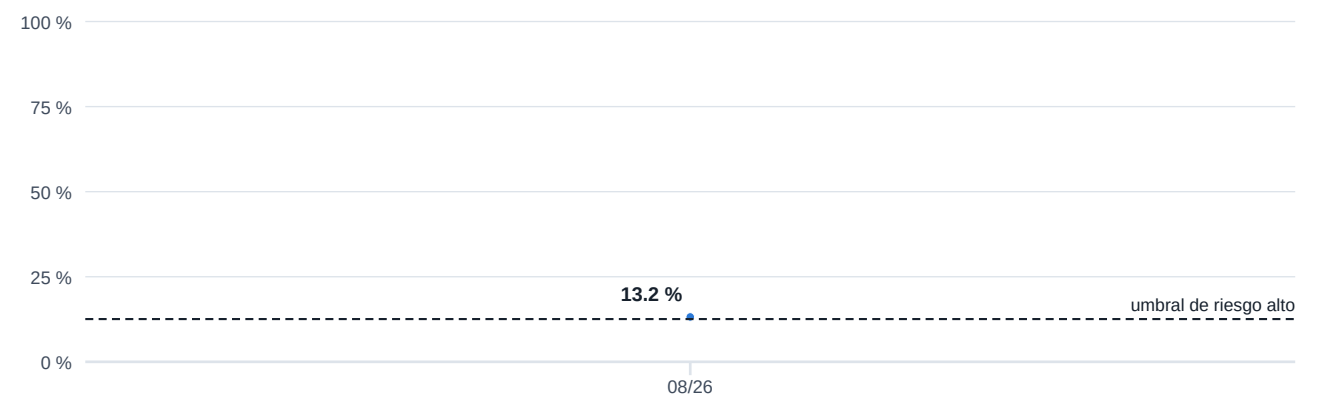

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.50 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.405
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.271
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.167
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.151
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.114
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
Hubo registros en el cuaderno 19 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.070
Entidad contratante: municipalidad distrital	Características de la obra		-0.054

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	13.2 %	13.2 %	-0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	13.2 %	13.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 25 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

... técnicas, de seguridad y contractuales lo permitan, con la finalidad de optimizar el rendimiento de los recursos, evitar afectaciones a la programación contractual y reducir el riesgo de incurrir en retrasos que pudieran generar la necesidad de solicitar ampliaciones de plazo, bajo responsabilidad de la contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

...se viene realizando conforme a las obligaciones y alcances establecidos en los términos de referencia y documentos contractuales correspondientes. de existir alguna observación específica respecto al incumplimiento de determinada obligación contractual, deberá ser precisada y sustentada técnicamente por el residente de obra. se exhorta al residente de obra a que las anotaciones consignadas en el cuaderno ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N.º 16 - DEL RESIDENTE DE OBRA: Sobre el numeral 1 (subcontratación): El requerimiento no es ambiguo ni ajeno a las bases del proceso: se sustenta expresamente en el numeral 3.3.4 del Requerimiento — Sistema de Entrega Solo Construcción, documento integrante de las Bases Integradas conforme a la Cláusula Séptima del Contrato N.º 34-2026/MDLM, así como en el artículo 108 del Reglamento de la Ley N.º 32...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

...recisa que la obligación de efectuar los registros diarios y oportunos en el cuaderno de obra digital corresponde específicamente al residente de obra por mandato expreso del numeral 10 del cuadro de penalidades del contrato n 34-2026/mdlm ("cuaderno de obra digital"), el cual establece una penalidad de 0.5 UIT por cada día no rellenado, exigible a el contratista. las obligaciones de registro de la supervi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 12/08/2026

REFERENTE AL ASIENTO 15 DE LA SUPERVISIÓN: En lo que respecta a la supervisión sobre el numeral 1 del asiento 14 subcontratación, no entiendo el sentido de su requerimiento a mi modesto entender debería informarse mejor al respecto y al tipo de contrato que se tiene los cuales están bien definidas en las bases integradas y el RLGC. En lo referido en el numeral 3 del asiento 14 de la supervisión que debería hacer un ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 12/08/2026

...as en las bases integradas y el rlhcp. en lo referido en el numeral 3 del asiento 14 de la supervisión que debería hacer un mea culpa y realizar sus anotaciones diarias también en ese sentido estaría incumpliendo con lo que recomienda.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 14 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

...uaderno de obra digital: el residente de obra deberá efectuar los registros diarios y oportunos de los acontecimientos, avances, consultas, valorizaciones, informes y demás incidencias relevantes. el incumplimiento podrá generar la penalidad prevista en el numeral 10 del cuadro de penalidades del contrato, conforme al procedimiento correspondiente. 4. seguridad y señalización: mantener en todo momento la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

ENTREGA DE CARTAS Y AVANCE DE OBRA: Se deja constancia que la Contratista presentó la Carta N.º 08-2026/CONSORCIO ANDINO, precisándose que, por error involuntario de numeración, donde corresponde indicar Carta N.º 07-2026/CONSORCIO ANDINO, mediante la cual presenta el Programa de Ejecución de Obra. De la revisión efectuada por la Supervisión, se han identificado deficiencias, omisiones e inconsistencias, las cuales se...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 13 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

... del plan de desvío, según corresponda. la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos y el cumplimiento del programa y plazo contractual, evitando retrasos que puedan afectar la ejecución de la obra. se deja constancia para los fines de control, seguimiento y efectos contractuales correspondientes

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.° 30225, D.S. N.° 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.° 32069, D.S. N.° 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
