


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de las obras plan de contingencia y obra principal del proyecto mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del centro de salud desaguadero, distrito de desaguadero - chucuito puno con CUI N° 2343118 - obra principal

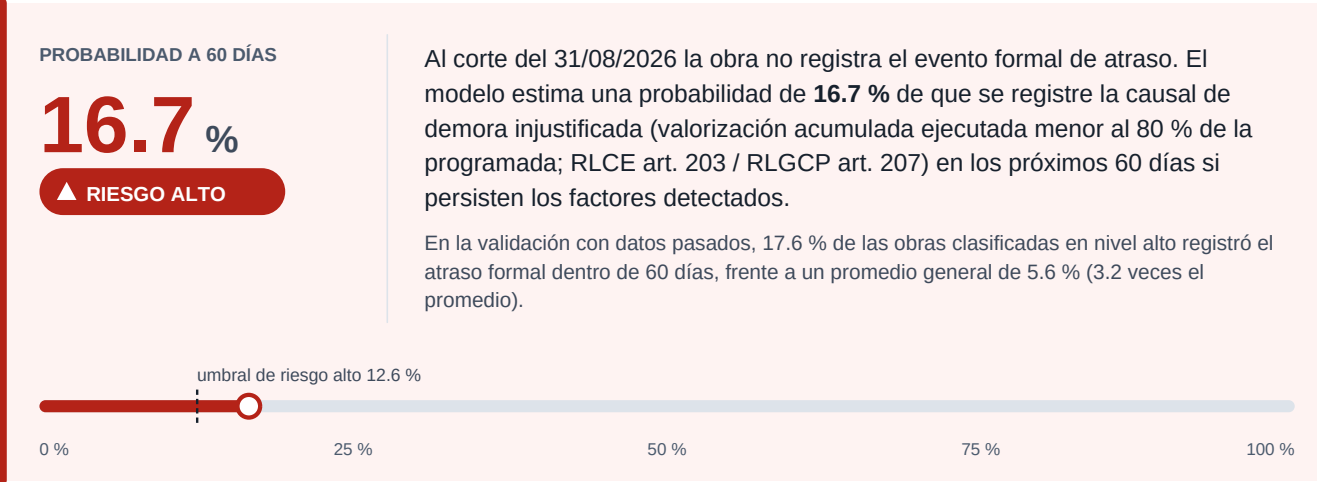


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	1,210 desde 29/09/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	Contratación de la ejecución de las obras PLAN DE CONTINGENCIA Y OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO PUNO con CUI N° 2343118 - OBRA PRINCIPAL
Entidad contratante	UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
Contratista	CONSORCIO DE LA SALUD DESAGUADERO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	DESAGUADERO / CHUCUITO / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2343118
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2258888
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 18,989,050.00
Cuaderno de obra digital	1210 asientos entre 29/09/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

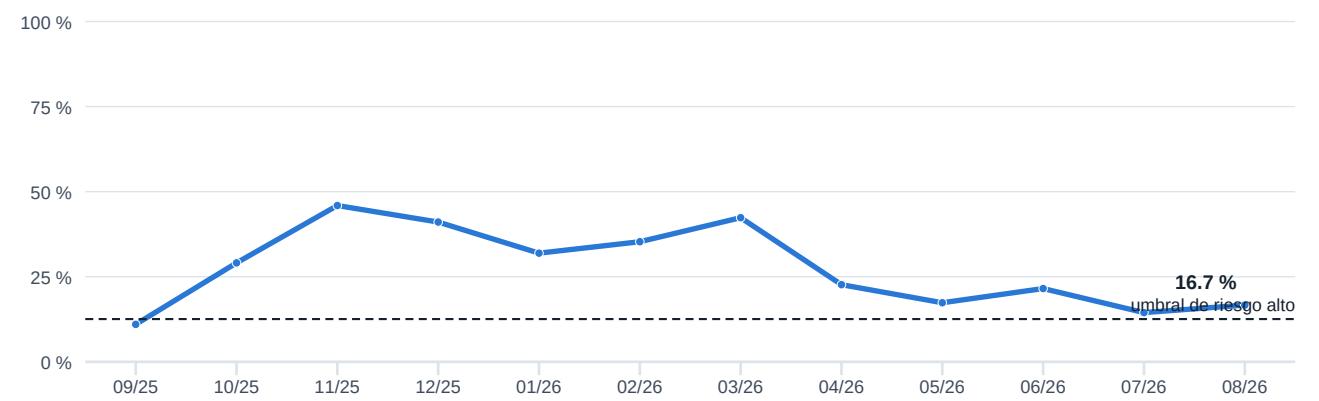

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (12 cortes, del 30/09/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.74 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.674
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.233
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.198
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.103
Gasto acumulado de la inversión (devengado): S/ 52,606,905	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.089
Departamento: Puno	Características de la obra		-0.084
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.082

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	16.7 %	16.5 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	16.7 %	17.0 %	+0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 1207 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

...siento n 1186 del cuaderno de obra, referente al levantamiento de observaciones de seguridad comunicado por la residencia, la supervision de obra precisa lo siguiente tras la verificacion en campo:a) incumplimiento recurrente: persiste la inobservancia de medidas minimas de seguridad por parte del contratista, elevando el riesgo de accidentes. debe inspeccionar y corregir la totalidad de las areas de tra...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1198 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...e, transitabilidad y condiciones originales de la via.se deja expresa constancia de que cualquier sancion administrativa, impacto ambiental, dano a terceros, accidente o conflicto social derivado del incumplimiento de estas medidas sera de exclusiva y estricta responsabilidad del contratista. se adjunta el informe no0252026Impoema-opcsd/cssc. del especialista para su conocimiento y estricto cumplimiento.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1196 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 26/08/2026

... sistema de aire dental (normado por el cap. 15 de la nfpa 99), se precisa que las observaciones formuladas por esta supervision no devienen de una incorrecta aplicacion de la norma nfpa 99, sino del incumplimiento directo de requerimientos tecnicos, explicitos, cuantificados y de diseno establecidos en el propio expediente tecnico contractual (memoria descriptiva, especificaciones tecnicas y plano im-09...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1192 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 24/08/2026

... de las especificaciones tecnicas, aceptandose las certificaciones eurovent (para 12,000 btu/h) y ahri (para 18,000 y 24,000 btu/h) de la marca carrier propuesta.se deja expresa constancia de que las demoras y dilaciones generadas en el ciclo de aprobacion de estas partidas son de exclusiva responsabilidad de la contratista, debido a que viene presentando y formulando consultas de manera incompleta, fra...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1189 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/08/2026

...espondencia con los diametros y condiciones indicadas en los planos del proyecto.en estricto cumplimiento de lo establecido en el expediente tecnico de obra y las exigencias de control de calidad, se apercibe al contratista que, una vez que los materiales o equipos arriben a la obra, debera notificar formalmente a esta supervision de manera inmediata para proceder con la respectiva verificacion en campo ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1176 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 19/08/2026

ABSOLUCION CONSULTA 104-IE: CONSULTA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN TÉCNICA SOBRE LA FALTA DE CANALETA DE CONCRETO: En atención a la Consulta N° 104-IE formulada por el Contratista respecto a la definición y pase de cables hacia los Tableros Generales en el Bloque B, sustentada en el plano de replanteo IE-08-R, esta Supervisión emite pronunciamiento declarando la propuesta como VIABLE TÉCNICAMENTE COMO REPLANTEO DE OBRA.Por...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1181 · Consultas · SOEC_RESI · 19/08/2026

... las fichas tecnicas propuestas. si la supervision mantiene la exigencia conjunta de las certificaciones ahri y ul, se solicita elevar la consulta a pronis para definir el criterio aplicable y evitar retrasos en la adquisicion e instalacion.se pone a consideracion de la supervision lo indicado para su evaluacion y pronunciamiento correspondiente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1166 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 15/08/2026

...e importacion, por lo tanto, se solicita a la supervision de obra y/o entidad la aprobacion de las fichas tecnicas para iniciar su importacion y posteriormente para su uso y/o instalacion en obra sin retrasos. para su revision y aprobacion, se adjunta fichas tecnicas. se pone a consideracion de la supervision lo indicado para su evaluacion y pronunciamiento correspondiente.

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 1160 · Consultas · SOEC_RESI · 14/08/2026**

...ita que la supervision eleve los actuados a la entidad para su pronunciamiento definitivo, evitando prolongar un proceso de aprobacion mediante requerimientos incorporados en etapas posteriores, cuya demora viene afectando directamente los plazos de procura e importacion del sistema..se pone a consideracion de la supervision lo indicado para su evaluacion y pronunciamiento correspondiente.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 1081 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/07/2026**

RESPUESTA AL ASIENTO N°982 Y 978 - PROPUESTA DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y DETALLE DE REFUERZO DE ACERO EN LOSA DE TECHO DE ASCENSOR PÚBLICO: 1. Mediante asiento N° 868, el Residente de Obra formula una consulta técnica respecto a la "Propuesta de diseño estructural y detalle de refuerzo de acero en losa de techo de ascensor público".2. Mediante asiento N° 891, esta Supervisión absuelve oportunamente dicha solicitud bajo l...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
