


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de la ejecucion de la obra : Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la I.E. 20407 los naturales en el distrito de huaral - provincia de huaral - departamento de lima CUI N° 2476649

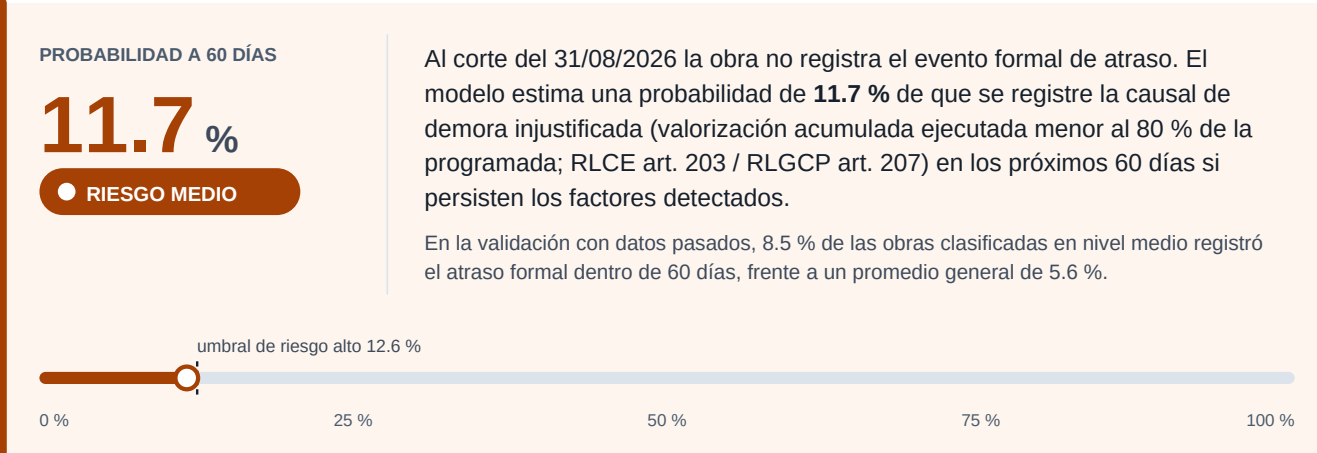


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 49,456,068.99	540 días	500 desde 22/01/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 20407 LOS NATURALES EN EL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N° 2476649
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
Contratista	CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUARAL / HUARAL / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2476649
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E 20407 LOS NATURALES EN EL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2368402
Monto del contrato	S/ 49,456,068.99
Monto aprobado de la inversión	S/ 21,999,197.99
Cuaderno de obra digital	500 asientos entre 22/01/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

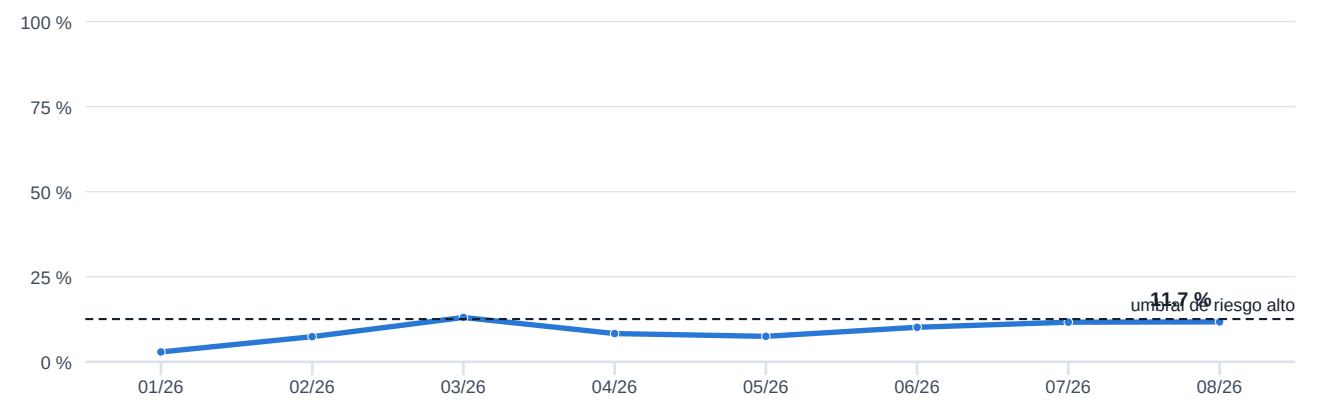

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 31/01/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.514
Faltan 320 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		-0.264
El 17 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.247
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.198
4 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.148
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.138
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.095
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.092

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.7 %	11.6 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.7 %	11.7 %	-0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.7 %	11.8 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 493 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 27/08/2026

...ividades en este frente independiente del cerco perimetrico tramo b-c (pasaje garcia alonso) permanecen paralizadas de forma plenamente justificada, por causas no atribuibles al ejecutor. cada día de demora provocado por el silencio e inaccion de la supervision viene siendo contabilizado a efectos de sustentar las solicitudes de ampliacion de plazo contractual y el reconocimiento de los mayores costos f...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 492 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 27/08/2026

...ion. sostener un rechazo basandose en apreciaciones puramente subjetivas y cualitativas pone en grave riesgo la seguridad de la infraestructura educativa.- se deja constancia de que la supervision ha incumplido el mandato expreso dictado por el gobierno regional de lima en su carta n 479-2026-grl/gri y su informe tecnico vinculante n 086-2026-grl-gri/se-ddac, donde la subgerencia de estudios le ordeno im...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 488 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 25/08/2026

...lto riesgo de segregacion estructural y perjuicio economico asumido a costo cero. - en tal sentido, se realiza el apercibimiento conforme al articulo 190.4 del reglamento de la ley n 32069. cualquier demora, atraso o paralizacion fisica en los frentes del cerco perimetrico mixto derivada de la falta de especificaciones tecnicas e indefinicion del expediente sera de entera responsabilidad exclusiva del g...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 488 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 25/08/2026

mitigacion de riesgos contractuales r1/r2: apercibimiento contractual por afectacion a la ruta critica (cpm) - riesgos r1/r2 activados . - en concordancia con el asiento precedente, esta residencia deja constancia de que, hasta que el proyectista o l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 486 · Consultas · SOEC_RESI · 25/08/2026

CONSULTA N° 15 – FORMULACIÓN DE NUEVA CONSULTA TÉCNICA - INDEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN MUROS MIXTOS DEL CERCO PERIMÉTRICO: - En mi calidad de Residente de la empresa CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C., en amparo al Artículo 190 del Reglamento de la Ley N° 32069 y en estricto acatamiento a lo dispuesto por la entidad en la Carta N° 488-2026-GRL/GRI y a lo requerido por la supe...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 470 · Adicionales · SOEC_RESI · 19/08/2026

constancia de demora en emision de resolucion de aprobacion de prestacion adicional n 01 y afectacion de ruta critica . - se deja constancia que con fecha 17/07/2026 (asiento n 357), esta residencia presento formalmente ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 467 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/08/2026

...fraestructura (atencion: ing. jeyson oliver ramirez ramos).- mediante dicho documento, el contratista ha formalizado su rechazo absoluto y descargo tecnico-legal frente a la improcedente propuesta de penalidad de 1 uit formulada por la jefa de supervision mediante el informe n 029-2026-consorcio suyay-jso. ante la gerencia de infraestructura se han expuesto detalladamente los vicios facticos de la supervis...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 463 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026

...liza del seguro car, sctr y/o por no cubrir al 100% de los trabajadores que estan en obra". al respecto, rechazamos tajantemente la postura de la supervision, toda vez que se confunde erroneamente la demora en la entrega fisica del documento impreso con una supuesta falta de vigencia. nuestra empresa si mantuvo vigente la poliza de seguro sctr (salud y pension) de la totalidad de su personal obrero y te...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 464 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026 <i>formulacion de descargos tecnico-legales ante propuesta de penalidad de supervisionviene de asiento anterior.....- se expone la grave incongruencia en la que incurre el informe n 029-2026-consorcio suyay-jso de la jefa de supervision. en el punt...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 421 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026 <i>PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA DISCONFORMIDAD TÉCNICA A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N° 09: 1. RESPECTO A LOS ASIENTOS FORMULADOS POR EL CONTRATISTA EN RELACIÓN A LA ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 09, LA SUPERVISIÓN TOMA CONOCIMIENTO DE LA DISCONFORMIDAD Y DE LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS EXPUESTOS.2. AL RESPECTO, SE PRECISA QUE LA CONSULTA N° 09 YA HA SIDO ABSUELTA POR LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA N° 488-2026-GRL/GRI, DE FECHA 04 ...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 329 · Órdenes · SOEC_SPV · 12/07/2026 <i>SE REITERA EL INICIO DE EJECUCION DE PARTIDAS DE EXCAVACIÓN: 1. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA CONSULTA DE OBRA N.º 06 FUE ABSUELTA POR LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA N.º 336-2026-GRL/GRI, PRECISÁNDOSE QUE LAS CONDICIONES DE INESTABILIDAD DEL TERRENO CORRESPONDEN A SITUACIONES EVIDENCIADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, COMO CONSECUENCIA DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL TERRENO IDENTIFICADAS LUEGO DE LA DEMOLICIÓN DE LAS ...</i> Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 328 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/07/2026 <i>ACTIVIDADES DE OBRA: - En atención a lo indicado por la Supervisión en los Asientos N° 325 y 326, sobre el inicio de la ejecución de las partidas de Excavaciones, se le solicita a la Supervisión indicar que tipo de excavación se debería realizar, (localizada por zanjas como se indica en el expediente técnico o excavación masiva como se propuso en la consulta N° 06), tomando en cuenta que esta observación fue parte de...</i> Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
