


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de la obra: Creacion del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas en mediante redes primarias y redes secundarias en el sector 7 del distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa de la provincia de tacna del departamento de tacna

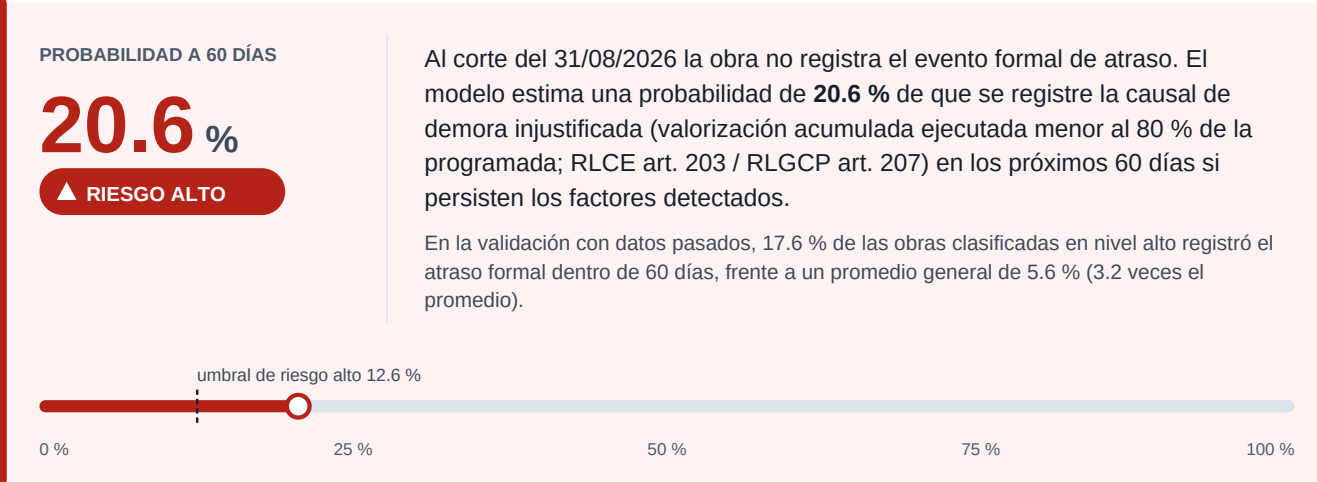


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	52 desde 25/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN MEDIANTE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR SAN PEDRO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA / TACNA / TACNA
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2398485
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	52 asientos entre 25/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

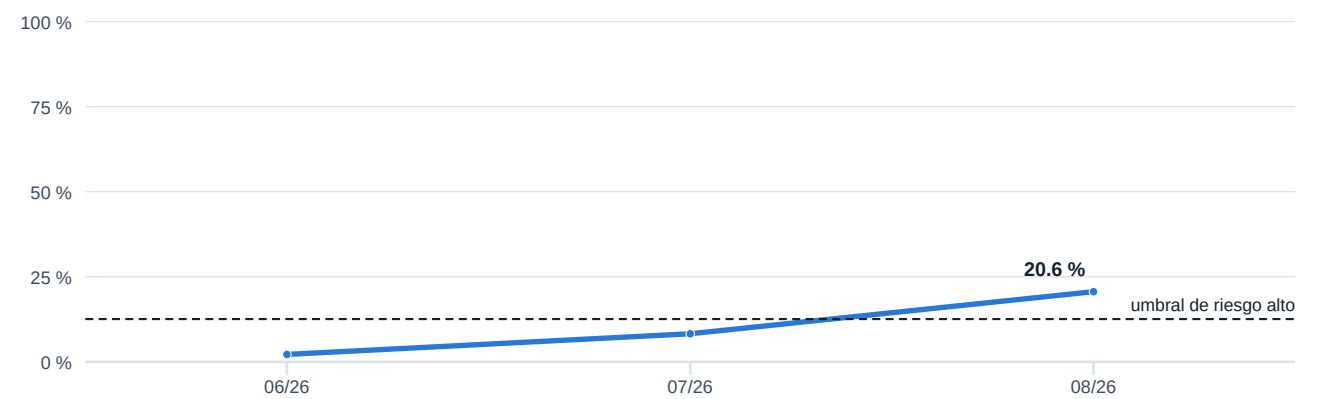

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.545
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.283
Departamento: Tacna	Características de la obra		+0.232
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.173
3 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.141
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.114
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.108
Hubo registros en el cuaderno 15 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.062

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 52 · Órdenes · SOEC_INSP · 31/08/2026

CLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, AUTORIZACIÓN DE MONTAJE (S.E. 03 Y 06) E INICIO DE NUEVOS FRENTE (S.E. 01 Y 02).: SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE PARTIDAS: se rechaza la interpretación del residente. La autorización para "excavación de hoyos" no implica tácitamente la autorización para el izaje y cimentación. Son procedimientos constructivos distintos. Todo montaje y vaciado requiere obligatoriamente la revisión y liberació...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 52 · Órdenes · SOEC_INSP · 31/08/2026

... toda actividad debe ejecutarse en estricto cumplimiento del plan de monitoreo arqueológico (pmar), las medidas de mitigación ambiental (especificadas en el día) y las normas de seguridad (sst), bajo apercibimiento de aplicarse las penalidades del contrato no 027-2026-ga-mdcgal. se exhorta al residente a respetar el conducto regular de liberación de partidas

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 49 · Órdenes · SOEC_INSP · 30/08/2026

...zar la seguridad del personal y de terceros. esta inspección verificará continuamente los dispositivos de señalización en obra y el uso correcto de los equipos de protección personal (epp). en caso de incumplimiento de cualquiera de las directrices técnicas, ambientales, arqueológicas o de seguridad, corresponderá la aplicación de las sanciones estipuladas en el marco del contrato no 027-2026-ga-mdcgal. a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 49 · Órdenes · SOEC_INSP · 30/08/2026

AUTORIZACIÓN DE INICIO DE EXCAVACIONES DE HOYOS PARA POSTES DE C.A.C. DE 8 M: Esta inspección tras las verificaciones de campo y la revisión de los documentos adjuntos, se establece lo siguiente: AUTORIZACIÓN TÉCNICA: se autoriza el inicio de la partida "3.02.01: EXCAVACIÓN DE HOYO PARA POSTE DE C.A.C. DE 08 M." para las redes secundarias vinculadas a las subestaciones de distribución N° 03 Y N° 06 indicadas, conform...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 46 · Órdenes · SOEC_INSP · 24/08/2026

PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA, ORGANIGRAMA Y CONTRATOS LABORALES DEL PERSONAL: En atención al Asiento de Cuaderno de Obra N° 42, referente a la asignación de nuevo personal clave (Residente de Obra), y en estricto cumplimiento del Artículo 187 (Funciones de la supervisión de obras y consultoría de obras), el cual establece que esta Inspección es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución té...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 45 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

...l sector sector 7, vinani.a la fecha, la solicitud no ha sido atendida, ocasionando que aun no se haya definido en el replanteo de obra, la ubicación exacta de las estructuras a instalar, ocasionando atraso en el proceso constructivo. con el plano del proyecto, existen incongruencias en dimensiones de manzanas y lotes, en anchos de veredas según el ancho de vía., además, de la existencia de invasiones ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 43 · Administración de riesgos · SOEC_INSP · 22/08/2026

implementación inmediata de acciones de mitigación de riesgos retraso en el suministro de materiales . de conformidad con el plan de gestión de riesgos establecido en el expediente técnico aprobado y lo estipulado en la cláusula decimo quinta del contrato n 27-2026-ga...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 31 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 07/08/2026

...ctor a partir del día 22 de julio del 2026, fecha en que se realizó la entrega del terreno. a partir, del 13 de julio del 2026, no se dispuso de manera permanente y directa del inspector, ocasionando atrasos en la absolución de consultas formuladas, en base a los procedimientos que establece el artículo 190 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, ley n 32069.con fecha 24 de junio del 202...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 9 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 08/07/2026

... que la existencia de estas líneas intercepta con el trazado de las líneas proyectadas y chocan con el tendido aéreo ya existente en la zona, esta condición presenta un riesgo de seguridad eléctrica, incumpliendo las distancias mínimas normativas exigidas, además de impedir el avance de la ruta crítica correspondiente al proyecto. tras la revisión de la documentación presentada, se observa que, si bien s...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 8 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 08/07/2026

REVISION DE FICHAS TÉCNICAS DE LUMINARIAS Y DUCTOS: DE LA REVISIÓN DE LAS CARTAS: N° 009-2026-CESP/BFYJ: REMISIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS, CARTA N° 011-2026-CESP/BFYJ: REMISIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS DUCTOS PROPUESTOS, SE ADVIERTE QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS EXIGIDOS, HABIENDO IDENTIFICADO, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTO...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 9 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 08/07/2026

EVALUACION DE CONSULTA TÉCNICA SOBRE INTERFERENCIA Y COLISIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PROYECTADAS CON REDES PRIMARIAS EXISTENTES: DE LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA CARTA N° 012-2026-CESP/BFYS, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2026, CONSULTA TÉCNICA SOBRE LA POSIBLE INTERFERENCIA Y COLISIÓN ENTRE LAS REDES ELÉCTRICAS PROYECTADAS Y LAS REDES PRIMARIAS EXISTENTES DENTRO DEL ÁREA DEL PROYECTO, SE ADVIERTE QUE EL CONSORCIO EJECUTOR SAN ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

05

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
