


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecucion de obra: Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el barrio santa úrsula de la junta vecinal N°02, distrito de huamachuco de la provincia de sanchez carrion del departamento de la libertad¿ con CUI N°2659361

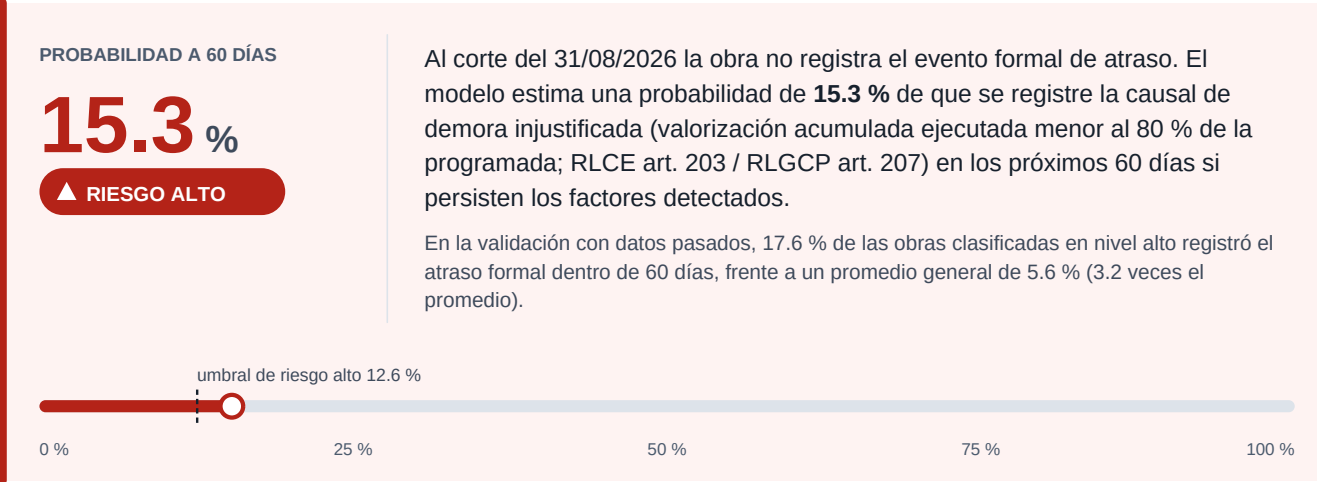


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	191 desde 19/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL BARRIO SANTA ÚRSULA DE LA JUNTA VECINAL N°02, DISTRITO DE HUAMACHUCO DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿ CON CUI N°2659361
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO
Contratista	CONSORCIO PALLAR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUAMACHUCO / SANCHEZ CARRION / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2659361
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL BARRIO SANTA ÚRSULA DE LA JUNTA VECINAL N°02, DISTRITO DE HUAMACHUCO DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2387211
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,472,046.13
Cuaderno de obra digital	191 asientos entre 19/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

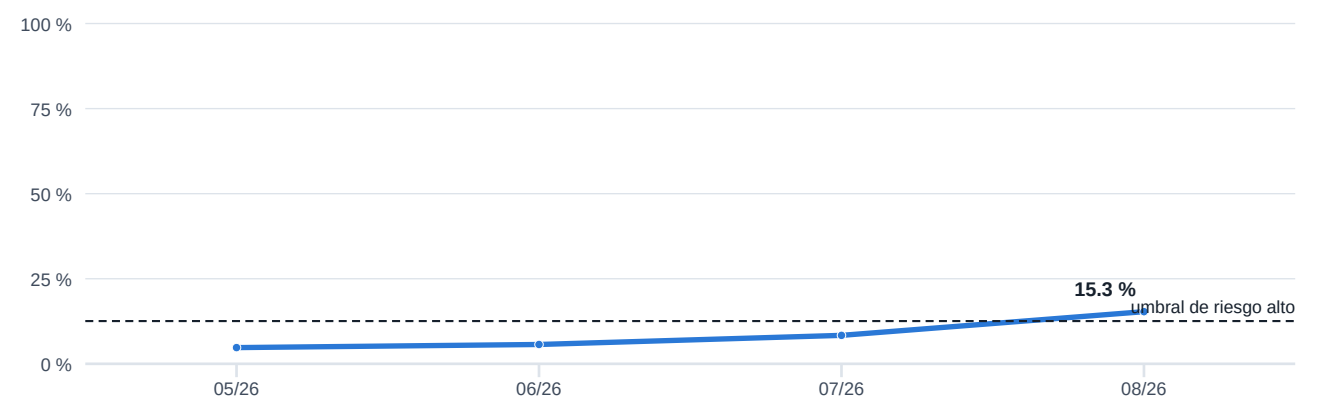

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.603
El 33 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.266
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.187
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.35 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		-0.155
El 53 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.128
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.114
Hubo registros en el cuaderno 22 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.072
Extensión media de los asientos recientes: 1,287 caracteres	Contenido de los asientos		-0.063

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	15.3 %	15.1 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	15.3 %	15.3 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	15.3 %	15.7 %	+0.4 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 185 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...te con el cronograma de ejecucion vigente, por lo que corresponde al contratista adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal rendimiento de las actividades, para no dar sanciones con las penalidades de acuerdo a su contrato

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 183 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 26/08/2026

pronunciamiento a la intencion de solicitud de ampliacion de plazo . en atencion al asiento n 179 de fecha 25/08/2026, mediante el cual el residente de obra deja constancia de una demora de seis (06) dias calendario por parte de la entidad en la absolucion de consultas, manifestando su intencion de solicitar una ampliacion de plazo, esta supervision cumple con pronunciarse de manera ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 184 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...te con el cronograma de ejecucion vigente, por lo que corresponde al contratista adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal rendimiento de las actividades, para no dar sanciones con las penalidades de acuerdo a su contrato.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 180 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...te con el cronograma de ejecucion vigente, por lo que corresponde al contratista adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal rendimiento de las actividades, para no dar sanciones con las penalidades de acuerdo a su contrato.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 178 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...te con el cronograma de ejecucion vigente, por lo que corresponde al contratista adoptar las medidas necesarias para garantizar el normal rendimiento de las actividades, para no dar sanciones con las penalidades de acuerdo a su contrato.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 179 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026

se pide ampliacion de plazo de 6 dias por demoras injustificadas de respuestas de consultas . - se inicia con los trabajos, dando las charlas a cargo de la ing. ana maria rios contreras del dia 25/08/2026 prevencion de accidentes en montaje de jueg...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 168 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 16/08/2026

...a en el articulo n190. consultas sobre incidencias. riegos se advierte el r1 riesgo de errores o deficiencias en el diseno. la supervision no tramita las consultas en su debido momento esto genera un retraso para el pronunciamiento de la entidad. se deja constancia y se advierte que ya esta generando retraso las partidas que esta en consultas asi mismo ya esta afectando la ruta critica.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 161 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 12/08/2026

...residente cumplimiento de plazos en tramite de consultas . en respuesta a lo anotado por el residente de obra en el asiento n 159, esta supervision rechaza de forma categorica que se haya generado un retraso de nuestra parte. se deja constancia de que si se cumplio estrictamente con el plazo legal establecido en el articulo 190, inciso 190.3, literal a) de la ley n 32069, bajo los siguientes sustentos:1...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 143 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 29/07/2026

TRABAJOS EJECUTADOS: El día de hoy, miércoles 29 de julio del 2026, se llega verificar las actividades desarrolladas:- Se verificó la realización de charla de seguridad a cargo de los profesionales siguientes: Residente de Obra, Especialista de Estructuras, Especialista de Seguridad y Especialista Ambiental.- Se verificó, la movilización de los materiales para los trabajos de la fabricación de la cobertura autosopor...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 134 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

TRABAJOS EJECUTADOS: El día hoy, miércoles 22 de Julio del 20026, se llega a verificar las actividades desarrolladas:- Se verificó la realización de charla de seguridad a cargo de los profesionales siguientes: Residente de Obra, Especialista de Estructuras, Especialista de Seguridad y Especialista Ambiental.- Se verificó el encofrado con madera para los muros de contención de concreto ciclópeo (Parte PosteriorDerech...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
