


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Renovacion de colector secundario y conexion domiciliaria de alcantarillado, en el(la) del servicio de alcantarillado sanitario para la URB. La arboleda - distrito de trujillo, provincia trujillo, departamento la libertad

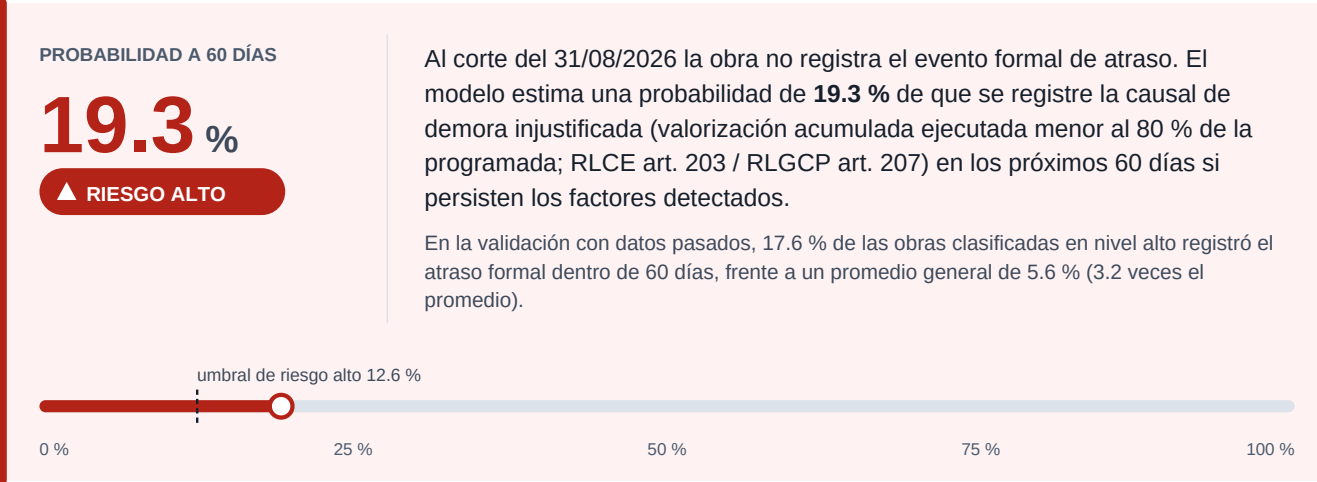


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	44 desde 12/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL(LA) DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA URB. LA ARBOLEDA - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Entidad contratante	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD
Contratista	CONSORCIO OBRAS TEINGECON
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2666745
Inversión asociada	RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA URB. LA ARBOLEDA - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2412460
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,513,806.20
Cuaderno de obra digital	44 asientos entre 12/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

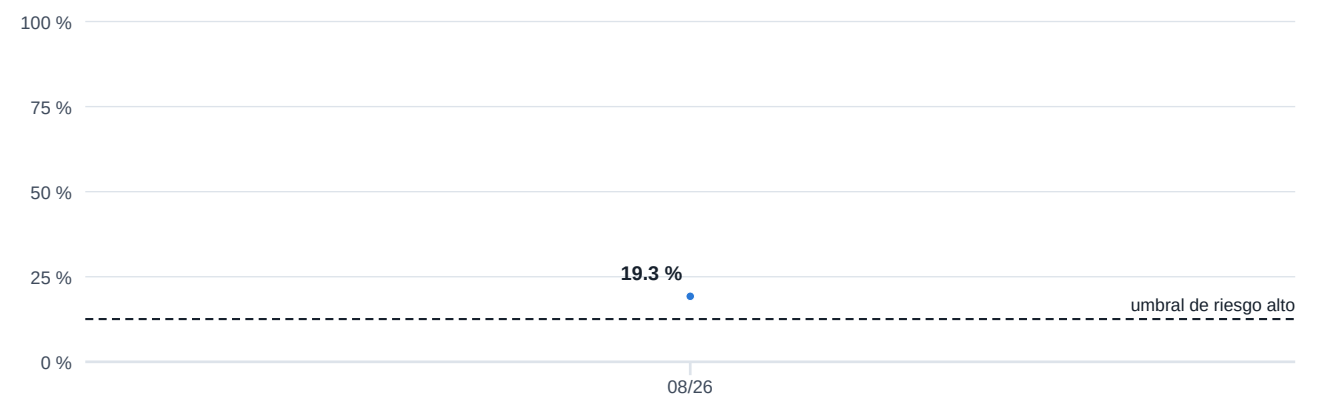

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.690
El 61 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.250
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.224
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.115
Hubo registros en el cuaderno 16 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.060
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona deficiencias del expediente técnico	Contenido de los asientos		+0.052
44 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.051

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 27 · Entregables · SOEC_SPV · 21/08/2026

SE REITERA AL CONTRATISTA QUE NO HA CUMPLIDO EN PRESENTAR PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA: SE REITERA AL CONTRATISTA QUE AL CIERRE DE ACTIVIDADES DEL DIA DE HOY 21 DE AGOSTO DE 2026 NO AH CUMPLIDO CON PRESENTAR FORMALMENTE LOS PLANOS DE REPLANTEO DE OBRA. POR LO QUE SE LE OTORGA UN PLAZO DE 2 DÍAS CALENDARIO PARA SUBSANAR YA QUE HA REALIZADO TRABAJOS DE EXCAVACION DE BUZONES Y ESTA COLOCANDO ENCOFRADOS METALICOS PARA VAC...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Entregables · SOEC_SPV · 21/08/2026

incumplimiento en presenacion de poliza todo riesgo de construccion (car) . se comunica que el contratista no ha cumplido con presentar la poliza todo riesgo de construccion (car), situacion que pone en situ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 19 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/08/2026

CONTRATISTA NO CUMPLE CON IMPLMENTAR EL CAMAPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA: CONTRATISTA NO CUMPLE CON IMPLMENTAR EL CAMAPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL EXPEDIENTE TECNICO, EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR UN CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA EN EL QUE SE HA PREVISTO LAS SIGUIENTES INSTALACIONES:• CONSTRUCCION PROVISIONAL P/OFICINA Y CONTROL DE OBRA 25.92 M...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 15 · Entregables · SOEC_SPV · 18/08/2026

PRESENTACION DE PLANES DE TRABAJO: SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LA FECHA, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS • PLAN DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN SOCIAL - CON CARTA N° 034-2026-CS25• PLAN DE TRABAJO DE CONTROL DE CALIDAD - CON CARTA N° 035-2026-CS25• PLAN DE MITIGACION Y MONITOREO DE IMPACTOS AMBIENTALES - CON CARTA N° 036-2026-CS25• PLAN DE SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y SALUD EN EL TRABAJO - CON CAR...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Entregables · SOEC_SPV · 17/08/2026

incumplimiento en la presentacion de plan de trabajo de intervencion social . se deja constancia que de acuerdo a lo establecido en la seccion v. actividades, tareas y entregables de los terminos de referenc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

05

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
