


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de la obra: ¿mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida don bosco, de los distritos de veintiseis de octubre y distrito de piura de la provincia de piura del departamento de piura¿ con CUI N°2604573

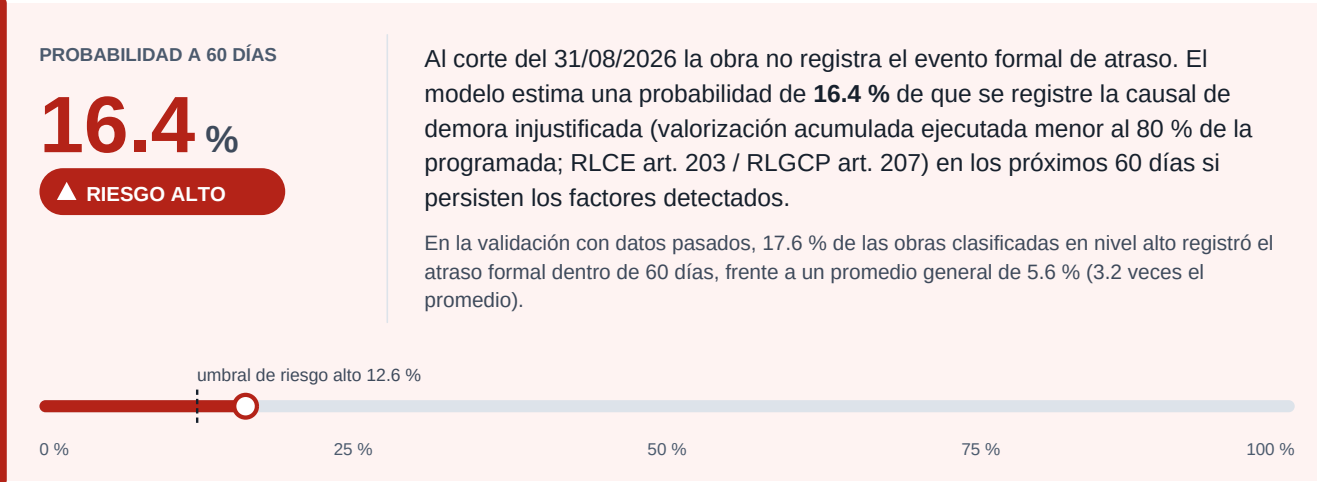


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 57,919,271.04	450 días	950 desde 29/05/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA DON BOSCO, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI N°2604573
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL
Contratista	CONSTRUCTORA BIDOLINO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PIURA / PIURA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2604573
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA DON BOSCO, DE LOS DISTRITOS DE VEINTISEIS DE OCTUBRE Y DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2326584
Monto del contrato	S/ 57,919,271.04
Monto aprobado de la inversión	S/ 70,160,247.52
Cuaderno de obra digital	950 asientos entre 29/05/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

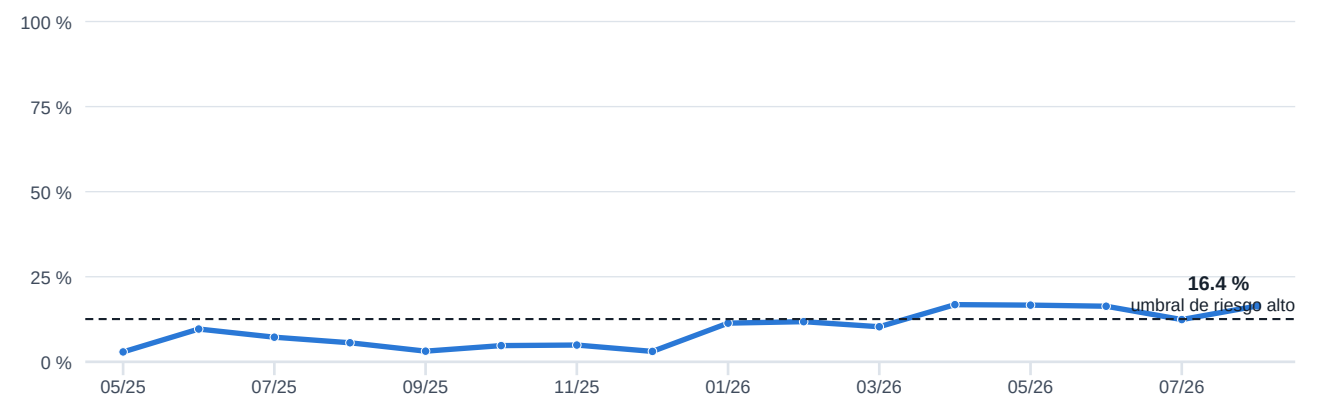

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (16 cortes, del 31/05/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.739
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.266
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.182
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.176
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 5,635,517	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.109
El plazo original venció hace 9 días	Datos del contrato		-0.105
3 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.093

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	16.4 %	14.4 %	-2.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	16.4 %	16.4 %	-0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	16.4 %	16.4 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 949 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

liberacion de vias . en atencion a la anotacion n948 donde el ing. supervisor indica que si bien la entidad aprobo el retraso justificado n 01 por 40 dias calendarios y solicita al residente de obra la liberacion de cualquier obstruccion en la via que pertenezca al contratista (sea material remanente a eliminar o de cualqu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 948 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

LIBERACION DE AV. DON BOSCO Y CALLES QUE INTERSECAN: Se le informa al residente de obra que si bien la Entidad aprobó el retraso justificado N° 01 por 40 días calendarios, esta supervisión solicita al residente de obra la liberación de cualquier obstrucción en la vía que pertenezca al contratista (sea material remanente a eliminar o de cualquier tipo), con la finalidad de que el contratista proceda a la liberación de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 948 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

liberacion de av. don bosco y calles que intersecan . se le informa al residente de obra que si bien la entidad aprobo el retraso justificado n 01 por 40 dias calendarios, esta supervision solicita al residente de obra la liberacion de cualquier obstruccion en la via que pertenezca al contratista (sea material remanente a elim...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 945 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

aprobacion de retraso justificado n01 . con resolucion gerencial regional n150-2026/gobierno regional piura-gri de fecha 21/08/2026 la entidad aprueba el retraso justificado n01 en el marco del contrato n048-2025-grp, de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 943 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

notificacion de retraso justificado . por la presente se le informa al representante comun y al residente de obra que se le esta notificando la resolucion gerencial regional n150-2026/gobierno regional piura-gri con fecha ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 938 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 19/08/2026

...contratista durante la ejecucion de los trabajos en obra.en tal sentido, se procedera conforme a las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato suscrito por el contratista, aplicandose la penalidad que corresponda por la ausencia advertida.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 938 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 19/08/2026

ausencia de especialista de seguridad . se deja constancia que, con fecha 17 de agosto de 2026, esta supervision evidencio la ausencia del especialista de seguridad del contratista durante la ejecucion de los trabajos en obra.en tal sentido, se procedera conforme a las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato suscrito por el contratist...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 924 · Aplicación de penalidades · SOEC_RESI · 12/08/2026

...6 han afectado la disponibilidad de frentes de trabajo y la ejecucion de partidas contractuales, por causas ajenas al ambito de responsabilidad del contratista. amparado en el articulo articulo 162.- penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion162.5. el retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. adicionalmente, se considera justificado el retraso y en ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 921 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 07/08/2026**

...tablece lo siguiente: "el retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. en ese ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 878 · Consultas · SOEC_RESI · 10/07/2026**

CONSULTA N°13 -DEDUCCION DE PARTIDA 13.01.03 INTERFERENCIAS DE TELEFONICA SEGÚN PRESUPUESTO ALCANZADO: Con fecha 20/04/2026, mediante la Carta N° 0883-2026/GRP-440310, el Director de Obras del Gobierno Regional de Piura trasladó el pronunciamiento de la Supervisión al Contratista, notificándole formalmente complementar de manera técnica el sustento para proceder con la Consulta de Deductivo de Trabajos de Telefonía, ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
