


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra "mejoramiento y ampliacion del servicio de practica deportiva y/o recreativa en MZ. B lt 1 aa.hh nuevo jerusalen sector i distrito de la esperanza,provincia de trujillo, departamento de la libertad"

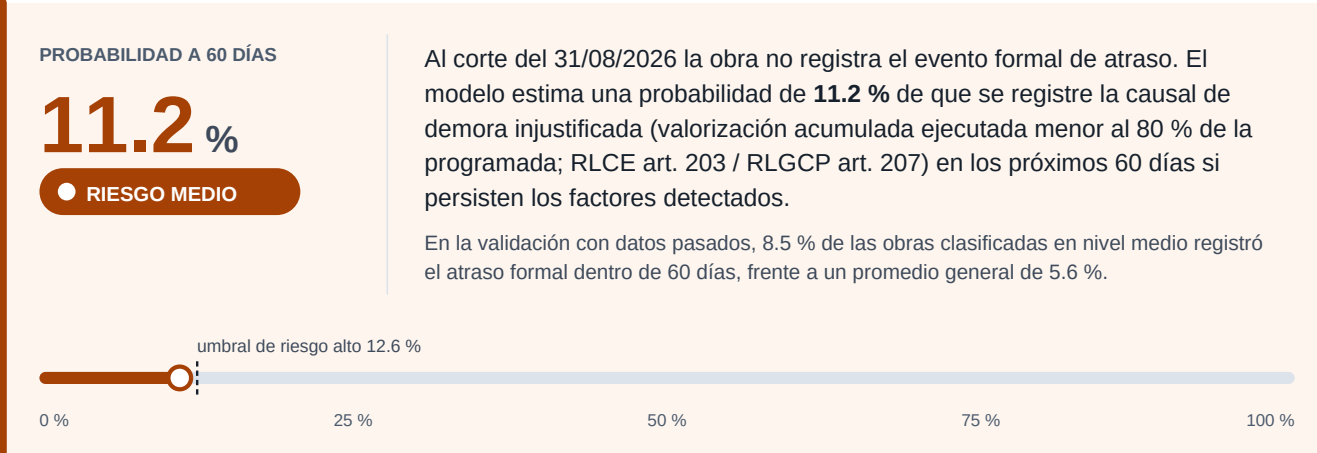


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	84 desde 02/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN MZ. B LT 1 AA.HH NUEVO JERUSALEN SECTOR I DISTRITO DE LA ESPERANZA,PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO
Contratista	CONSORCIO HOPE
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LA ESPERANZA / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2627487
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN MZ B LT 1 AA.HH. NUEVO JERUSALÉN SECTOR I DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2395838
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,086,857.59
Cuaderno de obra digital	84 asientos entre 02/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

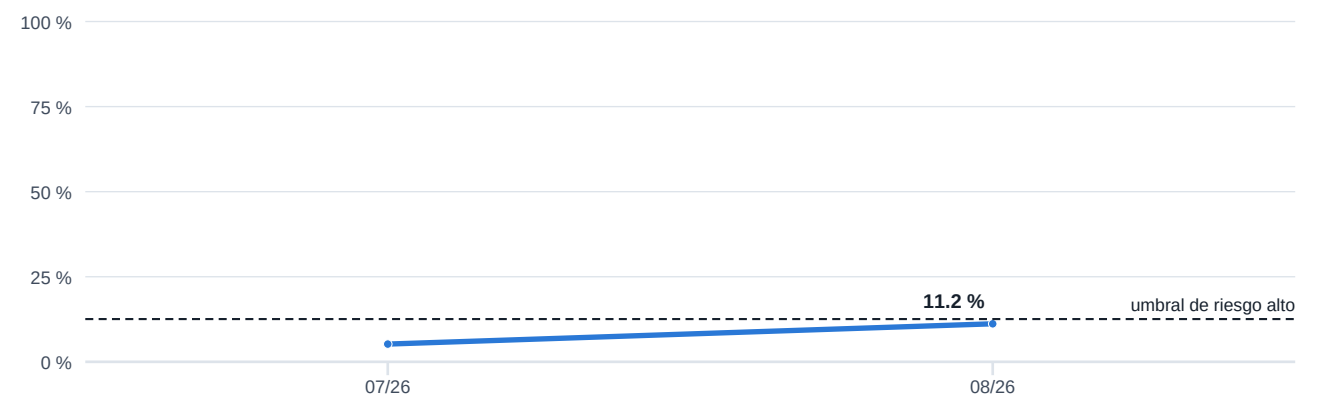

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.50 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.483
El 56 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.266
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.202
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.089
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.086
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.081
Extensión media de los asientos recientes: 991 caracteres	Contenido de los asientos		-0.062

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 76 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026 ...rabajos de curado de concreto utilizando aditivo z membrana blanca en muro pantalla en muro tipo xiv- se recomienda al contratista incrementar personal para acelerar los trabajos en obra y no caer en atraso. Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 74 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026 ...alla en muro tipo xiv- se verifica trabajos de mitigacion de polvo utilizando una cisterna con agua - se recomienda al contratista incrementar personal para acelerar los trabajos en obra y no caer en atraso. Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 72 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026**

...tas de dicho concreto- se verifica trabajos de mitigacion de polvo utilizando una cisterna con agua - se recomienda al contratista incrementar personal para acelerar los trabajos en obra y no caer en atraso.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 70 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026**

TRABAJOS DIARIOS: - SE PARTICIPA EN CHARLAS DE SEGURIDAD CON EL PERSONAL EN OBRA- SE VERIFICA TRABAJOS DE HABILITACION DE ACERO PARA ZAPATAS, PANTALLA CORRESPONDIENTE A MUROS DE CONTENCION, SS.HH, COLUMNAS, VIGAS COMO INDICAN LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO- SE VERIFICA TRABAJOS DE ENCOFRADO EN TRAMO R11 Y R12- SE VERIFICA TRABAJOS DER EXCAVACIONES EN LOS TRAMOS R3 Y TRAMO R4- SE VERIFICA TRABAJOS DE TABLESTACADOS,...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 70 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026**

...l que labora en obra. - se verifica trabajos de mitigacion de polvo utilizando una cisterna con agua - se recomienda al contratista incrementar personal para acelerar los trabajos en obra y no caer en atraso.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 68 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/08/2026**

TRABAJOS DIARIOS: - SE PARTICIPA EN CHARLAS DE SEGURIDAD CON EL PERSONAL EN OBRA- SE VERIFICA TRABAJOS DE HABILITACION DE ACERO PARA ZAPATAS, PANTALLA CORRESPONDIENTE A MUROS DE CONTENCION, SS.HH, COLUMNAS, VIGAS COMO INDICAN LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO- SE VERIFICA TRABAJOS DE MITIGACION DE POLVO UTILIZANDO UNA CISTERNA CON AGUA - SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA INCREMENTAR PERSONAL PARA ACELERAR LOS TRABAJOS EN ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

05 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
