


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Proyecto: Creacion del servicios de espacios públicos urbanos en boulevard san luis obispo de tolosa de prol. Comercio distrito de san luis de la provincia de cañete del departamento de lima- CUI N°2649726 - i etapa

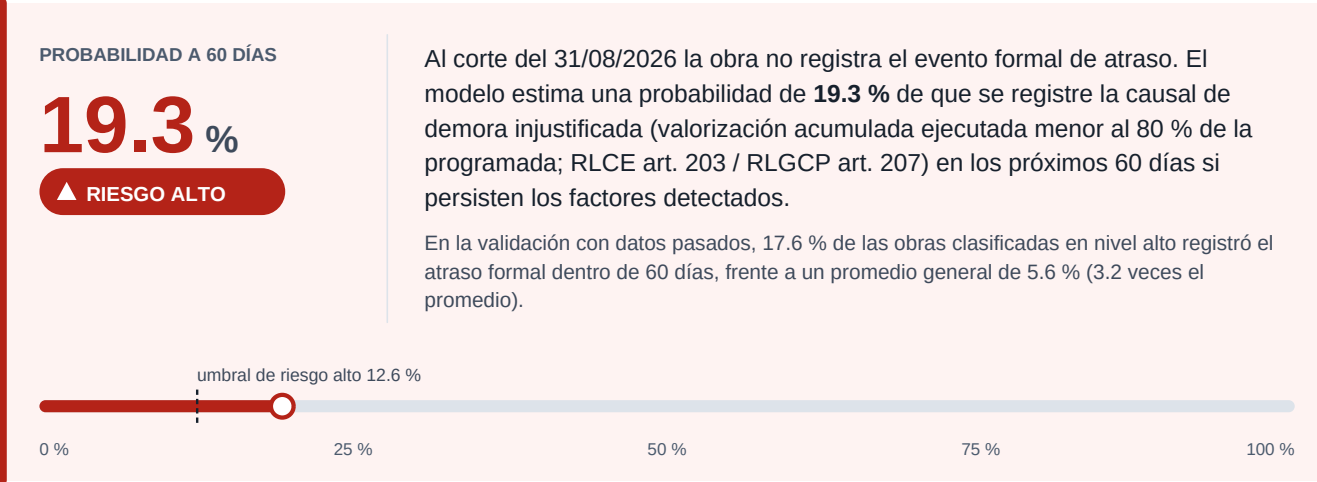


|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 112<br>desde 10/07/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | PROYECTO: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN BOULEVARD SAN LUIS OBISPO DE TOLOSA DE PROL. COMERCIO DISTRITO DE SAN LUIS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI N°2649726 - I ETAPA |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - CANETE                                                                                                                                                                            |
| Contratista                                     | CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA E INVERSIONES TEGAM S.A.C.                                                                                                                                                                   |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | SAN LUIS / CAÑETE / LIMA                                                                                                                                                                                                |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2649726                                                                                                                                                                                                                 |
| Inversión asociada                              | CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN BOULEVARD SAN LUIS OBISPO DE TOLOSA DE PROL. COMERCIO DISTRITO DE SAN LUIS DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA                                    |
| Función                                         | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                                                                                                                                                                                            |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2399947                                                                                                                                                                                                                 |
| Monto del contrato                              | -                                                                                                                                                                                                                       |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 7,810,140.29                                                                                                                                                                                                         |
| Cuaderno de obra digital                        | 112 asientos entre 10/07/2026 y 31/08/2026                                                                                                                                                                              |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

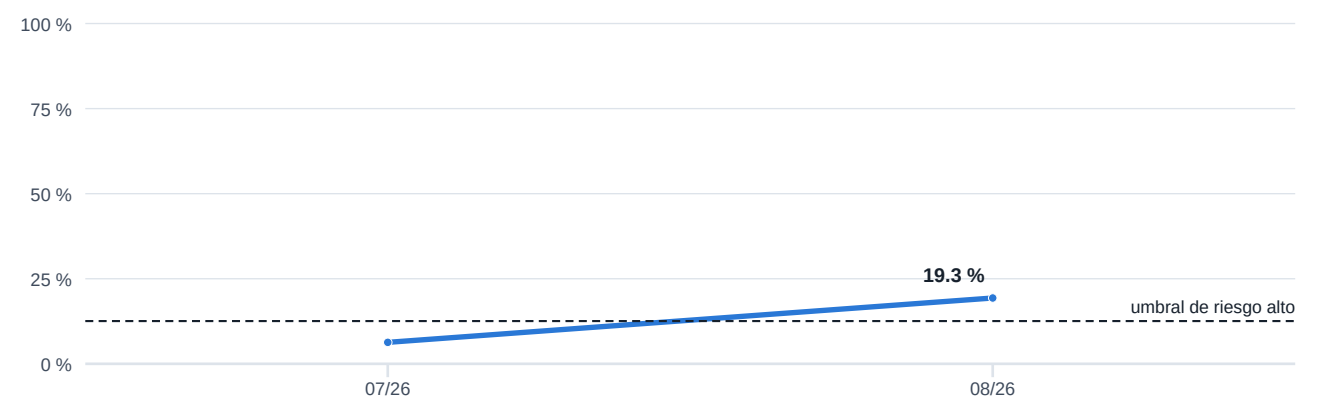

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                         | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)              | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.522 |
| El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.255 |
| El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                         | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.214 |
| Departamento: Lima                                                                                      | Características de la obra     | <div></div>    | +0.155 |
| 34 asientos de órdenes en los últimos 90 días                                                           | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.112 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                                  | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.108 |
| Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes                                                    | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.107 |
| 1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno                                     | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.092 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                            | Actual | Escenario | Cambio  |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días | 19.3 % | 17.9 %    | -1.5 pp |
| Absolver todas las consultas pendientes              | 19.3 % | 19.3 %    | -0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 111 · Órdenes · SOEC\_SPV · 31/08/2026

*CONTROL DE OBRA: Se deja constancia de las siguientes actividades y verificaciones efectuadas durante la jornada: Se verificó la realización de la charla de seguridad antes del inicio de la jornada laboral. Se verificaron los trabajos de encofrado y vaciado del muro de contención de mampostería de piedra, ejecutado con mezcla cemento-arena 1:5 + 70 % PG. Se verificaron los trabajos de vaciado del cimientado corrido con co...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 110 · Órdenes · SOEC\_SPV · 31/08/2026

*VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS LOS DÍAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2026: Se deja constancia de las siguientes actividades y verificaciones efectuadas durante las jornadas de los días 28 y 29 de agosto de 2026: Se verificó la realización de las charlas de seguridad antes del inicio de cada jornada laboral. Se verificaron los trabajos de encofrado y vaciado del muro de contención de mampostería de piedra, ejecutado co...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 104 · Órdenes · SOEC\_SPV · 27/08/2026

*CONTROL DE OBRA: Se deja constancia de las siguientes actividades y verificaciones efectuadas durante la jornada: Se verificó la realización de la charla de seguridad antes del inicio de la jornada laboral. Se verificaron los trabajos de encofrado y vaciado del muro de contención de mampostería de piedra, ejecutado con mezcla 1:5 + 70 % de piedra grande (PG). Se verificó el vaciado del cimientado corrido con concreto cic...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 102 · Órdenes · SOEC\_SPV · 26/08/2026

*VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA: En calidad de supervisión de obra, se deja constancia de las siguientes actividades y verificaciones efectuadas durante la jornada: Se verificó la realización de la charla de seguridad antes del inicio de la jornada laboral. Se verificaron los trabajos de encofrado y vaciado del muro de contención de mampostería de piedra, ejecutado con mezcla cemento-arena 1:...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 98 · Órdenes · SOEC\_SPV · 24/08/2026

*CONTROL DE OBRA: Se verificaron los siguientes trabajos ejecutados por el Contratista: - Se verificó el vaciado del muro de mampostería de piedra con mezcla 1:5 + 70 % de piedra grande (PG). - Se verificaron los trabajos de encofrado y desencofrado del muro de mampostería. - Se verificó el encofrado de las zapatas del muro de mampostería. - Se verificó el vaciado de concreto con resistencia de diseño  $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$  en ...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 87 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 19/08/2026

*...6-mdslc asciende a s/ 102,451.67 (ciento dos mil cuatrocientos cincuenta y uno con 67/100 soles), de acuerdo a la normativa de la ley n 32069 ley general de contrataciones publicas el maximo de otras penalidades es equivalente a 10% del monto del contrato original que resulta s/. 10,245.17 (diez mil doscientos cuarenta y cinco con 17/100 soles).9) en consecuencia, la maxima de otras penalidades aplicable a...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 86 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 19/08/2026

*...uando todas las anotaciones de cuaderno de obra digital se presumen que lo esta realizando el asistente de supervision de obra lo cual no es legal y estaria vulnerando a las normativas.6) la supuesta penalidad aplicada segun asiento n 83 del asistente supervision no tiene validez porque la unica persona autorizada es el jefe de supervision segun la ley n 32069 ley general de contrataciones publicas y su re...*

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 85 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 19/08/2026**

*...era durante a este periodo senalado nunca se hecho presente en obra, sin embargo debo expresar que durante a este periodo solo han estado el asistente de supervision y el practicante. esto implica el incumplimiento de sus obligaciones del personal clave de supervision del consorcio fortaleza.2) en los dias de fecha 15 y 17 de agosto del 2026 ningun integrante de la supervision del consorcio fortaleza no ...*

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 80 · Órdenes · SOEC\_SPV · 18/08/2026**

*PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN RESPECTO AL ASIENTO N° 77: En atención al Asiento N° 77, esta supervisión ratifica lo señalado en los asientos N° 74 y 75, precisando lo siguiente:El informe técnico N° 023-2026-CONSORCIO ZETA/MNHM-RO fue evaluado dentro del ámbito de las funciones de la supervisión, sin embargo, su presentación mediante carta no sustituye la formulación de una consulta en el cuaderno de incidencias....*

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 83 · Aplicación de penalidades · SOEC\_SPV · 18/08/2026**

*incumplimiento por empleo de agua no apta y aplicacion de penalidad . con fecha 18/08/2026, la supervision verifico el empleo de agua con apariencia turbia y presencia visible de sedimentos e impurezas para ...*

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 75 · Órdenes · SOEC\_SPV · 15/08/2026**

*... debidamente sustentado. hasta que ello ocurra, no corresponde considerar iniciado el computo del plazo para la atencion de la consulta ni atribuir a esta supervision responsabilidad por una supuesta demora.respecto de la afirmacion relacionada con perjuicios y retrasos atribuibles exclusivamente a la supervision, se deja constancia de que esta carece de sustento tecnico y contractual. cualquier eventua...*

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 73 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 14/08/2026**

*... directamente imputables a la supervision.3) en consecuencia, el contratista esta obligado de solicitar pronunciamiento a la entidad que absuelva las consultas directamente, advirtiendo perjuicios el retraso es atribuible exclusivamente a la supervision.*

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
