

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra: ¿creacion del servicio de movilidad urbana en la unidad vecinal la esperanza ¿ lambayeque ¿ lambayeque, con código único de inversión N°2687760

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

13.3 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **13.3 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %


|                    |                |                        |                |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO  | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 36<br>desde 22/07/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | EJECUCION DE LA OBRA: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA UNIDAD VECINAL LA ESPERANZA ¿ LAMBAYEQUE ¿ LAMBAYEQUE, con Código Único de Inversión N°2687760 |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE                                                                                                                                |
| Contratista                                     | CONSORCIO SIPAN                                                                                                                                                       |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE                                                                                                                                  |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2687760                                                                                                                                                               |
| Inversión asociada                              | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA UNIDAD VECINAL LA ESPERANZA DISTRITO DE LAMBAYEQUE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE   |
| Función                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                                            |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2401847                                                                                                                                                               |
| Monto del contrato                              | -                                                                                                                                                                     |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 2,212,678.29                                                                                                                                                       |
| Cuaderno de obra digital                        | 36 asientos entre 22/07/2026 y 31/08/2026                                                                                                                             |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

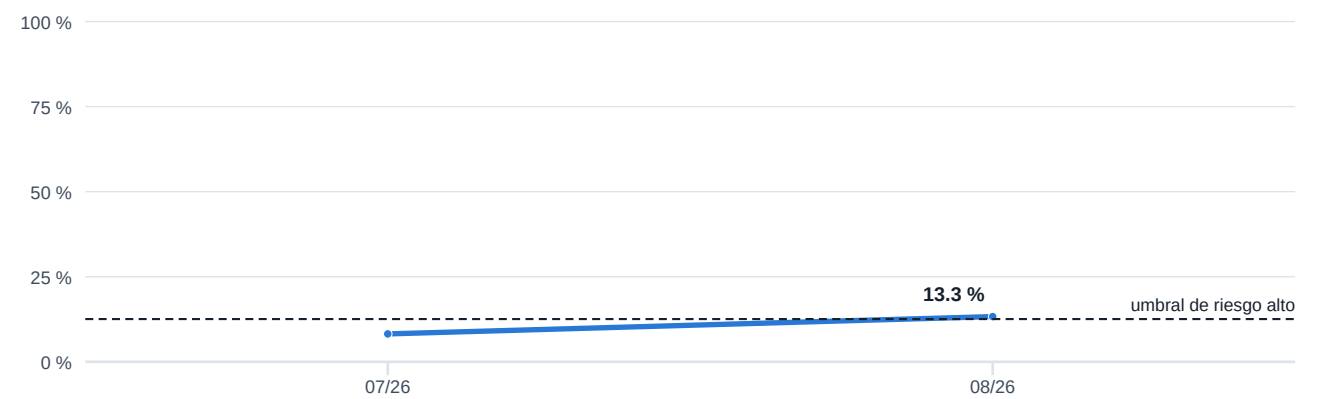

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                 | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)      | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.555 |
| Departamento: Lambayeque                                                                        | Características de la obra     | <div></div>    | +0.186 |
| Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)             | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.094 |
| Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | -0.091 |
| El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                 | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.081 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                          | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.078 |
| El 28 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección   | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | -0.061 |
| El 14 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad                | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.051 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|-----------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Absolver todas las consultas pendientes | 13.3 % | 13.3 %    | +0.0 pp |

05

Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

- Asiento N.º 28 · Respuestas a consultas · SOEC\_SPV · 22/08/2026

REDUCCION DE ESPESOR DE UÑA Y ADICIONAR SARDINELES: SE LE COMUNICA AL INGENIERO RESIDENTE QUE EL DIA DE AYER CON CARTA N 11 - 2026 - WOMV - RC SE HIZO LLEGAR A LA ENTIDAD SU CONSULTA PROPUESTA DE MODIFICACION DE ESPESOR DE UÑA DE LOSA E INCREMENTO DE SARDINEL PERALTADO Y SUMERGIDO Y TAMBIEN LA PROPUESTA TECNICA DEL SUPERVISOR DE LA CONSULTA TECNICA DEL RESIDENTE DE OBRA.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 20 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC\_SPV · 15/08/2026

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y PLANOS DE REPLANTEO: SE COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA QUE CON CARTA N° 004-2026-WOMV-RC, DE FECHA 05.08.2026 SE ALCANZÓ A LA ENTIDAD EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DE SUS CALENDARIOS RESPECTIVOS PRESENTADOS A LA FECHA DE INICIO DE OBRA Y CON CARTA N° 009-2026-WOMV-RC, DE FECHA 14.08.2026 SE PRESENTÓ LOS PLANOS DE REPLANTEO.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC\_SPV · 10/08/2026

INTERFERENCIA DE POSTES EN LA VIA: EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA EN EL PÁRRAFO 01 DEL ASIENTO N° 14, SE PRECISA QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTEMPLA ÚNICAMENTE LA REPOSICIÓN DE 06 POSTES DE MANERA GENERAL, OMITIENDO LAS COORDENADAS DE SUS UBICACIONES. SIN EMBARGO, DEL RECORRIDO EFECTUADO CONJUNTAMENTE ENTRE EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONTRATISTA, SE HA VERIFICADO QUE LA CANTIDAD REAL D...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 5 · Administración de riesgos · SOEC\_RESI · 25/07/2026

... perdida de estabilidad y/o caída. - areas invadidas, por kioskos y banos portatiles en la esquina de calle las americas con la carretera panamericana. las acciones necesarias para su desalojo pueden retrasar el plazo de obra.

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
