


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Creación del servicio educativo de educación inicial escolarizada en la i.e.i N°542-B

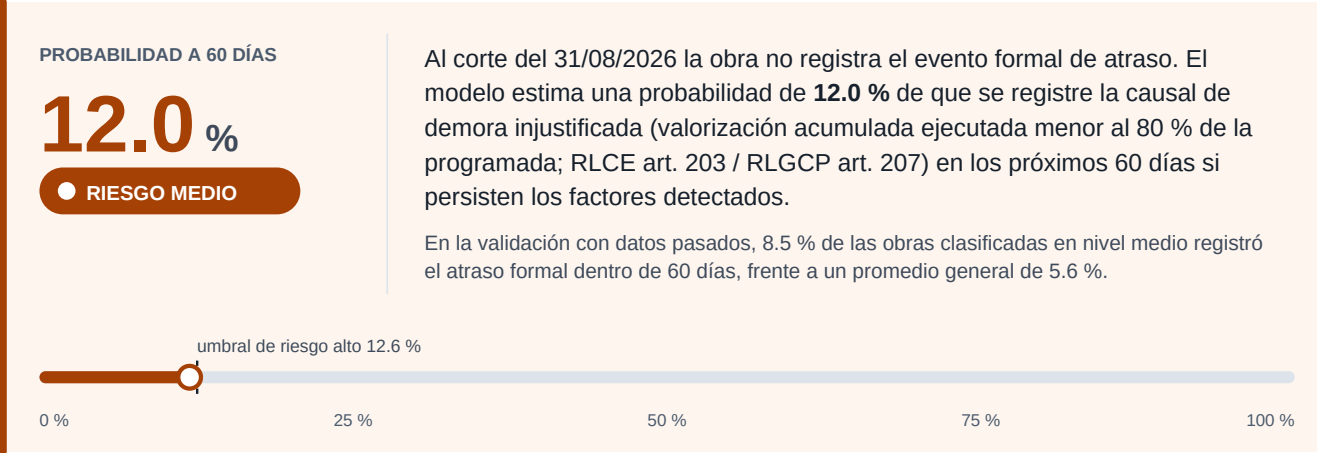


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	138 desde 27/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I N°542-B
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO SALUD CABALLOCOCHA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	RAYMONDI / ATALAYA / UCAYALI
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2385739
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	138 asientos entre 27/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

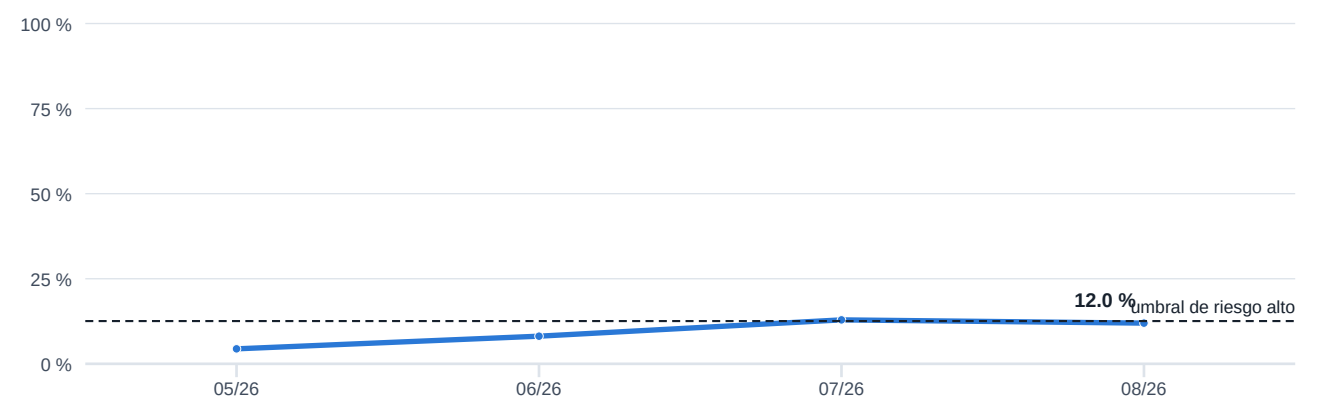

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.626
El 56 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.225
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.36 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		-0.152
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.094
Hubo registros en el cuaderno 26 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.085
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.071
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.068
44 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.042

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	12.0 %	11.6 %	-0.4 pp
Absolver todas las consultas pendientes	12.0 %	11.9 %	-0.0 pp

05

Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 133 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS: El día de hoy 27/08/2026, se realizó la charla de seguridad correspondiente con el personal de obra, en los Bloques I y II – Habitación de Docentes, Aulas y Administrativos, se continuó con los trabajos de encofrado y vaciado de concreto de columnas en los ejes N-N, desde el eje 14-14, eje P-P, desde el eje 14-14, eje P-P, desde el eje 13-13, eje O-O, desde el eje 11-11, y eje P-P...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 101 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS: El día de hoy 04/08/2026, se continuaron con las actividades de las partidas contractuales. Se solicita al Residente de Obra continuar con el control de calidad, mantener la señalización de seguridad y ambiental en obra, así como mantener el adecuado almacenamiento de materiales. Se deja constancia que esta supervisión de obra, cuenta con todo el Personal clave Ofertado en obra (ca...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 88 · Consultas · SOEC_RESI · 27/07/2026

...ida conforme a lo proyectado, debido a que la ubicacion definida para el pozo tubular resulta incompatible con la implantacion del tanque elevado, situacion que podria generar observaciones tecnicas, retrasos en la ejecucion, mayores costos y afectaciones al normal desarrollo de la obra, de continuarse con la ejecucion sin la correspondiente definicion tecnica. por lo expuesto, esta residencia formula la...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.° 74 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/07/2026

RESPUESTA AL CAMBIO DE AGREGADOS: POR MOTIVOS DE BAJA COBERTURA EL DIA DE AYER EN LA ZONA DEL PROYECTO NO SE PUDO LLENAR EL CUADERNO DE INCIDENCIAS. CON RESPECTO AL SUSTENTO TÉCNICO DE CAMBIO DE AGREGADO HORMIGÓN EN REEMPLAZO DE AREGNA GRUESA Y PIEDRA CHANCADA EN LA PARTIDA DE CONCRETO QUE PRESENTÓ EL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA N°013-2026-JVC-TG-ITEM 03 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2026. POR TRATARSE DE UNA MODIFICACIÓN A...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.° 30225, D.S. N.° 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.° 32069, D.S. N.° 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
