


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Lp n 01-2025-MDL/C-1 primera convocatoria

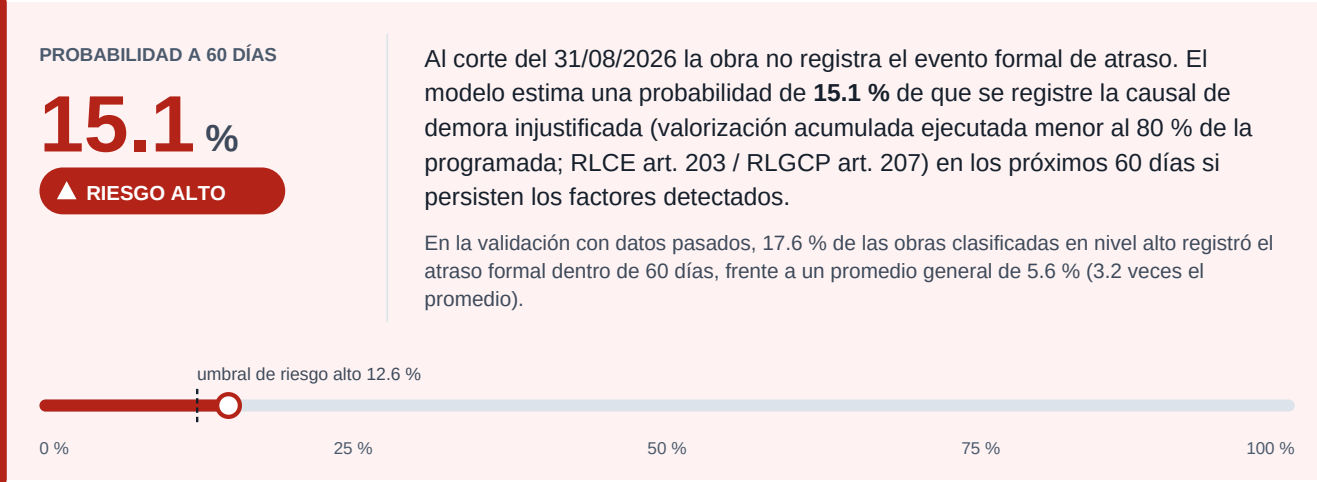


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	79 desde 16/04/2026	30/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	LP N 01-2025-MDL/C-1 PRIMERA CONVOCATORIA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE - AYMARAES
Contratista	CONSORCIO SANTIAGO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LUCRE / AYMARAES / APURIMAC
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2369039
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	79 asientos entre 16/04/2026 y 30/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

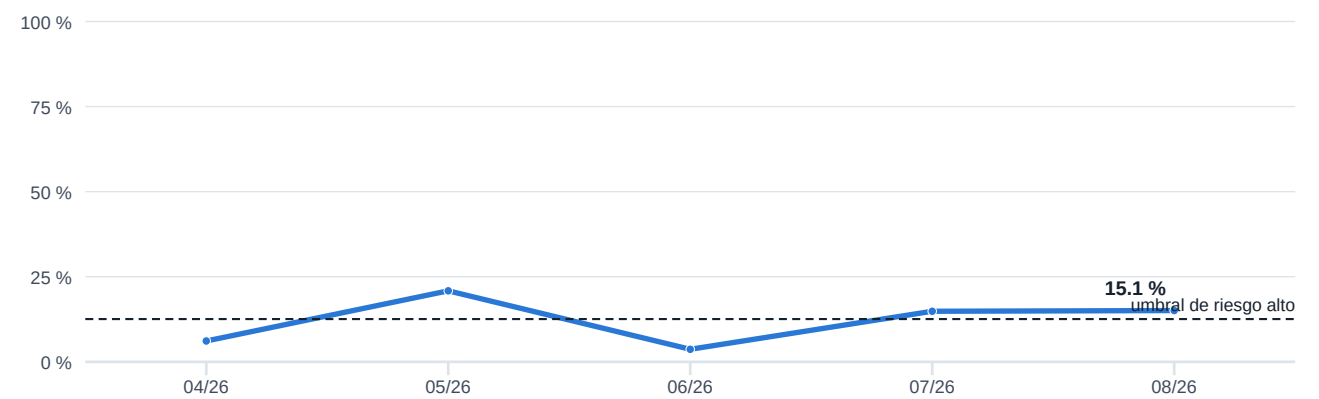

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.670
El 18 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.227
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.204
2 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.152
1 asiento de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.142
El último asiento se registró hace 1 día	Actividad del cuaderno de obra		+0.122
Departamento: Apurímac	Características de la obra		-0.092
Extensión media de los asientos recientes: 1,080 caracteres	Contenido de los asientos		-0.064

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	15.1 %	11.8 %	-3.2 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	15.1 %	15.0 %	-0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	15.1 %	15.1 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	15.1 %	15.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 64 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

... recomienda al contratista incrementar mayor cantidad de personal de moc y monc en vista que existen frentes de trabajo y la obra es lineal de esta manera cumplir la programacion de obra y no caer en retrasos injustificados.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 62 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

EN RESPUESTA A LOS ASIENTOS N° 58, 59, 60 Y 61: En relación al Asiento N° 58, se informa que el Contratista viene cumpliendo con la señalización y colocación de tranqueras en los frentes de trabajo. Se ha dispuesto personal de control (vigías) en los puntos de acceso críticos conforme lo indicado por la Supervisión, reforzando la vigilancia en horario nocturno y posterior al vaciado de concreto. Se adjunta registro f...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 63 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

...creto.ocurrencias:se deja constancia que durante los dias 10 y 11 de agosto de 2026 se presentaron precipitaciones pluviales de baja intensidad pero de caracter persistente y continuo, lo cual genero retrasos significativos en la ejecucion de los trabajos, especialmente en aquellas partidas vinculadas al vaciado de concreto, las cuales requieren condiciones climaticas favorables para garantizar la resis...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 60 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 04/08/2026

PENALIDAS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES: EL EQUIPO DE SUPERVISION VIENE VERIFICANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO, COMO SON VACIADO DE CONCRETO Y CUNETAS FC=210 KG/CM2 EN LA CALLE SOL NACIENTE Y AV. VILLA SOL. ASI COMO TAMBIEN ENCOFRADO DE VEREDAS EN LA AV. GRAU CUADRA 4, JR. ESTUDIANTES CUADRA 3.OBSERVACIONES Y PENALIDADES:1. AUSENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN OBRA, COMO ESPECIALISTA EN CALIDAD, ESPECIALIST...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 60 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 04/08/2026

... como son vaciado de concreto y cunetas fc=210 kg/cm2 en la calle sol naciente y av. villa sol. asi como tambien encofrado de veredas en la av. grau cuadra 4, jr. estudiantes cuadra 3.observaciones y penalidades:1. ausencia del plantel profesional clave en obra, como especialista en calidad, especialista ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo, los cuales seran sujetos a penalidad confor...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 55 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/07/2026

...orma inmediata el personal obrero calificado y no calificado en todos los frentes habilitados.cumplir estrictamente con las metas programadas para el presente mes, bajo responsabilidad de aplicar las penalidades contractuales correspondientes por retrasos injustificados.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 55 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/07/2026

...no calificado en todos los frentes habilitados.cumplir estrictamente con las metas programadas para el presente mes, bajo responsabilidad de aplicar las penalidades contractuales correspondientes por retrasos injustificados.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 51 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/07/2026

...a fecha no se han pagado las valorizaciones n 02 (mayo) y n 03 (junio), encontrandose la primera ya vencida y la segunda por vencer el 31 de julio del presente ano. segun informacion extraoficial, la demora se deberia a la espera de un credito suplementario, situacion que el contratista considera que no exime a la entidad de cumplir con sus obligaciones de pago, ni la libera de los intereses y penalidad...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 51 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/07/2026

...035-2026-consorciosantiago/fmhm, sobre reclamo por pago pendiente de valorizaciones n 02 y n 03, solicitud de informacion sobre presupuesto y cronograma de pagos, y advertencia de medidas legales por incumplimiento.en esta fecha, el contratista consorcio santiago, a traves de su representante legal, ha presentado la carta n 0035-2026-consorciosantiago/fmhm, mediante la cual comunica lo siguiente: que has...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 51 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/07/2026

REMISIÓN CARTA N° 0035-2026-CONSORCIOSANTIAGO/FMHM: REMITO CARTA N° 0035-2026-CONSORCIOSANTIAGO/FMHM, SOBRE RECLAMO POR PAGO PENDIENTE DE VALORIZACIONES N° 02 Y N° 03, SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE PAGOS, Y ADVERTENCIA DE MEDIDAS LEGALES POR INCUMPLIMIENTO.EN ESTA FECHA, EL CONTRATISTA CONSORCIO SANTIAGO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, HA PRESENTADO LA CARTA N° 0035-2026-CONSORCIOSAN...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 45 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/07/2026

...abajo durante todo el proceso de vaciado y manipulacion de herramientas. se constata que la falta de supervision de seguridad expone al personal a riesgos criticos (atrapamientos, golpes, caidas). el incumplimiento de esta directiva generara la aplicacion de las penalidades contractuales correspondientes.

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
