


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de la ejecucion de la obra del proyecto de inversion publica denominado: "ampliacion del servicio de movilidad urbana en sector aliso grande del barrio pueblo nuevo distrito de cajabamba de la provincia de cajabamba del departamento de cajamarca"-cui nro 2629090

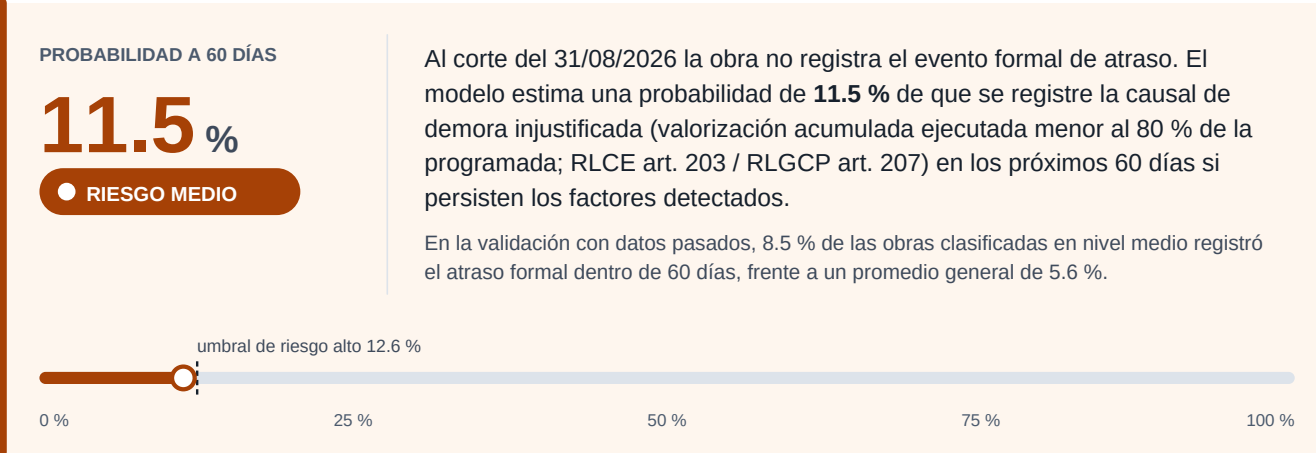


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 10,301,316.00	270 días	305 desde 20/12/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN SECTOR ALISO GRANDE DEL BARRIO PUEBLO NUEVO DISTRITO DE CAJABAMBA DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"-CUI NRO 2629090
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
Contratista	CONSORCIO SAN MARTÍN
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CAJABAMBA / CAJABAMBA / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2629090
Inversión asociada	AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN SECTOR ALISO GRANDE DEL BARRIO PUEBLO NUEVO DISTRITO DE CAJABAMBA DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2368478
Monto del contrato	S/ 10,301,316.00
Monto aprobado de la inversión	S/ 7,225,403.59
Cuaderno de obra digital	305 asientos entre 20/12/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

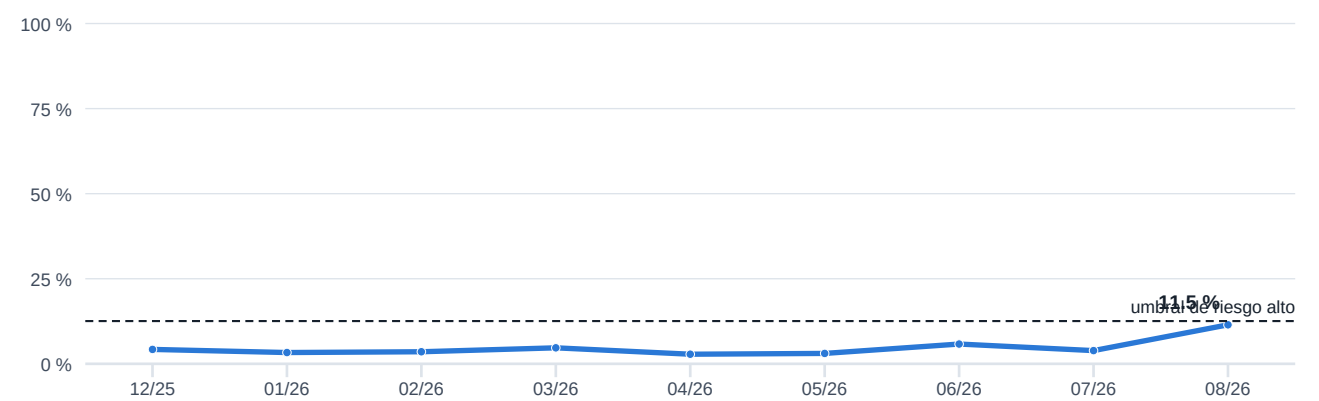

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (9 cortes, del 31/12/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.505
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.157
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.098
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.092
Faltan 16 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.078
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.061
El 17 % de los asientos de los últimos 60 días menciona deficiencias del expediente técnico	Contenido de los asientos		+0.054
Hubo registros en el cuaderno 14 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.052

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.5 %	11.3 %	-0.2 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.5 %	11.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 305 · Consultas · SOEC_SPV · 31/08/2026 <i>CONSULTAS, EN ATENCIÓN AL ASIENTO 302: La Supervisión toma conocimiento de la consulta formulada respecto a la definición del trazo en la cuadra 3 de la calle San Martín, debido a la discrepancia existente entre el ancho de vía consignado en el expediente técnico, el alineamiento con las cuadras adyacentes y lo manifestado por el propietario del terreno colindante. Al respecto, se precisa que la definición del trazo d...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 296 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026 <i>... grande, con el objetivo de dar continuidad a los trabajos en dicha area. el propietario mantiene su negativa al retiro del cerco conformado por postes y malla metalica, situacion que viene generando retrasos en la ejecucion del proyecto. se espera que la entidad adopte las medidas correspondientes para resolver el problema identificado y permitir la continuidad de las actividades programadas en esta vi...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 287 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026 <i>... a que actualmente se encuentra ausente de la ciudad de cajabamba. el propietario ha dispuesto que, durante su ausencia, no se retire la malla que delimita su propiedad, situacion que viene generando retrasos en la ejecucion de la obra. esta situacion viene generando retrasos en la ejecucion de la obra. la residencia logro comunicarse telefonicamente con el referido propietario, quien manifesto que no c...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 270 · Consultas · SOEC_RESI · 18/08/2026 <i>CONTINUACION DEL ASIENTO 269: Viene del Asiento N° 269De lo expuesto en los párrafos anteriores, se evidencia que las vías proyectadas como pasajes peatonales presentan actualmente funcionalidad vehicular, lo que genera deficiencias en el diseño, tales como la ausencia de sardineles que sirven de soporte para el adoquinado y las cunetas. En consecuencia, de mantenerse el uso vehicular en estas vías, la dura...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 263 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026 <i>DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DÍA 14.08.2026: La supervisión participa activamente en el inicio de actividades, esto es, con la charla de seguridad de 5 minutos, participando el equipo técnico de la Supervisión y contratista. Se verifica las actividades de movimiento de tierras en las calles Aliso Grande y Jr. Ricardo Palma, como excavación y eliminación de material con maquinaria pesada para la construcción de los M...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
INFOBRAS · - <i>Días para el fin programado original: 16</i>

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
