


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en urbanización nuevo miraflores distrito de san gaban de la provincia de carabaya del departamento de puno"

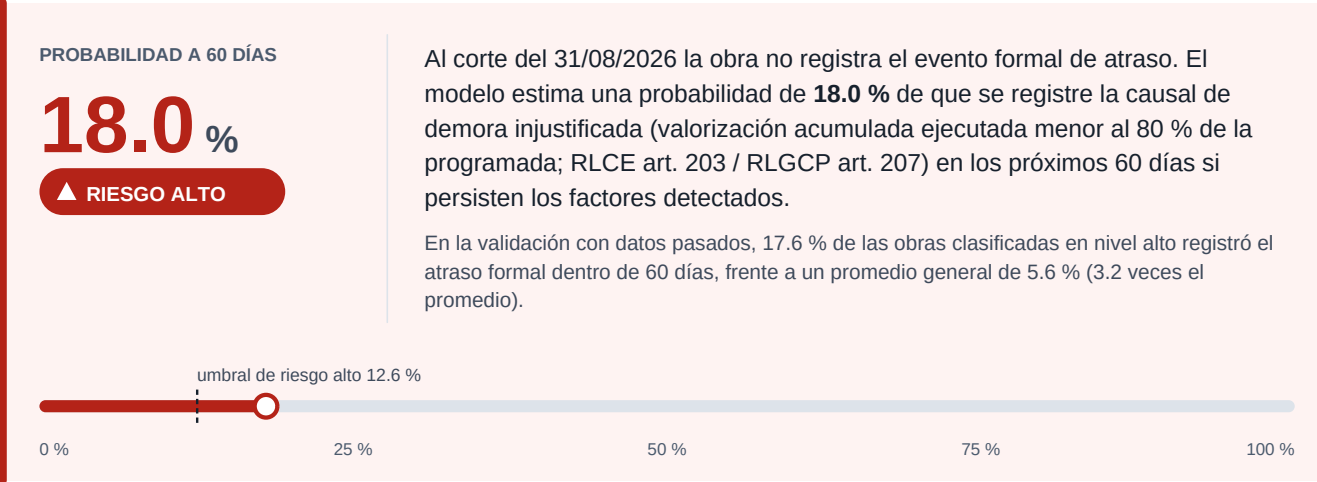


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	111 desde 02/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN URBANIZACIÓN NUEVO MIRAFLORES DISTRITO DE SAN GABAN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN
Contratista	NIÑO JESUS DE PRAGA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN GABAN / CARABAYA / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2683020
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA URBANIZACION NUEVO MIRAFLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN GABAN, DISTRITO DE SAN GABAN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2378803
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,436,067.36
Cuaderno de obra digital	111 asientos entre 02/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

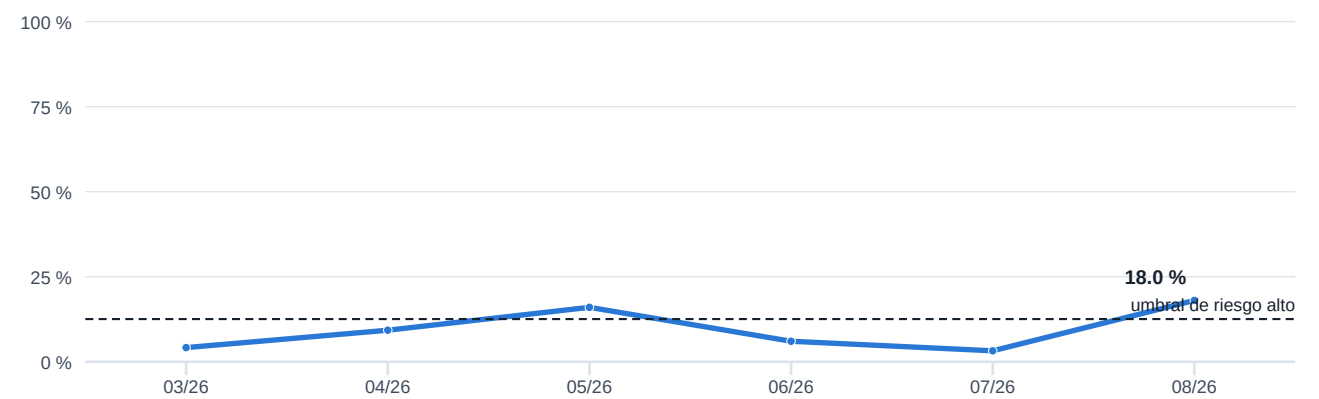

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.84 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.700
El 53 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.234
El 74 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.214
El 13 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.164
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.132
14 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		-0.125
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.109

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	18.0 %	18.0 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	18.0 %	18.6 %	+0.5 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 111 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/08/2026

ausencia del residente para la revision conjunta de metrados agosto 2026 . en fecha 31 de agosto de 2026, siendo las [hora], la supervision de obra se constituyo en obra para efectuar la revision conjunta de los metrados e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 109 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 28/08/2026

... se requiere al contratista informar y sustentar documentadamente las causas de las inasistencias senaladas y acreditar las medidas correctivas adoptadas, sin perjuicio de las acciones contractuales, penalidades y demas medidas que correspondan conforme al contrato de ejecucion de obra n. 035-2026-mdsg/gm, la ley n. 32069, su reglamento y demas disposiciones aplicables. de corresponder una sustitucion del ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 109 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 28/08/2026

RETRASO Y RECURSOS INSUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACELERADO: (...) VIENE DEL ASIENTO 108 DEL SUPERVISOR DE OBRAEn tal sentido, esta SUPERVISIÓN REQUIERE AL CONTRATISTA, CONSORCIO NIÑO JESÚS DE PRAGA, CON CARÁCTER URGENTE, garantizar la presencia efectiva del personal clave, incrementar y/o redistribuir la mano de obra, proveer los andamios y demás recursos necesarios y adoptar medidas inmediatas de rec...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 108 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 28/08/2026

retraso y recursos insuficientes para el cumplimiento del programa acelerado . la supervision deja constancia que, con fecha 28 de agosto de 2026, durante la verificacion e inspeccion realizada en obra, se ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 109 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 28/08/2026

retraso y recursos insuficientes para el cumplimiento del programa acelerado . (...) viene del asiento 108 del supervisor de obraen tal sentido, esta supervision requiere al contratista, consorcio nino jesu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 107 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 27/08/2026

...or la supervision.finalmente, se requiere al contratista informar y sustentar las causas de las ausencias senaladas y adoptar las medidas correctivas correspondientes, sin perjuicio de las acciones y penalidades que correspondan conforme al contrato de ejecucion de obra n. 035-2026-mdsg/gm, la ley n. 32069 y su reglamento.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 105 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 26/08/2026

constancia de omision de anotaciones relevantes en el cuaderno de incidencias y riesgo de retraso injustificado . la supervision de obra deja constancia que, como resultado del seguimiento efectuado a la ejecucion contractual y de la revision de las anotaciones existentes en el cuaderno de incid...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 106 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 26/08/2026

constancia de omision de anotaciones relevantes en el cuaderno de incidencias y riesgo de retraso injustificado . (...) viene del asiento 105 del sofinafinalmente, se requiere al residente de obra adoptar las medidas necesarias para mantener actualizado el cuaderno de incidencias respecto de los hec...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 100 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 20/08/2026

...lorizado acelerado, formulado precisamente con la finalidad de recuperar los atrasos registrados y asegurar el cumplimiento de las metas de ejecucion dentro del plazo contractual. en consecuencia, la falta de personal obrero verificada resulta incompatible con las condiciones y recursos que necesariamente deben garantizarse para cumplir los rendimientos, secuencia, frentes y metas previstos en dicho programa acele...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 100 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 20/08/2026

RIESGO DE RETRASO INJUSTIFICADO: La Supervisión deja constancia expresamente lo siguiente que, como resultado de las verificaciones efectuadas en obra, en fechas el 19 y 20 de agosto de 2026 se ha constatado la ausencia del personal obrero necesario para la ejecución de los trabajos, situación que viene afectando la continuidad y normal desarrollo de los frentes de trabajo programados.Se precisa que corresponde exclu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 101 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 20/08/2026

RIESGO DE RETRASO INJUSTIFICADO: (...) VIENE DEL ASIENTO N°100En tal sentido, la Supervisión REQUIERE Y DEJA CONSTANCIA EXPRESA de que el Contratista debe asumir íntegramente las consecuencias derivadas de una deficiente planificación, disponibilidad o gestión de sus recursos, no pudiendo trasladar a la Entidad o a la Supervisión las consecuencias de la falta de personal, insuficiencia de cuadrillas, inadecuada organ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
