


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de la obra: ¿construcción e implementación del almacén integrado de la intendencia regional ica e intendencia de aduana pisco en el distrito de subtanjalla, provincia y región ica¿ ¿ CUI 2134118

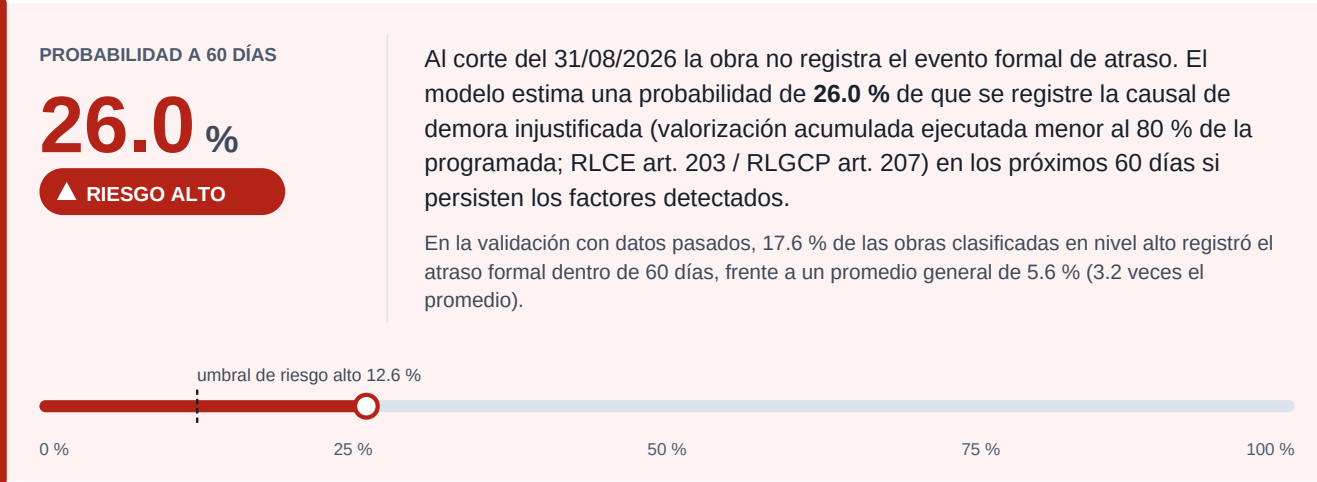


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 28,049,982.66	360 días	1,057 desde 20/10/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA¿ ¿ CUI 2134118
Entidad contratante	INVERSION PUBLICA SUNAT
Contratista	CONSORCIO G & S
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SUBTANJALLA / ICA / ICA
Código Único de Inversión (CUI)	2134118
Inversión asociada	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGION ICA
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Identificador del contrato (SEACE)	2353538
Monto del contrato	S/ 28,049,982.66
Monto aprobado de la inversión	S/ 9,186,259.00
Cuaderno de obra digital	1057 asientos entre 20/10/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

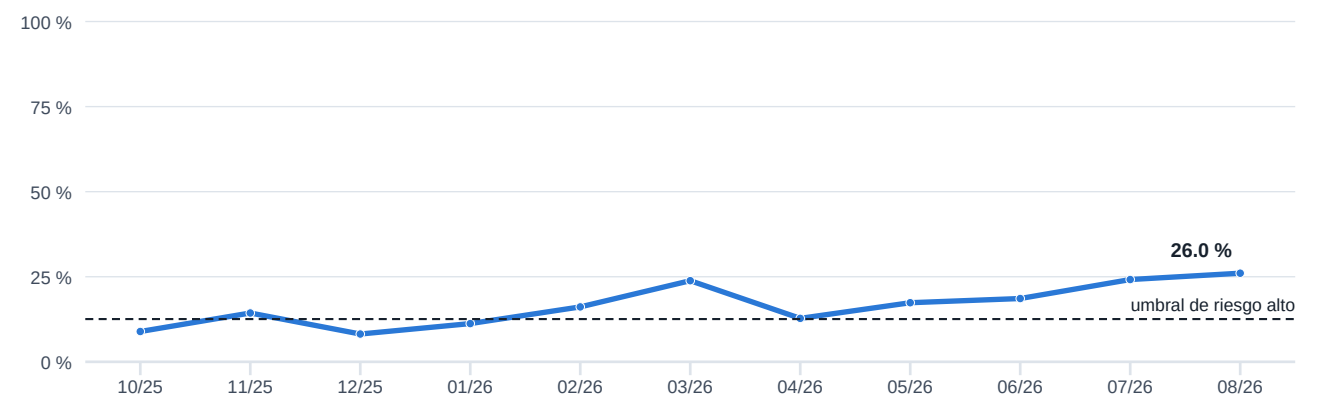

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (11 cortes, del 31/10/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.75 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.726
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.276
Faltan 46 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.216
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.174
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.139
Departamento: Ica	Características de la obra		-0.131
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.121
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.121

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	26.0 %	25.7 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	26.0 %	26.8 %	+0.7 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 1048 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 28/08/2026

...nidas en el expediente tecnico original del proyecto y de la necesidad de su correccion mediante la prestacion adicional antes indicada.en consecuencia, se deja expresa constancia de que la causal de atraso no atribuible a la contratista, oportunamente registrada en el cuaderno de obra, permanece vigente y activa, al mantenerse la imposibilidad de ejecucion de la partida 02.04.02 cobertura de almacen, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1047 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 28/08/2026

...ndidas dentro del procedimiento de revision y evaluacion del expediente tecnico del citado adicional, no constituyendo hechos atribuibles a la contratista ni modificando la naturaleza de la causal de atraso oportunamente registrada en el cuaderno de obra.cabe precisar que el expediente tecnico de la prestacion adicional de obra n. 08 deductivo vinculante n. 07 ha sido elaborado precisamente con la fina...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1044 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 26/08/2026

... de compra para materiales y/o equipos aprobados. en estricto cumplimiento del plan de gestion de riesgos del expediente tecnico de obra (eto), se identifica la activacion del riesgo r-005: retraso e incumplimiento en la entrega de equipos importados o subcontratos, el cual afecta directamente a los componentes criticos del proyecto (equipo electromecanico, tableros electricos, racks, fibrosilicato, vnr ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1044 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 26/08/2026

...de ordenes de compra para materiales y/o equipos aprobados. en estricto cumplimiento del plan de gestion de riesgos del expediente tecnico de obra (eto), se identifica la activacion del riesgo r-005: retraso e incumplimiento en la entrega de equipos importados o subcontratos, el cual afecta directamente a los componentes criticos del proyecto (equipo electromecanico, tableros electricos, racks, fibrosil...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1033 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

RESPUESTA DE CARTA N° 767-2026-SUNAT/8I300: SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE MEDIANTE CARTA N° 290-2026/DANILKA/SAC, LA SUPERVISIÓN REMITE A LA ENTIDAD LA RESPUESTA DEL SUPERVISOR SOBRE FICHA TECNICA DE RACKS.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1028 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 18/08/2026

... de compra para materiales y/o equipos aprobados. en estricto cumplimiento del plan de gestion de riesgos del expediente tecnico de obra (eto), se identifica la activacion del riesgo r-005: retraso e incumplimiento en la entrega de equipos importados o subcontratos, el cual afecta directamente a los componentes criticos del proyecto (equipo electromecanico, grupo electrogeno, tableros electricos, racks, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1028 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 18/08/2026

...de ordenes de compra para materiales y/o equipos aprobados. en estricto cumplimiento del plan de gestion de riesgos del expediente tecnico de obra (eto), se identifica la activacion del riesgo r-005: retraso e incumplimiento en la entrega de equipos importados o subcontratos, el cual afecta directamente a los componentes criticos del proyecto (equipo electromecanico, grupo electrogeno, tableros electric...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 997 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

notificacion de incumplimientos en el aseguramiento de calidad . se ordena al contratista dar estricto cumplimiento a los procedimientos de trabajo en la estructura metalica de los bloques a y b, y del patio de maniobras, a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 977 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/07/2026

atencion asiento 976 -requerimiento bajo apercibimiento de penalidad . en atencion al asiento n. 976 del residente de obra, esta supervision dispone lo siguiente:1. respecto a las variaciones y el calendario contractual: se reitera que las reduccio...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 934 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/07/2026

ATRASO EN OBRA Y ACTUALIZACION DE LOOK AHEAD: SE INDICA AL CONTRATISTA QUE A LA FECHA LA OBRA PRESENTA UN ATRASO. EL AVANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADO ES DEL 44.73%, FRENTE A UN PROGRAMADO DEL 48.37%. CON UN ATRASO DE 3.64%. POR LO TANTO, SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA LOOK AHEAD. ESTE DOCUMENTO DEBE DETALLAR LA ESTRATEGIA PARA ALCANZAR EL AVANCE ACUMULADO DEL 52.99% AL FINALIZAR EL MES. SE LE OT...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 901 · Consultas · SOEC_SPV · 10/07/2026

ATENCION ASIENTO 900 - CONSULTA 97: EN ATENCIÓN A LA CONSULTA N° 97, REGISTRADA EN EL ASIENTO N° 900 DEL CUADERNO DE OBRA, REFERENTE A LA ABSOLUCION DE CONSULTA N° 81 RESPECTO A LA INCOMPATIBILIDAD DE COBERTURA METALICA N°3 DEL PATIO DE MANIOBRAS, ENTRE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA., SE INDICA AL CONTRATISTA QUE LA SOLICITUD SERÁ EVALUADA Y RESPONDIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DEL ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

INFOBRAS · -

Días para el fin programado original: 46

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
