


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contrato N° 044-2025

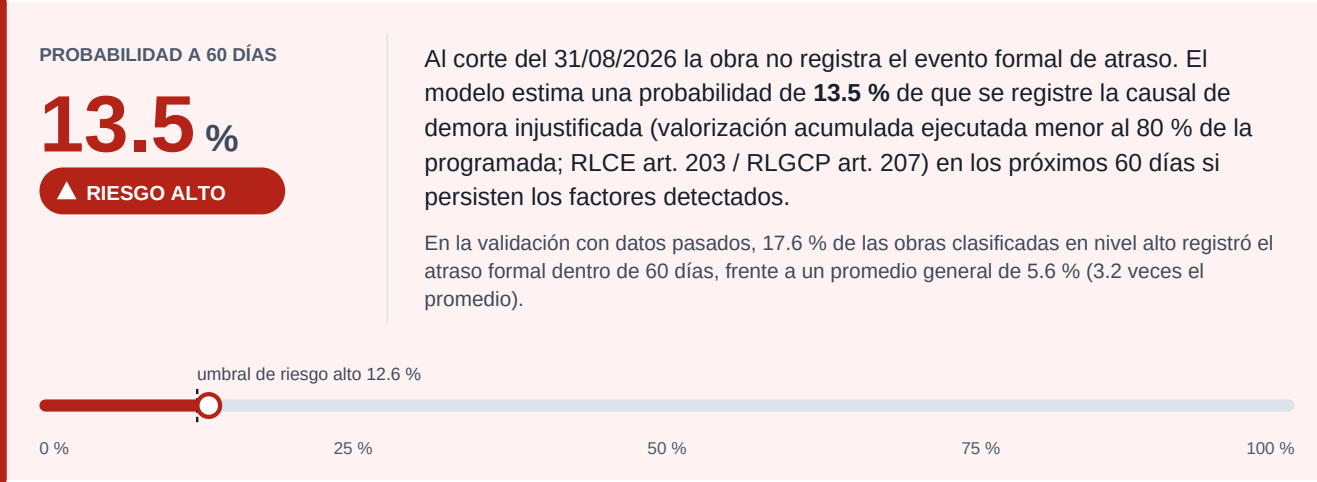


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	313 desde 18/02/2026	30/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATO N° 044-2025
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
Contratista	CONSORCIO TAMBOGRANDE I
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	QUERECOTILLO / SULLANA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2373250
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	313 asientos entre 18/02/2026 y 30/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

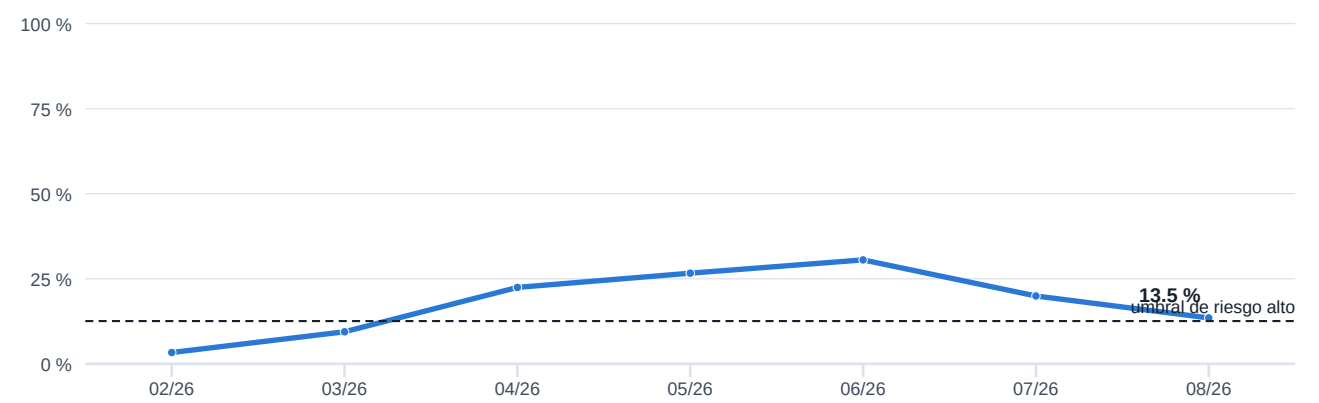

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (7 cortes, del 28/02/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.528
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.249
El 27 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.180
El último asiento se registró hace 1 día	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Registros del último mes: 0.69 veces el promedio mensual del trimestre	Actividad del cuaderno de obra		-0.095
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.064
Hubo registros en el cuaderno 15 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.056
41 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.055

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.5 %	13.3 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.5 %	13.5 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	13.5 %	13.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 313 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...del adicional n 01 con partidas contractuales instalaciones de agua, puertas, cantoneras, protectores, portones y puertas de melamina sin individualizar avance, predecesoras, causa del impedimento ni atraso atribuible. por ello, no corresponde presumir incumplimiento ni aplicar medidas contractuales sin determinar previamente la causalidad y la imputabilidad exigidas por el artículo 120.4 del reglament...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 313 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...ciones de agua, puertas, cantoneras, protectores, portones y puertas de melamina sin individualizar avance, predecesoras, causa del impedimento ni atraso atribuible. por ello, no corresponde presumir incumplimiento ni aplicar medidas contractuales sin determinar previamente la causalidad y la imputabilidad exigidas por el artículo 120.4 del reglamento. se solicita a la supervision efectuar una evaluacion ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 305 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 26/08/2026

....a, 198.3, 200.1 y 200.2 del reglamento de la ley n 32069, se solicita la ampliacion parcial de plazo n 09 por cuarenta y seis (46) dias calendario, correspondiente al tramo 14/07/2026-28/08/2026, por atraso no atribuible al contratista que modifica la ruta critica. el termino contractual referencial resultante es el 13/10/2026. la causal permanece abierta, reservandose el derecho de solicitar periodos ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 303 · Consultas · SOEC_RESI · 26/08/2026

...o estudio, la memoria de calculo y la subsanacion del expediente tecnico.4. evaluar con caracter prioritario el estudio y la documentacion tecnica que presente el contratista, a fin de evitar mayores demoras en el tramite del adicional de obra n 02 y deductivo vinculante n 01. la incidencia efectiva de estos hechos sobre la programacion contractual sera cuantificada y sustentada por el contratista en la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 298 · Consultas · SOEC_RESI · 21/08/2026

...on del expediente tecnico del adicional de obra n 02 y deductivo vinculante n 01. por lo expuesto, se solicita a la supervision emitir su pronunciamiento a la brevedad posible, a fin de evitar mayores demoras en el procedimiento de evaluacion y aprobacion de la referida prestacion adicional.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 292 · Adicionales · SOEC_RESI · 11/08/2026

PRESENTACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICO-CONTRACTUAL DE LAS OBSERVACIONES AL ADICIONAL DE OBRA N° 04: Se deja constancia de que, mediante Carta N° 069-CONSORCIO TAMBOGRANDE IV-RC, de fecha 10/08/2026, el Representante Común del Consorcio Tambogrande IV presentó ante la Supervisión el Informe N° 062-2026-AGSY/RO, que contiene la evaluación técnico-contractual integral de las observaciones formuladas mediante Carta Múltiple ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 284 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 07/08/2026

...ectaciones posteriores sean atribuibles al contratista, no implica renuncia al reconocimiento del plazo necesario para ejecutar prestaciones adicionales aprobadas, no implica aceptacion anticipada de penalidad por mora, ni implica renuncia a los efectos tecnicos, economicos y contractuales que correspondan conforme a la ley n 32069, su reglamento y el contrato. cualquier determinacion respecto de la fecha ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 274 · Adicionales · SOEC_RESI · 03/08/2026

...edio sustitutorio valido, ni se determine formalmente la fecha de inicio, no existe referencia contractual cierta para computar los 35 dias calendario. por ello, no corresponde atribuir atraso, mora, incumplimiento o penalidad respecto de un plazo cuyo inicio no ha sido definido y acreditado. sigue ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 272 · Adicionales · SOEC_RESI · 01/08/2026**

...n concordancia con el expediente tecnico aprobado, su programacion y la liberacion de los frentes involucrados.5. confirmar que no se efectuara computo retroactivo del plazo ni se atribuiara retraso o penalidad por un periodo anterior a la eficacia del acto y a la determinacion formal del inicio operativo del adicional.el contratista mantiene su disposicion para coordinar y ejecutar oportunamente la prestac...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 221 · Adicionales · SOEC_RESI · 06/07/2026**

NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA POR CERRAMIENTOS LATERALES BAJO GRADERÍAS ENTRE LOS EJES C Y D – CONSULTA DE OBRA N° 15 - PARTE I: Se deja constancia que esta Residencia ha tomado conocimiento de la Carta Múltiple N° 264-2026/GRP-401000, de fecha 02 de julio de 2026, mediante la cual la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna remite la absolución complementaria de la Consulta de Obra N° ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
