


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra ¿ampliación de redes de distribución en el departamento de la libertad¿

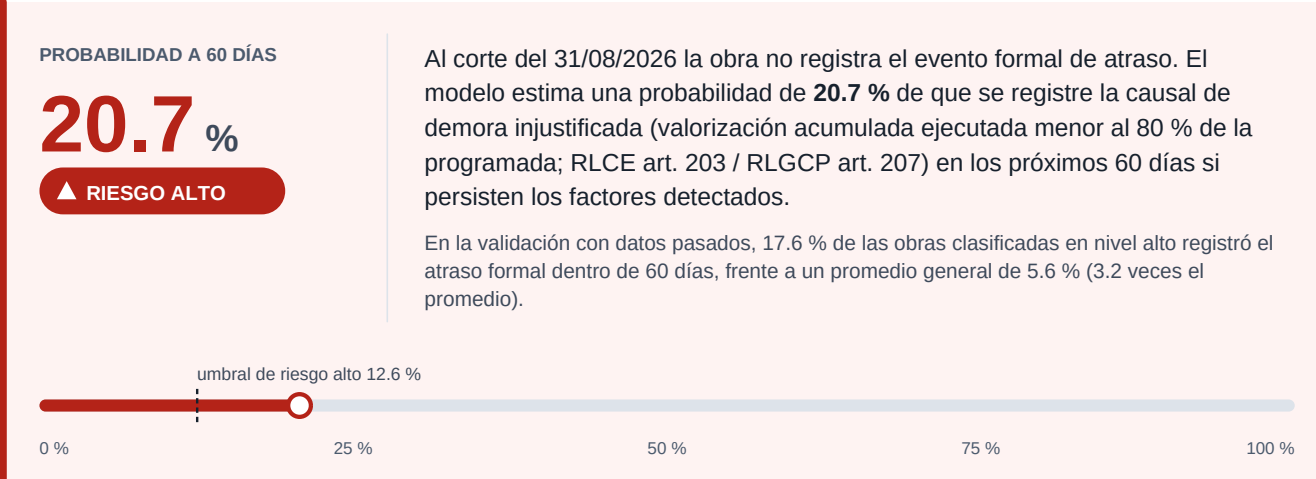


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 53,798,880.24	450 días	167 desde 02/12/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿
Entidad contratante	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Contratista	CONSORCIO ENERGIA VIVA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VIRU / VIRU / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2331616
Inversión asociada	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Función	ENERGÍA
Identificador del contrato (SEACE)	2352324
Monto del contrato	S/ 53,798,880.24
Monto aprobado de la inversión	S/ 31,159,213.55
Cuaderno de obra digital	167 asientos entre 02/12/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

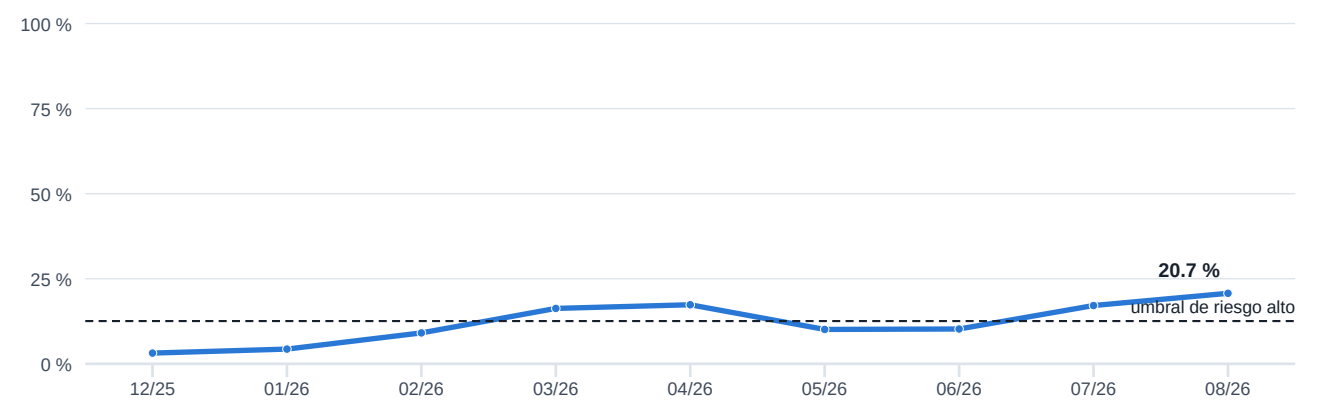

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (9 cortes, del 31/12/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.685
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.202
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.191
El 56 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.183
3 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.121
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 8,251,190	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.118
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.114
1 asiento de constatación física en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.111

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	20.7 %	21.1 %	+0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 167 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

...iones y recomendaciones técnicas señaladas, correspondiendo al contratista adoptar las acciones necesarias para su cumplimiento y/o consideración en la ejecución de la obra, caso contrario, cualquier retraso o perjuicio posterior será de su entera y exclusiva responsabilidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 164 · Órdenes · SOEC_SPV · 24/08/2026

...on de beneficiarios dentro de la zona convencional no es posible su atención con el presente proyecto, conforme a las disposiciones aplicables de la ley de concesiones eléctricas. en consecuencia, el incumplimiento o la omisión de lo comunicado y de la documentación remitida será de exclusiva responsabilidad del contratista. asimismo, mediante la carta n. 0159-2026/rub-so, de fecha 20 de agosto de 2026, l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 164 · Órdenes · SOEC_SPV · 24/08/2026

ENTREGA DE ACTUALIZACIÓN DE FACTIBILIDAD ELÉCTRICA, PUNTOS DE DISEÑO Y USUARIOS DENTRO DE LA CONCESIÓN CONVENCIONAL DE HIDRANDINA: Se deja expresa constancia que la Supervisión de Obra comunicó al Contratista CONSORCIO ENERGÍA VIVA las disposiciones, recomendaciones y advertencias relacionadas con la ejecución de la obra: Con la Carta N.º 0158-2026/RUB-SO, de fecha 18.08.2026, la Supervisión comunicó oportunamente al...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 161 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_SPV · 18/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N.º 159 - EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS: En respuesta al Asiento N.º 159 del Residente de Obra, esta Supervisión toma conocimiento de las gestiones realizadas ante los proveedores para la ratificación de cotizaciones y plazos de entrega de materiales para los mayores metrados. Al respecto, se indica al contratista a presentar el comparativo de precios y la programación actualizada de ingresos a obr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 150 · Órdenes · SOEC_SPV · 31/07/2026

...concreto armado centrífugo de 15/500 (de una sola pieza) como primer poste / punto de diseño de la lp-33 ampliación sausacocha. esto responde a lo acordado en el replanteo físico para solucionar el incumplimiento de la distancia mínima de seguridad (dms) de la sede existente respecto a la vivienda adyacente. 3) trámites ante provias nacional (carta n 146-2026/rub-so): se solicita informar los trámites y ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 150 · Órdenes · SOEC_SPV · 31/07/2026

GESTIONES Y/O TRÁMITES A REALIZAR PARA LA OBRA: Se deja constancia en el Cuaderno de Obra de la notificación y remisión formal al Contratista de las siguientes cartas y requerimientos: 1) Trámites de CIRA (Carta N.º 144-2026/RUB-SO): Se requiere al Contratista (a través de su especialista en Arqueología) informar sobre el estado y avance de los trámites de CIRA para las Redes Primarias y Secundarias de las localidades ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 148 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/07/2026

atraso en montaje electromecánico según cronograma de ejecución de obra vigente. por medio de la presente, se deja constancia de que, mediante la carta n 143-2026/rub-so de fecha 27/07/2026, la supervisión...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 148 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/07/2026

ATRASO EN MONTAJE ELECTROMECÁNICO SEGÚN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE: Por medio de la presente, se deja constancia de que, mediante la Carta N.º 143-2026/RUB-SO de fecha 27/07/2026, la Supervisión notificó el atraso en el montaje electromecánico y solicitó al Contratista Consorcio Energía Viva un plan de trabajo detallado e integral por cada frente. El objetivo de dicho documento es revertir el atraso acumu...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.° 131 · Órdenes · SOEC_SPV · 07/07/2026

SOLICITO ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA EN RESPUESTA AL ASIENTO N° 130: En atención al Asiento N.° 130, esta Supervisión ha procedido a evaluar la necesidad de actualizar las herramientas de programación de ejecución de obra. Tras la revisión técnica y el control de la obra, se constata que, efectivamente, el Programa de Ejecución de Obra (PEO) vigente ha quedado desfasado y no refleja la secuencia re...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.° 30225, D.S. N.° 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.° 32069, D.S. N.° 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
