


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. San Juan del distrito de huasahuasi - provincia de tarma - departamento de junín, con CUI N° 2349250

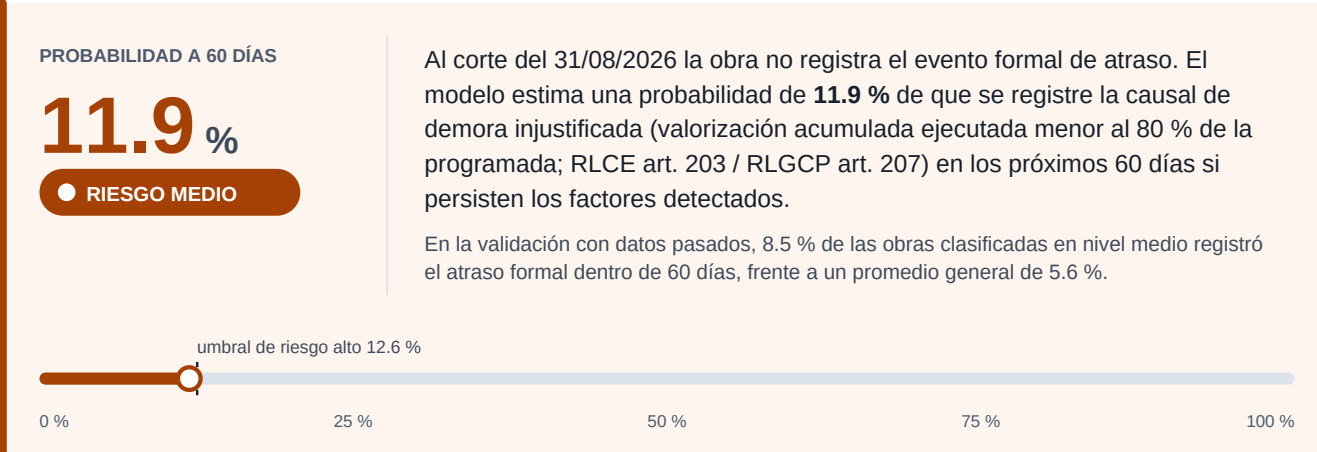


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	217 desde 23/09/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN JUAN DEL DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN, con CUI N° 2349250
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO HUASAHUASI
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUASAHUASI / TARMA / JUNIN
Código Único de Inversión (CUI)	2349250
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN JUAN DEL DISTRITO DE HUASAHUASI - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2347084
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 9,017,810.11
Cuaderno de obra digital	217 asientos entre 23/09/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

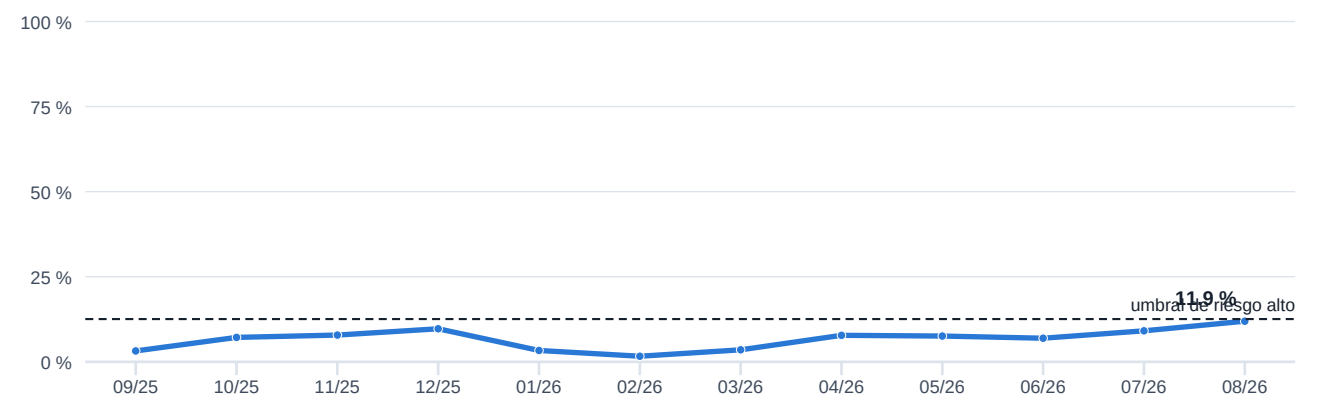

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (12 cortes, del 30/09/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.589
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.226
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.121
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.100
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 1,724,362	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.099
6 asientos de constatación física en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.071
Hubo registros en el cuaderno 19 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.067
Extensión media de los asientos recientes: 1,027 caracteres	Contenido de los asientos		-0.063

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.9 %	11.8 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 211 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 25/08/2026

SOBRE CONSULTAS PRESENTADO POR RESIDENTE DE OBRA SE DERIVA AM LOS ESPECIALISTAS: SEGUN ASIENTO N° 208 DE RESIDENTE DE OBRA, DONDE SOLICITA CONSULTA Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE CIELORRASO EN COCINA Y SUM EN PRIMER NIVEL. ESTA CONSULTA SE REMITE A LOS ESPECIALISTAS EN ARQUITECTURA Y SANITARIO DE CONSORCIO SAN JUAN, HACIENDO MENCION QUE ESTA CONSULTA SE DEBERIA APROBARSE A NIVEL DE SUPERVISION YA QUE NO SON PARTIDAS...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 206 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 21/08/2026

...amaras de videovigilanciaen donde presentan solo a nivel de consulta, por lo que se coordina y se devuelve para mejorar el informe tecnico y si es posible presentar con propuesta. en vista que se han demorado en elaborar y mejorar el sustento tecnico esta supervision recepciona tal como han elaborado anteriormente por el esp. en instalacion electrica del consorcio huasahuasi, para la consulta. y se le r...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 200 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 17/08/2026

EJECUCION DE LA OBRA: SE VERIFICO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:- SE VERIFICO CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS EN MODULO B- SE VERIFICO CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VIGUETAS- SE VERIFICO JUNTAS DE 1" CON TEKNOFOR EN COLUMNETAS Y VIGUETAS MODULO B- SE VERIFICO MURO DE LADRILLO CABEZA EN MODULO C- SE VERIFICO ACERO DE REFUERZO EN COLUMNETAS Y VIGUETAS EN MODULO C- SE VERIFICO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS EN MODU...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 200 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 17/08/2026

...o de materiales para vaciado de columnas placas, escaleras, losa aligerada, como cemento, aceros, bloquetas para techo, ladrillos, estructura metalica para cobertura, etc. por tal motivo la obra esta atrasada, por lo que se recomienda con abastecer en forma permanente.asi lo mismo se recomienda en forma reiterativo presentar propuesta de la red de alcantarillado que pasa por el terreno del colegio, exp...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 198 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 13/08/2026

TRABAJOS DESARROLLADOS: SE VERIFICO LOS TRABAJOS EN LA RECTIFICACION Y CORRECCION DE LAS BRUÑAS EN LAS JUNTAS SISMICAS SEGUN LOS PLANOS QUE INDICAN JUNTAS DE 1" Y 1 CM. ASI LO MISMO SE HA VERIFICADO TARRAJEO DE LAS VIGAS PERALTADAS HASTA EL CIELORRASO TAL COMO INDICA EN LOS PLANOS, METRADOS Y PRESUPUESTO. SE VERIFICO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS Y VIGUETAS EN MODULO B SE VERIFICO CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN LA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 194 · Constatación física de la obra · SOEC_RESI · 11/08/2026

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN OBRA Y MEDIO AMBIENTE, SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION: EL SUPERVISOR DE OBRA PRESENTA LA CARTA N° 036-2026-CONSORCIO SAN JUAN/SUP-ARQ. SFV DEL 05/08/2026 E INFORME N° 012-2026-CONSORCIO SAN JUAN/E-SYMA/GCQR DEL 04/08/2026, RESPECTO A LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN OBRA Y MEDIO AMBIENTE, SOLICITUD D...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 190 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

...al se remite al residente de obra con carta n 036-2026-conosrcio san juan/sup/arq.sfv, el dia 05/08/2026, a fin de realizar el descargo del documento de gobierno regional de junin, y su aplicacion de penalidad o retencion de la valorizacion de ser el caso.el ing. de ssoma del consorcio san juan presenta el informe n 12-2026-consorcio san juan/e-syma/gcqr, asunto observaciones de seguridad, salud en obra y ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 189 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 07/08/2026**

SE REMITE CONSULTA MEJORAMIENTO Y PROPUESTA DE MODIFICACION DEL MODULO E: EL DIA DE HY SE RECIBE LA CARTA N° 041-2026/RO-ARQ.RAZ, ASUNTO CONSULTA, MEJORAMIENTO Y PROPUESTA DE MODIFICACIONES DEL MODULO E, CON SUS ANALISIS Y PROPUESTAS DE LOS ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, SANITARIO Y ELECTRICO TOTAL 54 FOLIOS, Y ESTA SUPERVISION SE DERIVA A LOS ESPECIALISTAS DEL CONSORCIO SAN JUAN SUPERVISION A FIN DE SU P...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 163 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 10/07/2026**

REUNION CON LAS AUTORIDADES PARA TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS: EL DIA DE AYER SE HA RECIBIDO VISITAS DE AUTORIDADES PREVIA COMUNICACION REALIZANDO ACTAS DE INSPECCION:Con la presencia de Arq. UGEL Tarma, Directos de I.E. San Juan, Presidente de APAFA, Residente y Supervisor de obra, se inspeccionaron los siguientes problemas:1. La red de alcantarillado que beneficia a 20 viviendas, pasa por el terreno de I.E. San Juan, ...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 162 · Otras modificaciones contractuales · SOEC_SPV · 09/07/2026**

PRONUNCIAMIENTO A LA CONSULTA TECNICA DE RED ALCANTARILLADO EXISTENTE EN EL TERRENO I.E. SAN JUAN: CON FECHA 09/07/2026 HORA 10.30 AM. SE HA RECIBIDO INFORME N° 006-2026-CH/RO-ARQ.RAZ, ASUNTO: CONSULTA TECNICA SOBRE RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE DENTRO DEL TERRENO DE I.E. SAN JUAN CON INTERFERENCIAS CON EL CERCO PERIMETRO Y SERVICIOS HIGIENICOS EN EL MODULO C. ELABORADO LA CONSULTA POR EL ING. SANITARIO DE CONSORC...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
