


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecución de la obra: ¿reparacion de pista y vereda, en el (la) calle andalucia, calle cadiz, calle manco capac, calle pedro ruiz, calle cordova y calle toledo en la urbanizacion san juan del distrito de chiclayo, provincia de chiclayo, departamento de lambayeque¿ ¿ CUI N° 2701265.

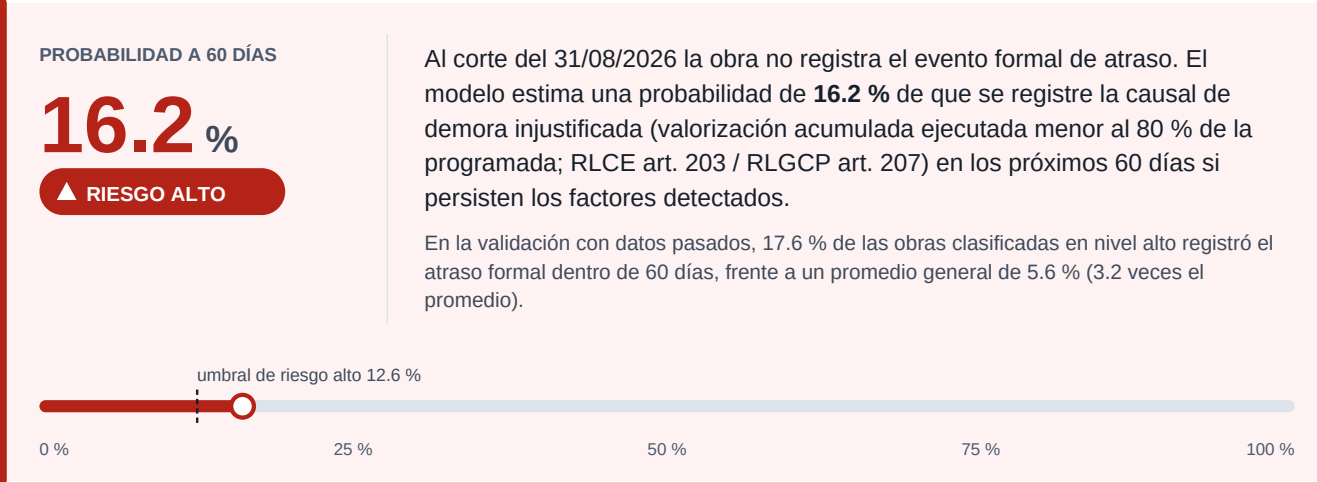


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	130 desde 25/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿REPARACION DE PISTA Y VEREDA, EN EL (LA) CALLE ANDALUCIA, CALLE CADIZ, CALLE MANCO CAPAC, CALLE PEDRO RUIZ, CALLE CORDOVA Y CALLE TOLEDO EN LA URBANIZACION SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿ ¿ CUI N° 2701265.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Contratista	CORPORACION ALJAR SAC
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2701265
Inversión asociada	REPARACION DE PISTA Y VEREDA EN EL(LA) CALLE ANDALUCIA, CALLE CADIZ, CALLE MANCO CAPAC, CALLE PEDRO RUIZ, CALLE CORDOVA Y CALLE TOLEDO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2393023
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,670,866.77
Cuaderno de obra digital	130 asientos entre 25/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

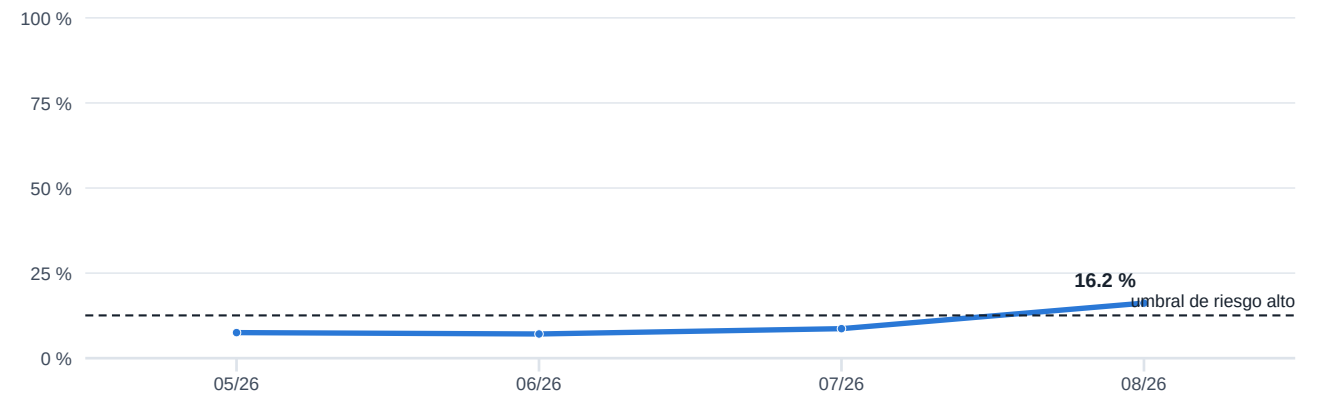

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.638
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.204
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.179
3 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.152
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.73 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.117
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.109
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.100
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,300,106	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.090

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	16.2 %	16.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 118 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

RESPECTO AL ASIENTO 117: RESPECTO AL ASIENTO N° 117 DEL RESIDENTE DE OBRA, LUEGO DE REVISAR LOS PLANOS PG – 01, PD – 01 Y LOS RESPECTIVOS METRADOS ESTA SUPERVISIÓN ACLARA AL CONTRATISTA QUE DEBERÁ EJECUTAR LAS RAMPAS PARA DISCAPACITADOS SEGÚN DETALLES DEL PLANO PD – 01, TENIENDO EN CUENTA QUE SE DEBERÁ MANTENER EMPLAZAMIENTOS Y UBICACIONES INDICADOS EN EL PLANO PG-01, POR LO CUAL SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA ELABORA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 120 · Órdenes · SOEC_SPV · 24/08/2026

...la subsanacion tecnica inmediata antes de la ejecucion de las partidas consecuentes, quedando todas estas acciones bajo la exclusiva responsabilidad del contratista ante cualquier defecto posterior o retraso en el cronograma de ejecucion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 120 · Órdenes · SOEC_SPV · 24/08/2026

RESPECTO A ACOLCHONAMIENTO DE SUBBASE EN ZONAS PUNTUALES: En cumplimiento de las funciones de control y aseguramiento de la calidad del proyecto, esta Supervisión constató el viernes 21/08/2026 la presencia de fallas por acolchonamiento focalizado (inestabilidad estructural por exceso de humedad o deficiente energía de compactación) en la capa de subbase de la obra, cuyas áreas afectadas se encuentran delimitadas det...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 110 · Órdenes · SOEC_SPV · 17/08/2026

RETIRO DE MATERIAL INADECUADO POR ACOLCHONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN CALLE ANDALUCÍA CDRA. 1: Durante los trabajos de inspección el sábado 15 de agosto del presente año, en la Calle Andalucía Cuadra 1, se verificó que el material de relleno (capa de arenilla y over / piedra base para pavimento) presenta acolchonamiento en un sector de la vía, evidencia de la inestabilidad e inadecuadas condiciones de con...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 110 · Órdenes · SOEC_SPV · 17/08/2026

...s.se prohíbe dar continuidad a los trabajos en dicha area hasta que la supervision verifique y apruebe la ejecucion de los trabajos antes mencionados.se deja constancia en el presente asiento que las demoras y/o retrasos generados por la subsanacion de esta observacion seran de responsabilidad del contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 107 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO 105: En respuesta al asiento 105 del Residente de Obra, esta Supervisión manifiesta lo siguiente: Las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico Aprobado forman parte del contrato y de los documentos obligatorios de ejecución. Dichas especificaciones definen los requisitos de calidad y los ensayos mínimos necesarios para la aceptación de la partida "CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR E=20cm, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 95 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 01/08/2026

... al contratista a presentar el expediente de valorizacion completo con la documentacion de soporte obligatoria (planos de metrados, panel fotografico, ensayos de control de calidad, etc.) para evitar retrasos en el proceso de aprobacion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 84 · Órdenes · SOEC_SPV · 22/07/2026

OBSERVACIÓN PARCIAL DE MATERIAL OVER EN SUBRASANTE Y EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO GRANULOMÉTRICO: Se realiza la inspección técnica de campo en los trabajos de la partida 02.02.03.01. MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER Ø 4" AL 6", en la Calle Juan Fanning (entre Calle Oriente y Av. Quiñonez). Al respecto, esta Supervisión constató in situ mediante control métrico con flexómetro que una parte del material colocado por el...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 75 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/07/2026

ASIENTO 75 TRABAJOS EJECUTADOS: Se ha verificado en campo la ejecución simultánea de las partidas de Excavación masiva con máquina a nivel de sub rasante y Eliminación de desmonte, (del asiento 73). Los volúmenes estimados por el contratista 2 500 m3 y 3250 m3 respectivamente) concuerdan visualmente con el avance en los frentes de trabajo, los cuales serán validados de forma exacta en la correspondiente valorización...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
