


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación de la ejecución de la obra ¿creación del servicio de movilidad urbana en las calles de la UV. Gonzales prada del distrito de ferreñafe de la provincia de ferreñafe del departamento de lambayeque¿, con CUI N°2629720.

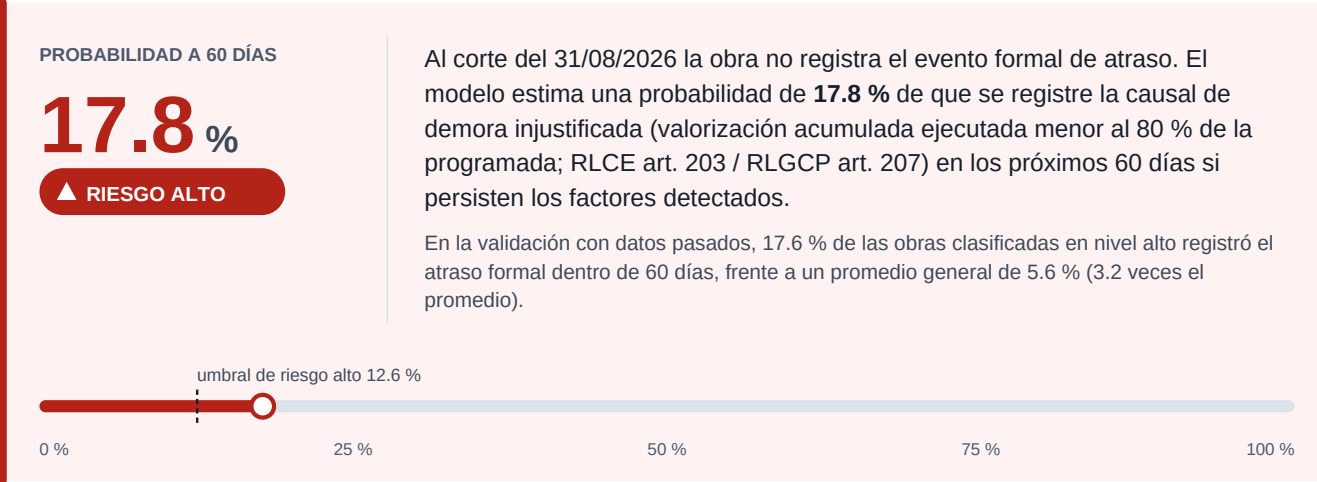


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	28 desde 04/08/2026	27/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LA UV. GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE FERREÑAFE DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE¿, CON CUI N°2629720.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE
Contratista	CONSORCIO 4 CAT
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	FERREÑAFE / FERREÑAFE / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2629720
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EN LAS CALLES DE LA U.V GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE FERREÑAFE DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2407060
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,793,496.72
Cuaderno de obra digital	28 asientos entre 04/08/2026 y 27/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

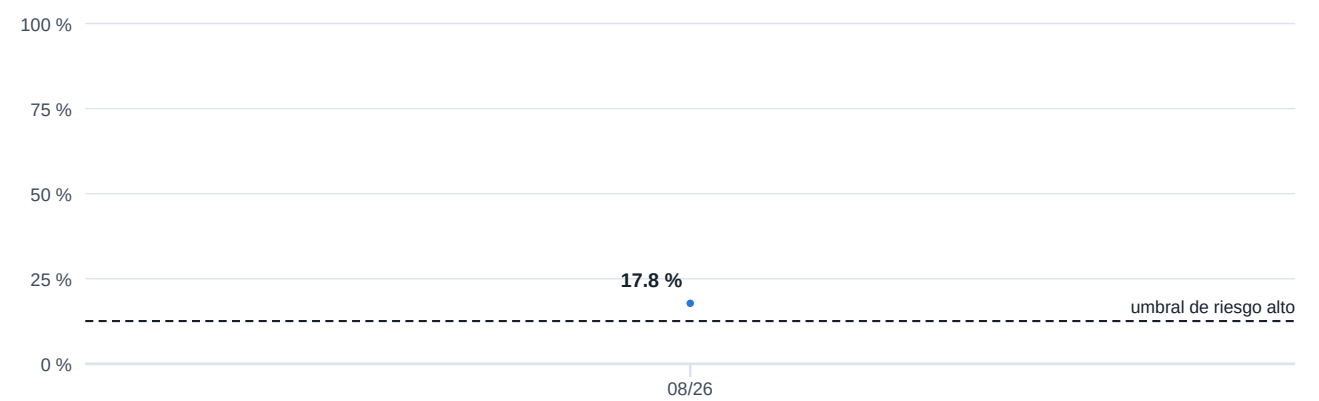

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.631
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.249
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.222
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.187
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.111
El último asiento se registró hace 4 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.091
Extensión media de los asientos recientes: 1,531 caracteres	Contenido de los asientos		-0.074
Hubo registros en el cuaderno 14 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.057

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	17.8 %	17.8 %	-0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	17.8 %	17.8 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	17.8 %	17.8 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 24 · Administración de riesgos · SOEC_INSP · 26/08/2026

...ra sera considerado como una partida ejecutada sin autorizacion, quedando su reconocimiento sujeto a la evaluacion tecnica y contractual correspondiente. de ser el caso, se procedera a determinar las penalidades, responsabilidades y/o acciones administrativas y contractuales que correspondan, conforme a las condiciones establecidas en el contrato y la normativa aplicable... (continua).

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 26 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...es publicas). se precisa que esta omision acumulada de respuestas afecta directamente la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente (calendario cpm), imposibilitando la ejecucion normal y retrasando de forma continua los frentes de trabajo de las siguientes partidas criticas de veredas:

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 27 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...figuracion de vencimiento de plazos legales . item 4.1.1: excavacion con maquinaria en terreno normal (veredas, rampas y martillos) (programada de 26 dias, del 13/08/26 al 07/09/26), la cual presenta atraso real.item 4.1.2: perfilado y compactado de subrasante (programada de 32 dias, del 15/08/26 al 15/09/26).item 4.1.3: capa base e=0.10m (mat. granular), cbr > 30% (programada de 38 dias, del 19/08/26 ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 26 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...dario que la ley le otorga al proyectista para pronunciarse tecnico-legalmente. vencimiento de obligacion directa de la entidad: habiendo vencido el plazo del proyectista sin respuesta, la entidad ha incumplido su obligacion legal de absolver la consulta de oficio y emitir instrucciones directas a traves del supervisor. por tanto, ante esta evidente inaccion y al no contar con la definicion tecnica indis...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 22 · Consultas · SOEC_RESI · 22/08/2026

ACLARACIÓN TÉCNICA: ASIENTO N° DEL RESIDENTE DE OBRA, Fecha: sábado, 22 de agosto de 2026.De conformidad con lo establecido en el Artículo 190, numeral 190.1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante el presente asiento el Residente de Obra formula una consulta de carácter técnico dirigida a la Supervisión respecto a una incongruencia documental detectada en el Expediente Técnico, especifica...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 16 · Consultas · SOEC_INSP · 13/08/2026

PRONUNCIAMIENTO DE LA INSPECCIÓN SOBRE LAS CONSULTAS TÉCNICAS N.° 01 Y N.° 02: En atención al Asiento N.° 15 del Residente de Obra, mediante el cual solicita pronunciamiento respecto de las Consultas Técnicas N.° 01 y N.° 02, esta Inspección deja constancia de lo siguiente:Respecto de la Consulta Técnica N.° 01, el propio Residente señala expresamente que la consulta se encuentra vinculada a una posible modificación ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 15 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

... y consulta tecnica n 02 (asiento n 12 y 13 del 8 de agosto), referida a las deficiencias del expediente e incompatibilidad geometria asimetrica de las veredas proyectadas en el plano pj-01.alerta de retraso: se advierte a la inspeccion que la indefinicion tecnica sobre el trazo y replanteo definitivo de las veredas esta impidiendo el avance normal de las cuadrillas de excavacion y perfilado. de mantene...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 4 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 05/08/2026

EJECUCIÓN DE PARTIDAS PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y SOLICITUD DE VERIFICACIÓN: Se deja constancia que, previo al inicio de la jornada laboral, se realizó la respectiva charla de seguridad (charla de 5 minutos) dirigida a todo el personal técnico y obrero. Se incidió en la identificación de peligros y prevención de riesgos en los frentes de trabajo de demolición y movimiento de tierras, así como en el uso obligatorio y...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
