

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento de los servicios del centro de salud estrategico simon bolivar categoria I-4 red de salud puno, distrito de puno provincia de puno-region puno

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

14.8 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **14.8 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	40 desde 21/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO SIMON BOLIVAR CATEGORIA I-4 RED DE SALUD PUNO, DISTRITO DE PUNO PROVINCIA DE PUNO-REGION PUNO
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR SIMON BOLIVAR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PUNO / PUNO / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2357089
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD ESTRATÉGICO SIMÓN BOLÍVAR CATEGORÍA I-4 RED DE SALUD PUNO, DISTRITO PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGIÓN PUNO¿ DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2392855
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 20,930,372.80
Cuaderno de obra digital	40 asientos entre 21/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

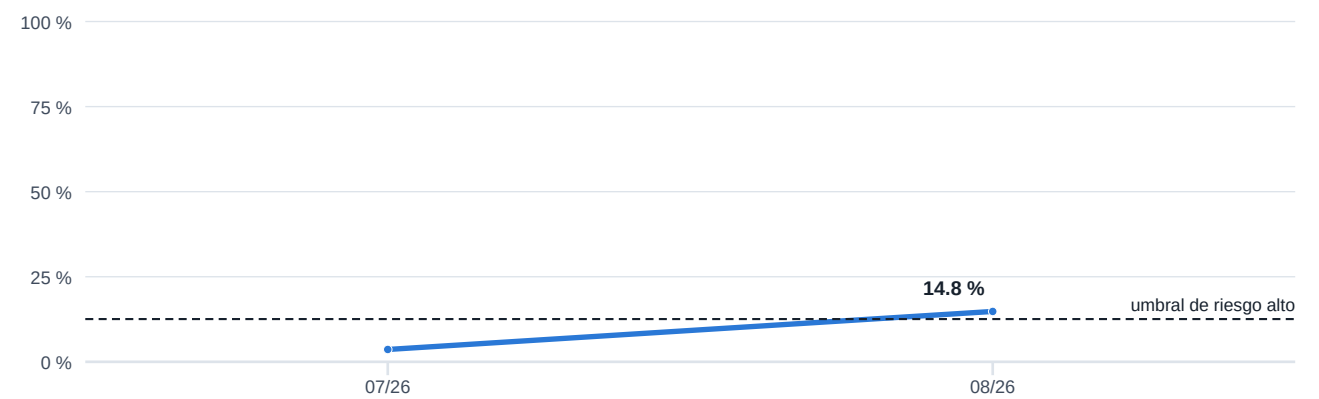

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.644
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.282
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.272
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 16,212,318	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.143
2 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.132
Departamento: Puno	Características de la obra		-0.128
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
Gasto devengado en lo que va del año: S/ 16,212,318	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.106

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	14.8 %	14.6 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 27 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 25/08/2026

APLICACIÓN DE PENALIDADES: CON FECHA 24/08/2026 SE REMITIO AL GORE PUNO POR TRAMITE VIRTUAL EL PRONUNCIAMIENTO Y LA APLICACION DE LA PENALIDAD AL CONSORCIO EJECUTOR SIMON BOLIVAR, POR DEMORA EN LA PRESENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CONCORDANCIA AL CONTRATO N 013-2025-LP-GR PUNO ART. DECIMO QUINTO: PENALIDADES: OTRAS PENALIDADES, SUPUESTO 10, POR NO ENTREGAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026

... imprecision en la referencia al contrato n. 013-2025-lp-gr puno, debiendo verificarse la correcta identificacion del instrumento contractual aplicable. se adjunta carta 016 _improcedencia de supuesta demora y aplicacion de otras penalidades por lo expuesto, el contratista deja expresa reserva de presentar los descargos y medios de sustento correspondientes, no otorgando conformidad a la pretendida penal...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 27 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 25/08/2026

aplicacion de penalidades . con fecha 24/08/2026 se remitio al gore puno por tramite virtual el pronunciamiento y la aplicacion de la penalidad al consorcio ejecutor simon bolivar, por demora en la presentacion del plan de seguridad y salud en el trabajo en concordancia al contrato n 013-2025-lp-gr puno art. decimo quinto: penalidades: otras penalidades, supuesto 10, por no entregar e imp...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026

absolucion al asiento n. 25 y 27 aplicacion de penalidades . en atencion al asiento n 25 y 27 del supervisor, el suscrito deja constancia y solicita la reconsideracion de la pretendida penalidad y que, el contratista no reconoce ni acepta la aplicacion aut...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 27 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 25/08/2026

aplicacion de penalidades . con fecha 24/08/2026 se remitio al gore puno por tramite virtual el pronunciamiento y la aplicacion de la penalidad al consorcio ejecutor simon bolivar, por demora en la presentacion del plan de s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 20/08/2026

APLICACIÓN DE PENALIDADES: CON FECHA 18/08/2026 SE REMITIO AL GORE PUNO TRAMITE VIRTUAL LE PRONUNCIAMIENTO Y LA APLICACION DE LA PENALIDAD AL CONSORCIO EJECUTOR SIMON BOLIVAR, POR LA DEMORA EN LA PRESENTAR EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO A LA FECHA DEL INICIO DE OBRA Y PROGRAMA CPM.EN CONCORDANCIA AL REGLAMENTO DE LA LEY 32069 LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS ART. 207 MONITOREO Y CONTROL DE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 20/08/2026

aplicacion de penalidades . con fecha 18/08/2026 se remitio al gore puno tramite virtual le pronunciamiento y la aplicacion de la penalidad al consorcio ejecutor simon bolivar, por la demora en la presentar el calendario de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Aplicación de penalidades · SOEC_SPV · 20/08/2026

aplicacion de penalidades . con fecha 18/08/2026 se remitio al gore puno tramite virtual le pronunciamiento y la aplicacion de la penalidad al consorcio ejecutor simon bolivar, por la demora en la presentar el calendario de avance de obra valorizado actualizado a la fecha del inicio de obra y programa cpm.en concordancia al reglamento de la ley 32069 ley general de contrataciones publicas...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 24 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

PRESENTACION DE DOCUMENTOS AL GORE PUNO: ...VIENECON CARTA N° 0028-2026/CCL/RC, EXP: 2026-OGDYAC-0020523, DE FECHA 10/08/2029, SE PRESENTA EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DEMORA EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA CON CARTA N° 0032-2026/CCL/RC, EXP: 2026-OGDYAC-0020538, DE FECHA 10/08/2029, SE PRESENTA EL PRONUNCIAMIENTO, L...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
