


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de práctica deportiva y/ o recreativa en asociación asentamiento humano villa al sur distrito de chilca de la provincia de cañete del departamento de lima

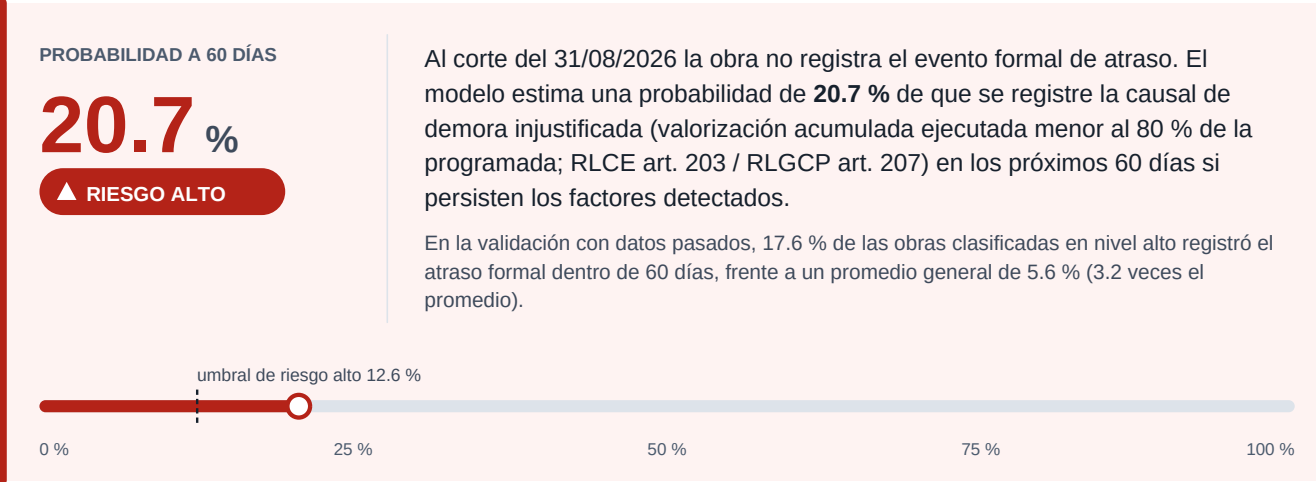


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	125 desde 06/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/ O RECREATIVA EN ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO VILLA AL SUR DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CANETE
Contratista	CONSORCIO CHILCA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHILCA / CAÑETE / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2713102
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO VILLA AL SUR DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2403213
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,409,947.92
Cuaderno de obra digital	125 asientos entre 06/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

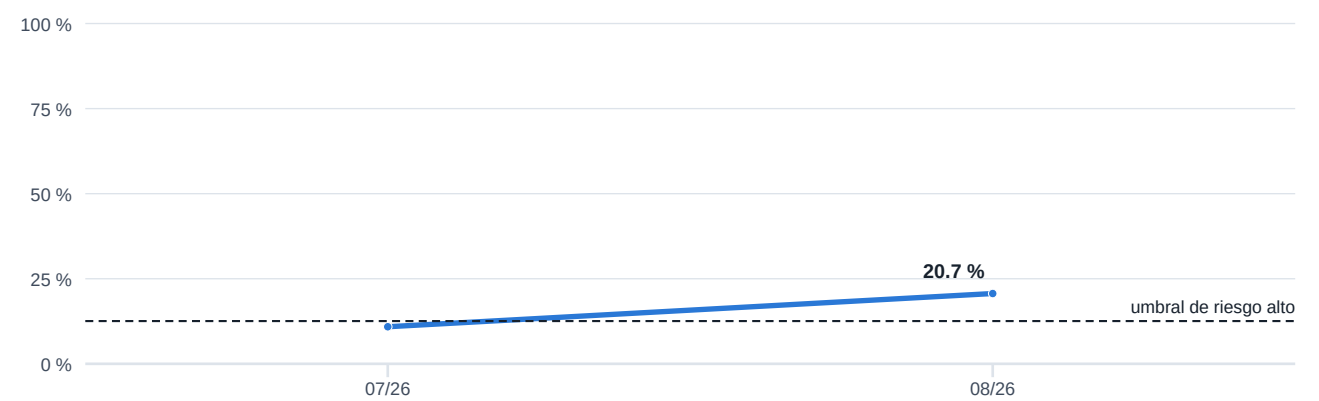

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.543
El 56 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.297
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.237
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.176
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.135
13 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.128
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.076

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	20.7 %	20.2 %	-0.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	20.7 %	20.7 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	20.7 %	21.1 %	+0.5 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 122 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...acion.finalmente, la toma de conocimiento del pronunciamiento no implica conformidad con todos sus fundamentos tecnicos ni renuncia a los derechos contractuales que pudieran corresponder respecto del atraso justificado, ampliacion de plazo y eventual suspension, los cuales seran sustentados conforme a la evolucion y acreditacion objetiva de la causal.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 115 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA COBERTURA: EN LA FECHA, LA SUPERVISIÓN REQUIERE AL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN, CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN, DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA COBERTURA, CONSIDERANDO QUE, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, EL INICIO DE DICHAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRA PRÓXIMO.EN TAL SENTIDO, EL CONTRATISTA DEBE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 115 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

... emitir oportunamente las precisiones o indicaciones que correspondan previas a la ejecucion.se reitera al contratista que la presentacion oportuna de esta documentacion resulta necesaria para evitar retrasos, restricciones o interrupciones en las partidas programadas, por lo que debera agotar las gestiones necesarias para contar con la informacion tecnica completa antes del inicio de los trabajos de la...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 114 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

...asimismo, se solicita que el contratista comunique los avances de los diferentes componentes del expediente, asi como cualquier aspecto tecnico que requiera coordinacion o definicion, a fin de evitar demoras en su presentacion y posterior evaluacion. la supervision, en el marco de sus funciones, realizara el seguimiento y las coordinaciones necesarias con la entidad y los profesionales que correspondan,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 112 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

atraso justificado . se deja constancia que, a la fecha, la obra presenta atraso tecnicamente justificado por causas no atribuibles al contratista, originado por las restricciones geotecnicas, estructurale...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 71 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 12/08/2026

EVALUACIÓN DE CONDICIONES GEOTÉCNICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: EN ESE SENTIDO, EL INFORME DEL ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS DEBERÁ SER COMPATIBILIZADO CON LA EVALUACIÓN DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, A FIN DE DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LAS CONDICIONES ENCONTRADAS Y, DE CORRESPONDER, PLANTEAR LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS PERTINENTES PARA SU SOLUCIÓN.ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ CONTENER EL SUSTENTO NECESARIO...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 37 · Órdenes · SOEC_SPV · 24/07/2026

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 2: SE COMUNICA AL RESIDENTE DE OBRA QUE, EN CASO SE ADVIERTA LA NECESIDAD DE EFECTUAR MODIFICACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBERÁ PRESENTAR OPORTUNAMENTE A LA SUPERVISIÓN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE SUSTENTE DICHAS VARIACIONES, A FIN DE VERIFICAR SU COMPATIBILIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA NORMATIVA VIGENTE Y...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
