


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de obra: Creacion del servicio de atención y promoción de las familias en el centro de desarrollo integral ubicado en ppnp sector b grupo residencial B1 mz F'1 - zona oeste, distrito de ventanilla - provincia constitucional del callao - departamento de callao con CUI N°2602827

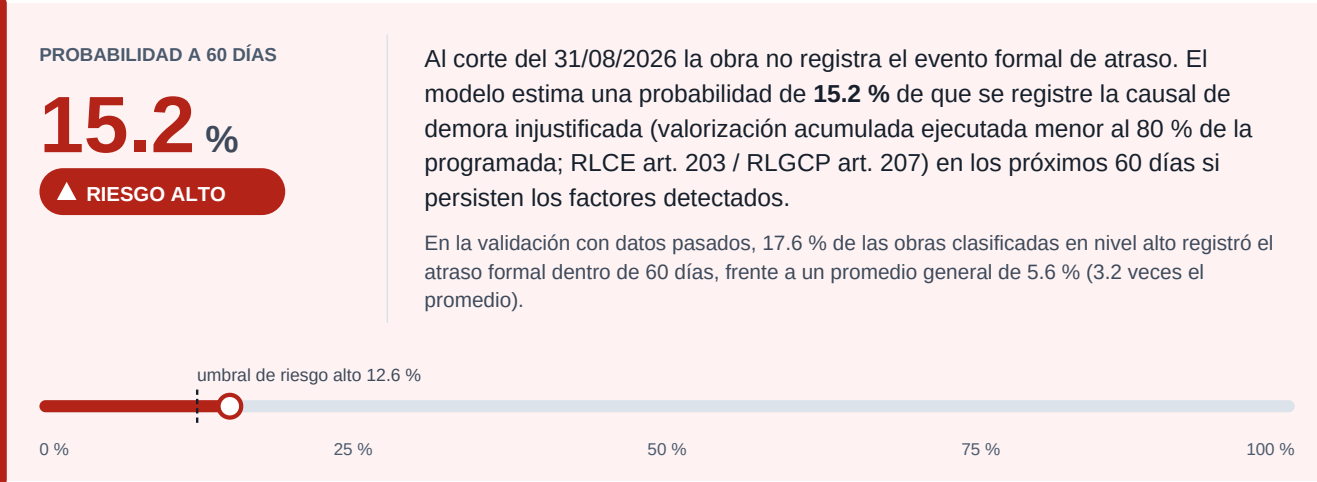


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	193 desde 29/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN PPNP SECTOR B GRUPO RESIDENCIAL B1 MZ F'1 - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO CON CUI N°2602827
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Contratista	ZRINCON CONSTRUCCIONES E.I.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VENTANILLA / CALLAO / CALLAO
Código Único de Inversión (CUI)	2602827
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN P. P. N. P. SECTOR B GRUPO RESIDENCIAL B1 MZ F1 - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO
Función	PROTECCIÓN SOCIAL
Identificador del contrato (SEACE)	2395883
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 7,000,000.00
Cuaderno de obra digital	193 asientos entre 29/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

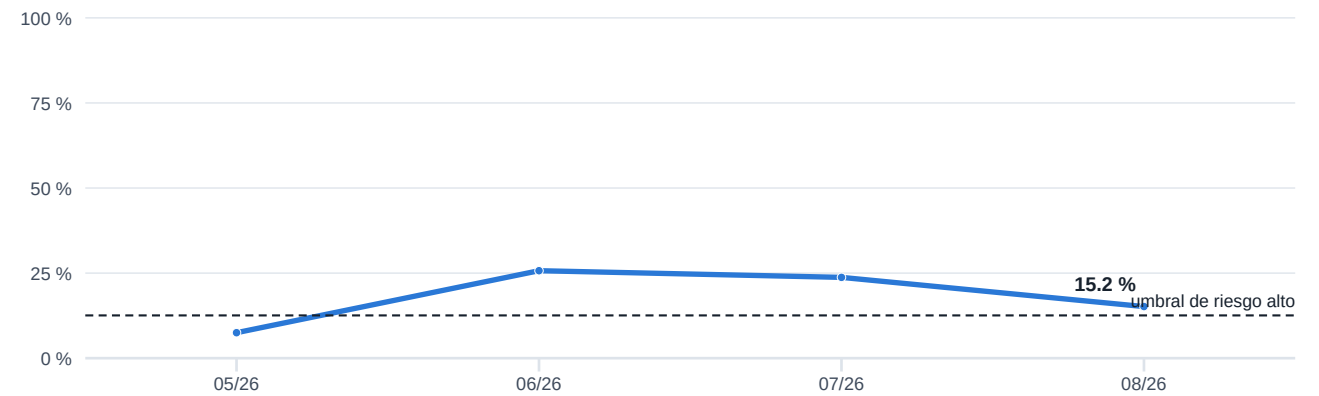

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.275
El 13 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.178
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.158
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.136
Departamento: Callao	Características de la obra		+0.130
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.124
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.108
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.099

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	15.2 %	15.0 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	15.2 %	15.4 %	+0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 191 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

..., debera considerarse la incidencia que pudiera corresponder a la aprobacion del adicional n. 01 con deductivo vinculante n. 01 de fecha 13 de agosto de 2026, diferenciando dicha circunstancia de los retrasos que pudieran resultar atribuibles al contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 191 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

identificacion de riesgos semana del 24 al 29 de agosto del 2026 . r2 riesgo de construccion (sobrecostos o sobreplazos): si se identifica. se advierte riesgo de incumplimiento del plazo contractual debido al menor avance de ejecucion respecto de lo programado en el cronograma acelerado aprobado con fecha 31 de julio de 2026. en tal sentido, corresponde efectuar el s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 186 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...modificaciones al expediente tecnico. r2 riesgo de construccion (sobrecostos o sobreplazos) no se identifica, toda vez que las actividades descritas corresponden a trabajos normales sin evidencias de retrasos o reprocesos. r3 riesgo de expropiacion de terrenos no se identifica, al no existir referencias a problemas de disponibilidad de areas. r4 riesgo geologico / geotecnico no se identifica, ya que las...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 186 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...go de interferencias / servicios afectados no se identifica, dado que no se reportan interferencias con redes existentes durante la ejecucion. r6 riesgo ambiental no se identifica, al no evidenciarse incumplimientos o afectaciones ambientales. r7 riesgo arqueologico no se identifica, al no reportarse hallazgos arqueologicos. r8 riesgo de permisos y licencias no se identifica, ya que no se mencionan restr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 170 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

...modificaciones al expediente tecnico. r2 riesgo de construccion (sobrecostos o sobreplazos) no se identifica, toda vez que las actividades descritas corresponden a trabajos normales sin evidencias de retrasos o reprocesos. r3 riesgo de expropiacion de terrenos no se identifica, al no existir referencias a problemas de disponibilidad de areas. r4 riesgo geologico / geotecnico no se identifica, ya que las...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 171 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/08/2026

identificacion de riesgos semana del 17 al 22 de agosto del 2026 . r2 riesgo de construccion (sobrecostos o sobreplazos): si se identifica. se advierte riesgo de incumplimiento del plazo contractual debido al menor avance de ejecucion respecto de lo programado en el cronograma acelerado aprobado con fecha 31 de julio de 2026. en tal sentido, corresponde efectuar el s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 170 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

...go de interferencias / servicios afectados no se identifica, dado que no se reportan interferencias con redes existentes durante la ejecucion. r6 riesgo ambiental no se identifica, al no evidenciarse incumplimientos o afectaciones ambientales. r7 riesgo arqueologico no se identifica, al no reportarse hallazgos arqueologicos. r8 riesgo de permisos y licencias no se identifica, ya que no se mencionan restr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 171 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/08/2026

..., debera considerarse la incidencia que pudiera corresponder a la aprobacion del adicional n. 01 con deductivo vinculante n. 01 de fecha 13 de agosto de 2026, diferenciando dicha circunstancia de los retrasos que pudieran resultar atribuibles al contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 117 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/07/2026**

cambio de residente de obra . en la fecha, 24 de julio de 2026, siendo las 17:40 horas, se deja constancia de que quien suscribe, ing. edgar rony miranda alarcon, ha tenido acceso al cuaderno de obra correspondiente al ...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 109 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 15/07/2026**

...e nuevamente el arqueologo durante las excavaciones y no hay vestigios a la fecha de ningun tipo.se esta haciendo trazo y replanteo topografico.se comunica que manana se cumple plazo de aprobacion de cambio de residente en concordancia con el art. 189 y el asiento de cuaderno de obra n96.se comunica que no hay a la fecha reportes de incidentes.

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 96 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 09/07/2026**

labores del 09 de julio 2026 . se continua las excavaciones masivas y eliminacion correspondiente.se comunica a la entidad en vias de regularizacion que se esta llevando a cabo un proceso de cambio de personal clave (residente de obra), presentado a la entidad por el contratista mediante carta n027-2026/consorcio-ejecutor-fortanova el 02 de julio, en concordancia con art. 189 del reglamento de la ley.se co...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 94 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/07/2026**

LABORES DEL 08 DE JULIO DEL 2026: EL DIA DE HOY, SE VERIFICA LA EJECUCION DE LA PARTIDA EXCAVACIONES MASIVAS. SE RECOMIENDA AL RESIDENTE AMPLIAR FRENTES DE TRABAJO.

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
