


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: Construcción del sistema de estabilización de suelos y taludes en zonas vulnerables de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza ¿ provincia de Chachapoyas ¿ región Amazonas

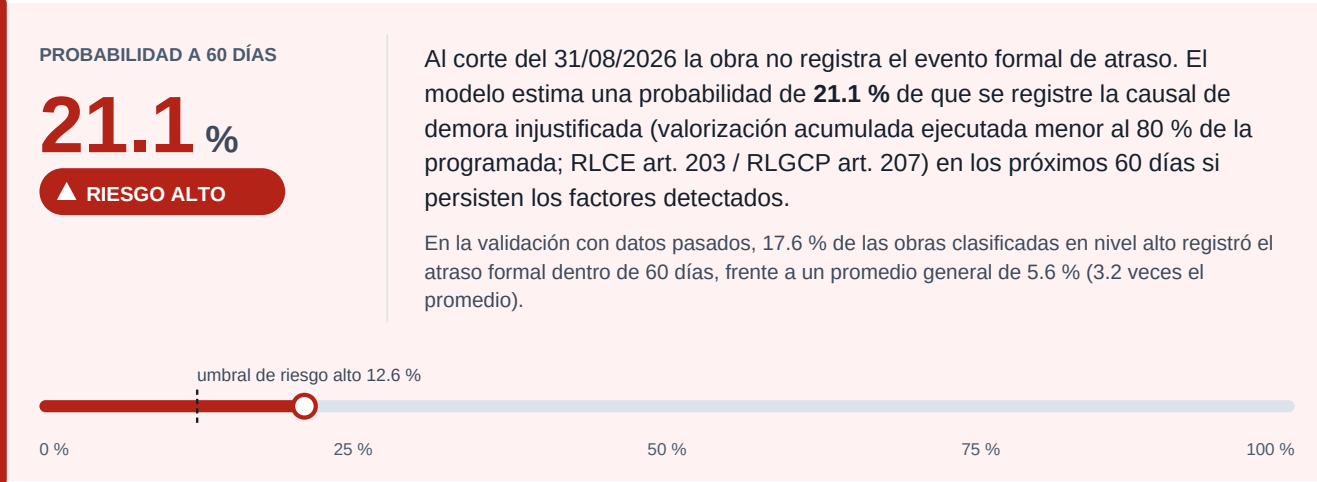


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	90 días	70 desde 11/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	Ejecución de la obra: Construcción del sistema de estabilización de suelos y taludes en zonas vulnerables de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza ¿ provincia de Chachapoyas ¿ región Amazonas
Entidad contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
Contratista	ENGINEERING BUILD S.A.C
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS / AMAZONAS
Código Único de Inversión (CUI)	2264055
Inversión asociada	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ESTABILIZACION DE SUELOS Y TALUDES EN ZONAS VULNERABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2404065
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 5,953,715.00
Cuaderno de obra digital	70 asientos entre 11/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

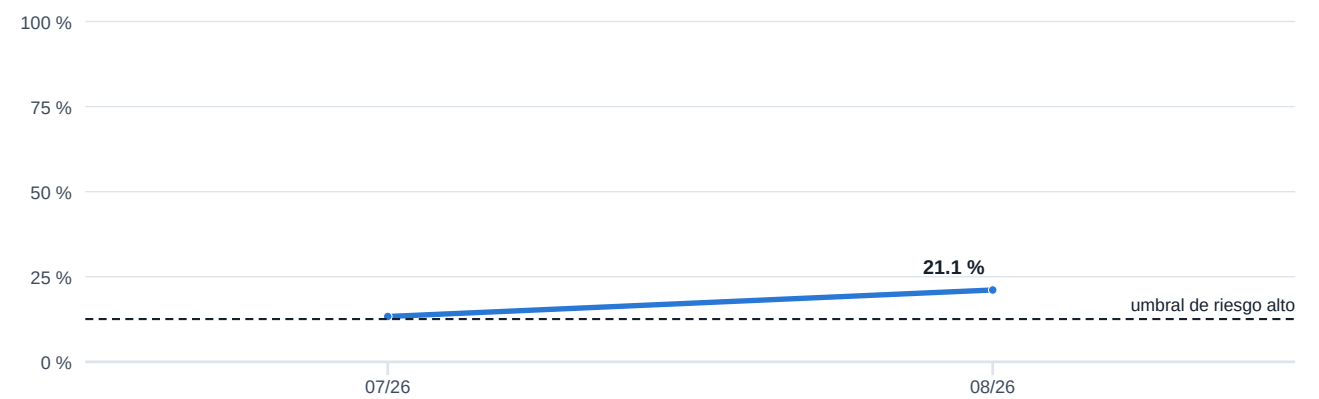

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.600
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.221
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.218
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.155
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.124
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.122
Hubo registros en el cuaderno 26 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.110
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.109

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	21.1 %	21.5 %	+0.4 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 61 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 22/08/2026

sistema de drenaje no previsto (prog. 0+3800+560) y terreno inestable para cimentacion de cerco perimetrico (prog. 0+594.800+649.50) . en cumplimiento del ítem n06 del cuadro de otras penalidades (clausula decimo tercera del contrato n34-2026-untrm/dga/uaba) y del articulo 190 del reglamento de la ley n32069, se efectua el registro de evaluacion de gestion de riesgos, en seguimiento a lo co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 47 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 17/08/2026

EVALUACIÓN SEMANAL Y CONTINUIDAD DE INTERVENCIÓN EN ZONA COLISEO Y PROG. 0+380–0+560: En cumplimiento del ítem N°06 del Cuadro de Otras Penalidades del Contrato N°34-2026-UNTRM/DGA/UABA, de la evaluación semanal de gestión de riesgos correspondiente. Se ratifica lo reportado en los Asientos N°29 (01/08/2026) y N°37 (08/08/2026). La solución técnica a las condiciones queda supeditada a la formulación de lo establecido...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 47 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 17/08/2026

evaluacion semanal y continuidad de intervencion en zona coliseo y prog. 0+3800+560 . en cumplimiento del ítem n06 del cuadro de otras penalidades del contrato n34-2026-untrm/dga/uaba, de la evaluacion semanal de gestion de riesgos correspondiente. se ratifica lo reportado en los asientos n29 (01/08/2026) y n37 (08/08/2026). la solucion tecni...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 37 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 08/08/2026

evaluacion semanal y continuidad de intervencion en zona coliseo y prog. 0+3800+560 . se deja constancia, en cumplimiento del ítem n06 del cuadro de otras penalidades (clausula decimo tercera del contrato n34-2026-untrm/dga/uaba), de la evaluacion semanal de gestion de riesgos correspondiente. se ratifica lo reportado en los asientos n12 (18/07/2026), n22 (25/07...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Consultas · SOEC_RESI · 05/08/2026

...n a la fecha es ajena a la voluntad del contratista, requiriendose la autorizacion expresa de la entidad, solicitando el pronunciamiento respectivo dentro lo previsto en la normativa, a fin de evitar atrasos en la ejecucion de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Consultas · SOEC_RESI · 05/08/2026

CONSULTA SOBRE LA FACTIBILIDAD DE INTERVENCION EN TALUDES DE OBRA LABORATORIOS DE CIENCIAS FORESTALES PARA EJECUCION DE PARTIDA 1.4 ESCALINATA.: Se hace constar a la Inspectora de Obra que, según asiento N° 17 del Residente de fecha 21/07/2026 y con asiento N° 25 (30/07/2026), se comunicó la Interferencia (Restricción de avance de obra en Hito de la partida 1.4 Escalinata), tal como se hace constar en el Informe de Re...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 29 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 01/08/2026

...ueridas: se solicita a la inspectora de obra tramitar de forma prioritaria ante la entidad una solucion tecnica integral (ampliacion de drenaje o rediseño) para mitigar riesgos de falla estructural y retrasos en el cronograma, conforme a los mecanismos de administracion de riesgos del contrato y el rlgc.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/07/2026

AVANCE DE OBRA - PRESENTACION DE FICHA TECNICAS: 01. AVANCES DE OBRA:- Previa a las actividades programadas, la Especialista en Seguridad, impartió la respectiva Charla de Seguridad y Salud en el Trabajo, con participación del personal de obra y el correspondiente examen médico ocupacional.- Continúa las actividades de desmontajes de muros de gaviones, demoliciones de cerco perimétrico y la eliminación con maquinaria...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 20/07/2026

de las actividades - cambio personal clave y presentacion documentaria . que, habiendo sido notificada la carta n 0668-2026-untrm-r/dga al contratista respecto al cambio de personal clave, dandose el cambio del residente de obra, tal que a partir del 18/07/2026 asume la residencia el ing. alvarado cardenas, luis, presentando a la inspeccion la documentacion en cumplimiento del c...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
