


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra ¿mejoramiento de la infraestructura en la institucion educativa nº 86094 del centro poblado de quenuayoc del distrito de independencia provincia de huaraz, departamento de ancash¿ ¿ i etapa con CUI: 2535785

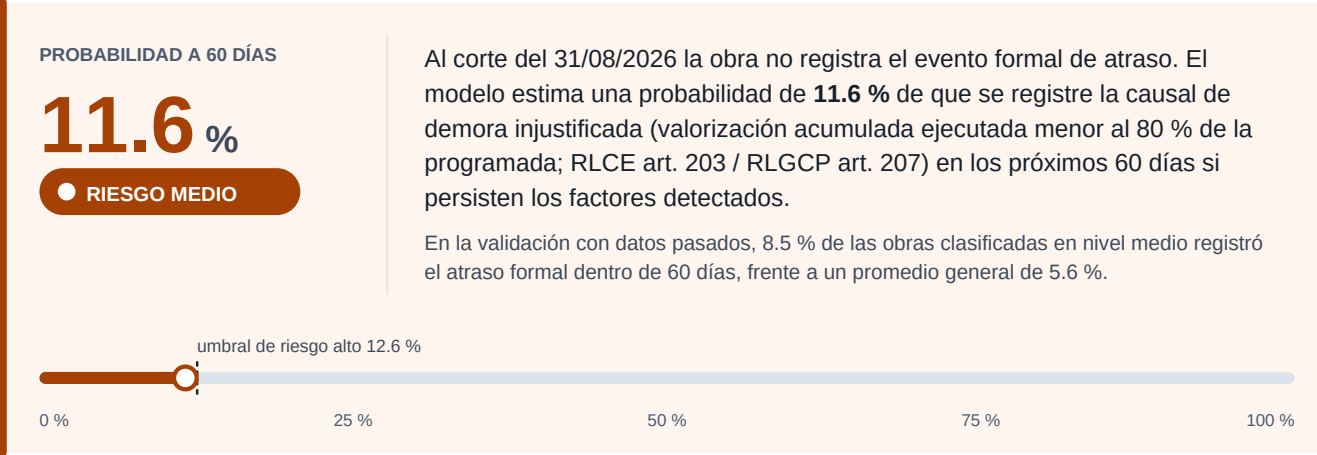


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 1,756,060.00	120 días	112 desde 24/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86094 DEL CENTRO POBLADO DE QUENUAYOC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ ¿ I ETAPA CON CUI: 2535785
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ
Contratista	CONSORCIO QUENUAYOC
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	INDEPENDENCIA / HUARAZ / ANCASH
Código Único de Inversión (CUI)	2535785
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°86094 DEL CENTRO POBLADO DE QUENUAYOC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2371889
Monto del contrato	S/ 1,756,060.00
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,379,981.70
Cuaderno de obra digital	112 asientos entre 24/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

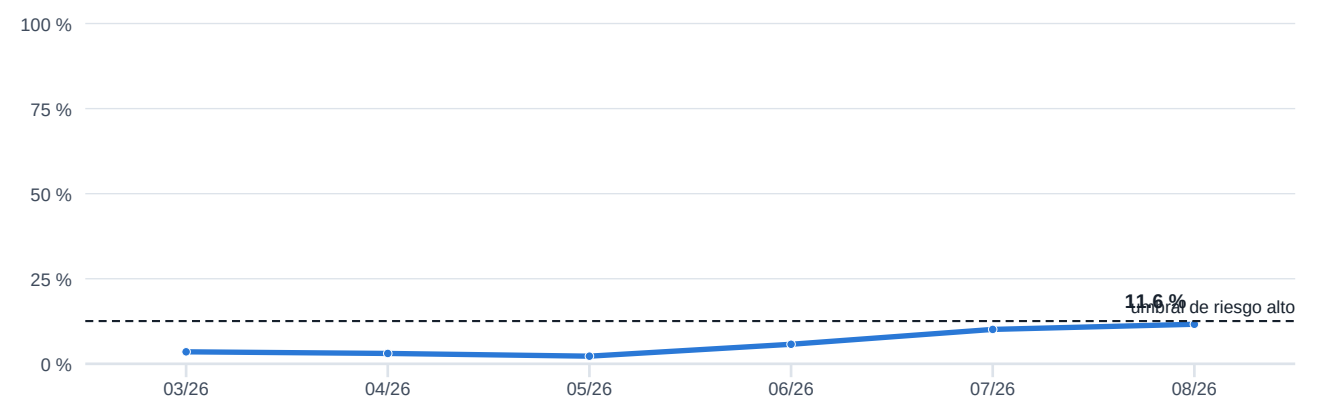

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.542
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.238
3 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.169
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.103
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.093
Hubo registros en el cuaderno 20 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.072
Extensión media de los asientos recientes: 1,373 caracteres	Contenido de los asientos		-0.064
Ha transcurrido el 133 % del plazo original	Datos del contrato		-0.055

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.6 %	11.6 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.6 %	11.6 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 107 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

... pendiente de atención, se recomienda al contratista presentar a la brevedad el planteamiento técnico y la propuesta de solución correspondiente, precisando el plazo de ejecución, a fin de no generar retrasos en el cronograma de obra ni afectar las partidas subsiguientes vinculadas a dicho sistema.3. colocación adecuada del acero longitudinal en vigas de primer nivel se recomienda al contratista verifica...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 104 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

observación por atraso en la ejecución de obra de las partidas de adicional n 01 . continúa el asiento anterior solicitud de la supervisión: en atención a lo expuesto, y a fin de revertir el atraso detectado principalmente...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 103 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

observación por atraso en la ejecución de obra de las partidas de adicional n 01 . habiéndose contrastado el avance físico reportado en el asiento n 102 del residente de obra, de fecha 17/08/2026, con el cronograma valor...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 93 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

RECOMENDACIONES GENERALES, Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA: Se reitera, en el marco de las verificaciones realizadas en campo, ha constatado que el personal obrero y técnico destacado actualmente por el Contratista CONSORCIO QUENUAYOC resulta insuficiente para atender de manera simultánea la totalidad de los frentes de trabajo activos, evidenciándose un notorio rezago en la ejecución de las Obras Exteriores y del Bloqu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 93 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

... al contratista que, de persistir la insuficiencia de personal advertida en dichos frentes y no adoptarse las medidas correctivas señaladas, dicha situación será considerada como causal generadora de atraso en la ejecución de la obra, atribuible al contratista, dejándose expresa constancia para los efectos contractuales, administrativos y de control que correspondan, conforme a lo establecido en la ley...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 92 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

RECOMENDACIONES GENERALES: Se recomienda dar cumplimiento a la Norma E.060 "Concreto Armado" del RNE, en lo referente a tolerancias dimensionales, rigidez y estanqueidad del encofrado, así como al tiempo mínimo de desencofrado según el elemento estructural, a fin de garantizar la calidad superficial y estructural del concreto a vaciar. Se recomienda dar cumplimiento a la Norma E.060 "Concreto Armado" en cuanto a recub...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 91 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

REQUERIMIENTO DE AUMENTO DE PERSONAL: La Supervisión, en el marco de las verificaciones realizadas en campo, ha constatado que el personal obrero y técnico destacado actualmente por el Contratista CONSORCIO QUENUAYOC resulta insuficiente para atender de manera simultánea la totalidad de los frentes de trabajo activos, evidenciándose un notorio rezago en la ejecución de las Obras Exteriores y del Bloque 2 (SS.HH.), fr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
