


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

CONCURSO OFERTA: Contratación del servicio de un contratista, para la elaboración de las prestaciones pendientes del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, y Ejecución de Obra bajo la modalidad de Diseño y Construcción con Estudio Básico de Ingeniería para el Proyecto con CUI N°2396141

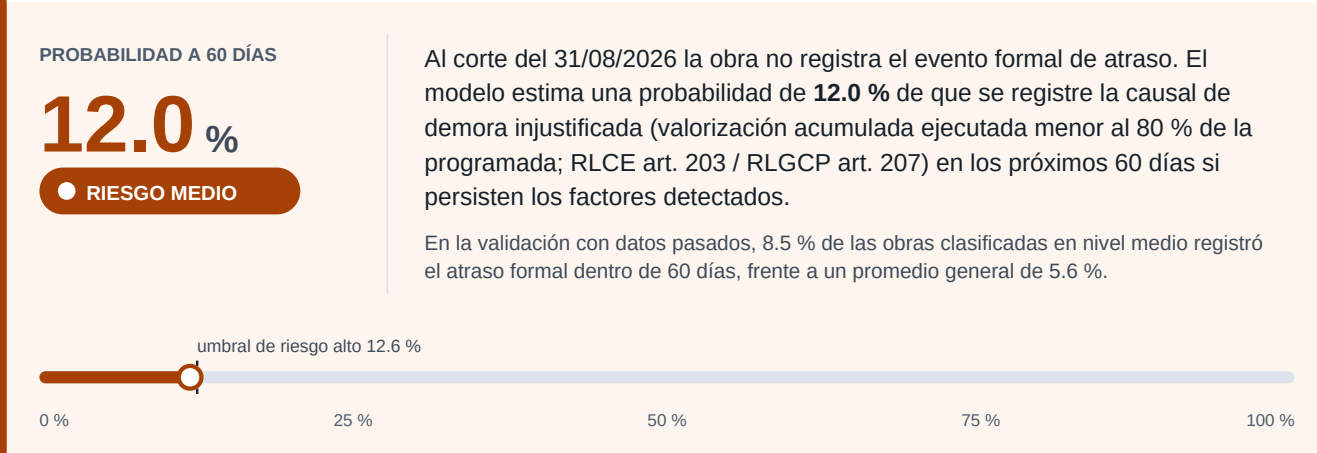


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	39 desde 09/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONCURSO OFERTA: Contratación del servicio de un contratista, para la elaboración de las prestaciones pendientes del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, y Ejecución de Obra bajo la modalidad de Diseño y Construcción con Estudio Básico de Ingeniería para el Proyecto con CUI N°2396141
Entidad contratante	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Contratista	JAGUI S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2396141
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387 Y 388 DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2237961
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 71,195,000.00
Cuaderno de obra digital	39 asientos entre 09/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

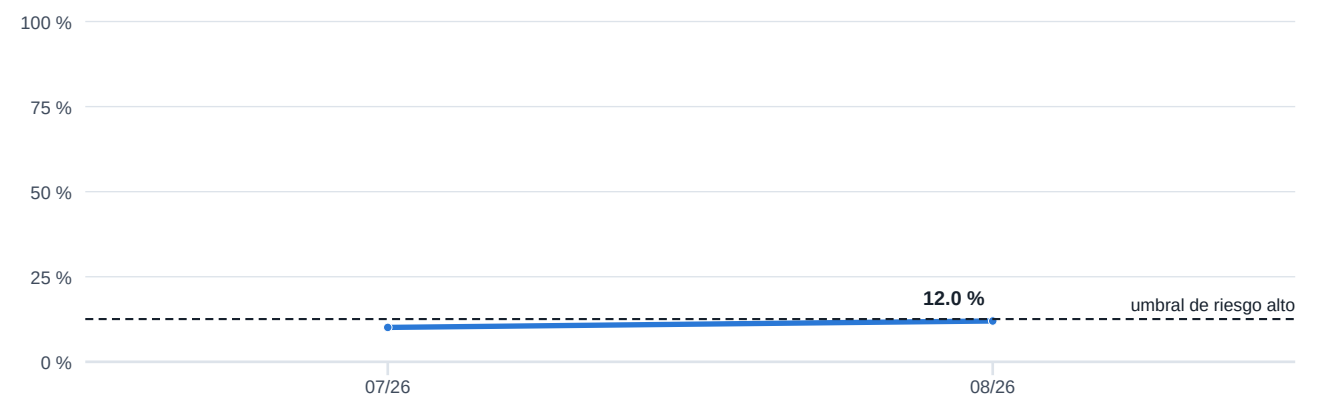

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.555
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.179
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.162
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.160
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.72 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.107
Entidad contratante: programa nacional	Características de la obra		+0.103
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.092

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 38 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 27/08/2026

...en asiento cod no 37. impidiendonos realicemos los trabajos indicados. solicitamos la verificacion y constatacion de parte de la supervision de la situacion presentada. ya que este hecho nos ocasiona retraso la ejecucion de los trabajos, donde se verian afectados 73 beneficiarios de la asociacion de vivienda residencial santa teresa s-362. por lo que solicitamos su pronunciamiento de la supervision al r...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/08/2026

... de los asientos 33 y 34 del contratista, la supervision ha venido verificando los trabajos de topografía, sin embargo, del avance que viene mostrando el contratista se evidencia que esta entrando en retraso en la partida 06.02.01.01 trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estacion total y 06.01.01.09 pique exploratorio para verificación de interferencia, por tal razón se invoca al...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 30 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

REITERA LA NECESIDAD DE EFECTUAR EL DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO, ELÉCTRICO Y ACCESORIOS EXISTENTES EN EL RESERVORIO RP-02A: En atención al Asiento N.º 28 de fecha 10/08/2026, mediante el cual el Contratista reitera la necesidad de efectuar el desmontaje del equipamiento hidráulico, eléctrico y accesorios existentes en el reservorio RP-02A, previo al inicio de los trabajos de demolición de las estructuras de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Órdenes · SOEC_RESI · 10/08/2026

REITERAMOS SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO PARA INICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN COORDINACION CON SEDAPAL E INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE Cº EXISTENTE: Tal como indicamos en nuestra Carta N.º 012-2026-CI/OBRA-RO de fecha 21.07.2026 dirigida al Ing. Edwin Richard Tapia Ramos del OBRAS-PASLC. Ya que Para iniciar los trabajos de Demolición de estructuras de concreto existentes en RP-02A, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 19 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026

infraccion por incumplir con su obligacion de ejecutar la prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido . en los terminos de referencia (tdr) del contratista, su representada no ha venido incumpliendo con ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 18 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026

infraccion por la no presentacion de los informes semanales . a la fecha de hoy 23.07.2026 el contratista viene incumpliendo con la presentacion oportuna de los informes semanales, esta infraccion esta contemplada en los terminos de referencia (11.3.19.2 otras penalidades), en el supuesto de penalidad n18las reuniones...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026

...raccion por la no implementacion de los carteles de identificacion de obra. . en fecha 23.07.2026 la supervision ha detectado una infraccion contemplada en los terminos de referencia (11.3.19.2 otras penalidades), debido a que su representada no ha venido cumpliendo con la totalidad de la implementacion de los carteles de identificacion de obra.dichos carteles de identificacion de obra no estan implementad...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 15 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 23/07/2026

RESPECTO DEL PLAN DE TRABAJO: Respecto del PLAN DE TRABAJO, se le recuerda al contratista que según los términos de referencia Ítem 11.6 (PROCESOS DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE OBRA), e Ítem 11.6.6 (Del Plan de Trabajo General), entre otro se señala lo siguiente: "Se deberá presentar un Plan de trabajo y un Diagrama Gantt, hasta quince (15) días calendario después del inicio del plazo contractual, donde se desarrolle ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/07/2026

RESPECTO DE LOS ASIENTOS N.º 7 Y 9: Respecto del asiento N.º 7 (del residente de obra), en fecha 14.07.2026 la supervisión mediante CARTA N.º 002-2026/CSPP-RPMA, ha solicitado los anexos del PASLC (Formatos para el desarrollo de las actividades) a la entidad, al día de hoy no se tiene respuesta alguna, sin embargo, nuestro profesional del área social viene haciéndole seguimiento y apenas se tenga respuesta a lo solicitado...

Fuente: cod-asientos202607.csv

05 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
