


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Saldo de obra paralizada de la etapa i y etapa ii del proyecto: Rehabilitación y ampliación integral del establecimiento penitenciario de pucallpa con CUI N° 2114085

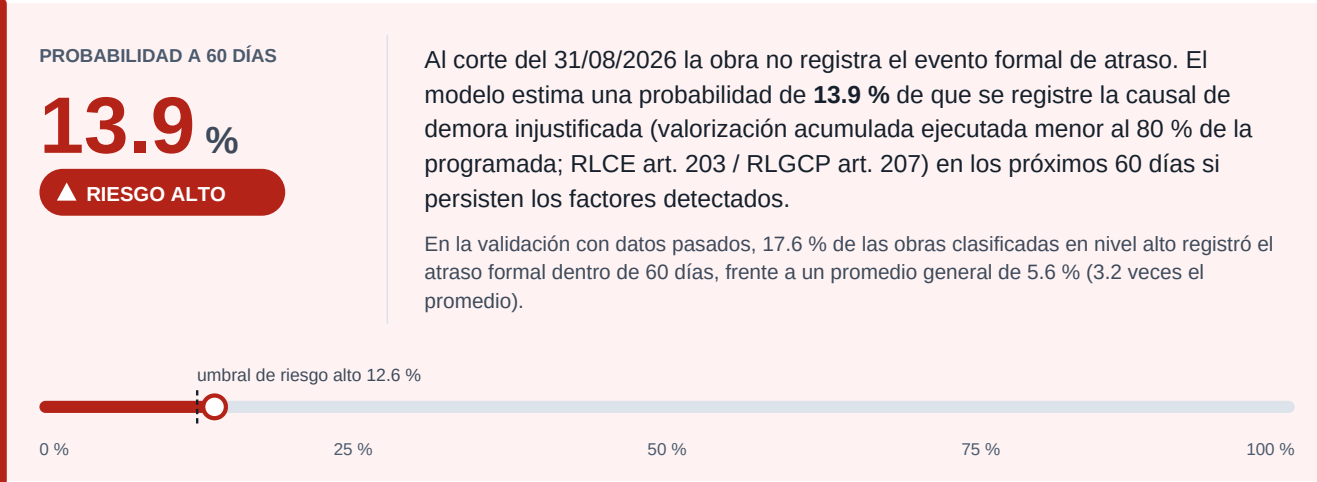


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	343 desde 08/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	SALDO DE OBRA PARALIZADA DE LA ETAPA I Y ETAPA II DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA CON CUI N° 2114085
Entidad contratante	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Contratista	CONSORCIO PLAZA 241
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CALLERIA / CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Código Único de Inversión (CUI)	2114085
Inversión asociada	REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA
Función	JUSTICIA
Identificador del contrato (SEACE)	2369399
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 102,752,739.00
Cuaderno de obra digital	343 asientos entre 08/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

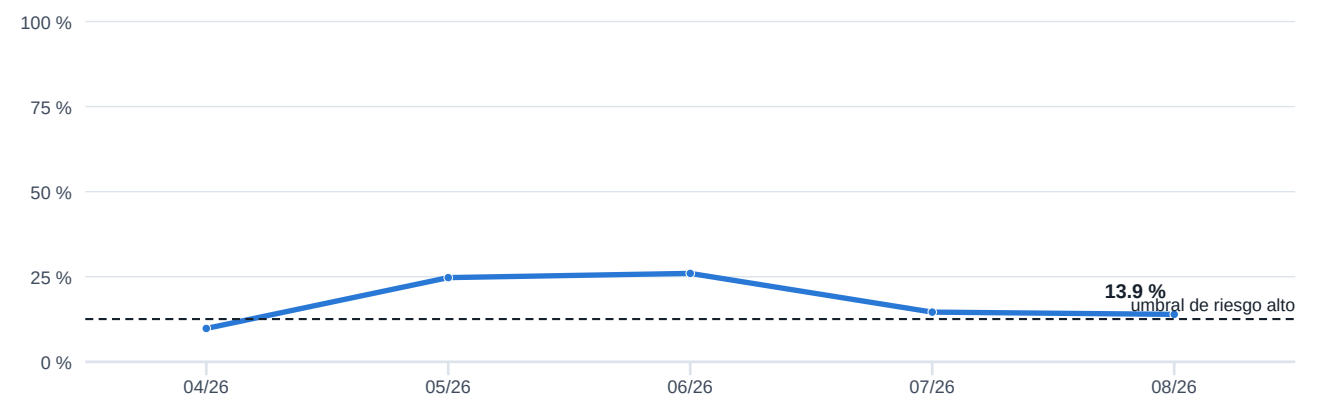

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.503
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.204
El 15 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.201
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.103
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.093
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,572,511	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.087
Extensión media de los asientos recientes: 1,144 caracteres	Contenido de los asientos		-0.084
101 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.066

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	13.9 %	13.3 %	-0.6 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.9 %	13.8 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.9 %	14.5 %	+0.5 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 342 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 30/08/2026

...por la huelga indefinida en la region ucayali, con un plazo de siete (07) dias calendarios, correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de agosto al 17 de agosto del presente por la causal por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, y al amparo de lo dispuesto en los art. 198.1 literal a), art. 200.1 literal a), del reglamento de la ley n32069, ley general de contrat...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 339 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_INSP · 28/08/2026

...u reglamento no facultan al contratista a decretar una "paralizacion material" ni a suspender unilateralmente la obra. la detencion de los frentes de trabajo decidida por el contratista constituye un atraso imputable a su gestion, no configurando causal de ampliacion de plazo ni reconocimiento de mayores gastos generales. el tiempo que transcurra bajo esta paralizacion no autorizada sera computado como...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 340 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_INSP · 28/08/2026

... totalidad lo expuesto en el asiento n 336 y se ordena retomen la continuidad inmediata de todos los frentes de obra, bajo apercibimiento de aplicar las penalidades contractuales correspondientes por retraso injustificado y dar cuenta a la entidad para las acciones administrativas a que haya lugar.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 340 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_INSP · 28/08/2026

...onal. finalmente y conforme a lo senalado precedentemente, se desestima en su totalidad lo expuesto en el asiento n 336 y se ordena retomen la continuidad inmediata de todos los frentes de obra, bajo apercibimiento de aplicar las penalidades contractuales correspondientes por retraso injustificado y dar cuenta a la entidad para las acciones administrativas a que haya lugar.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 336 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 27/08/2026

...cadas en su asiento n 328 y 329 al haber alcanzado el monto maximo permisible indicado en la ley de presupuesto del sector publico para el ano fiscal, ascendente a s/. 4 300,000.00 - art. 186.3 y por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista art. 198.1 literal a) del reglamento de ley n32069, ley general de contrataciones publicas y lo que imposibilita la continuidad de la eje...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 333 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_INSP · 26/08/2026

...indicadas en los asientos n. 311 y 312, bajo su entera responsabilidad contractual y legal. - el abandono o detencion no autorizada de la obra sera calificado como retraso injustificado, sujeto a las penalidades por mora contractuales y de ley. - reiteracion del deslinde de responsabilidad (asiento n. 312): el retraso en la reposicion del cerco perimetrico y torreones es de exclusiva responsabilidad del co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 335 · Ampliaciones de plazo · SOEC_INSP · 26/08/2026

...les y la reposicion del cerco perimetrico (6.35 ml) y torreones de vigilancia notificados en los asientos n. 311 y 312. el tiempo acumulado por esta detencion no autorizada se considerara como mora e incumplimiento imputable al contratista para la aplicacion de las penalidades contractuales a que hubiere lugar, reiterando el completo deslinde de responsabilidad administrativa, civil y penal de la entidad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 324 · Respuestas a consultas · SOEC_INSP · 25/08/2026 EVALUACIÓN Y OBSERVACIÓN A LA CARTA N° 020-2026-CPP/LAGM-R E INFORME TÉCNICO N° 18 DE MECÁNICA DE SUELOS (REF. ASIENTO N° 299, 213 Y 214): ///<i>...VIENE DEL ASIENTO N° 3232. FALTA DE DELIMITACIÓN Y OMISIÓN EN EL DESCUENTO DE METRADOS CONTRACTUALES (ASIENTO N° 214):En el Asiento N° 214 se requirió expresamente delimitar el área de intervención y descontar todos los sectores y metrados que ya se encuentran contemplados ...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 296 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026 <i>... instalaciones del minjusdh a horas 11.00 am en la ciudad de lima, motivo por el cual mi persona se ausentara de obra 02 días para estar presente en la reunion.en ese sentido, no estare inmerso a las penalidades indicadas en el ítem 02 del numeral 3.17 otras penalidades indicadas en las bases.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 187 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 13/07/2026 RESPUESTA A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES Y APROBACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE ACERO LISO 5/8" (REF. ASIENTO N° 151): <i>En atención al Asiento N° 151 del Residente de Obra, mediante el cual presenta la subsanación de las observaciones formuladas en el Asiento N° 146 respecto a la ficha técnica de Acero Liso 5/8". Se ha procedido con la evaluación correspondiente, determinando lo siguiente:1. Se verifica que la documen...</i> Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
