


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratacion de ejecucion de obra: Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable desagüe- redes distribucion conexiones domiciliarias y planta de tratamiento de aguas residuales localidad crucero, distrito de crucero - carabaya - puno, CUI 2142933

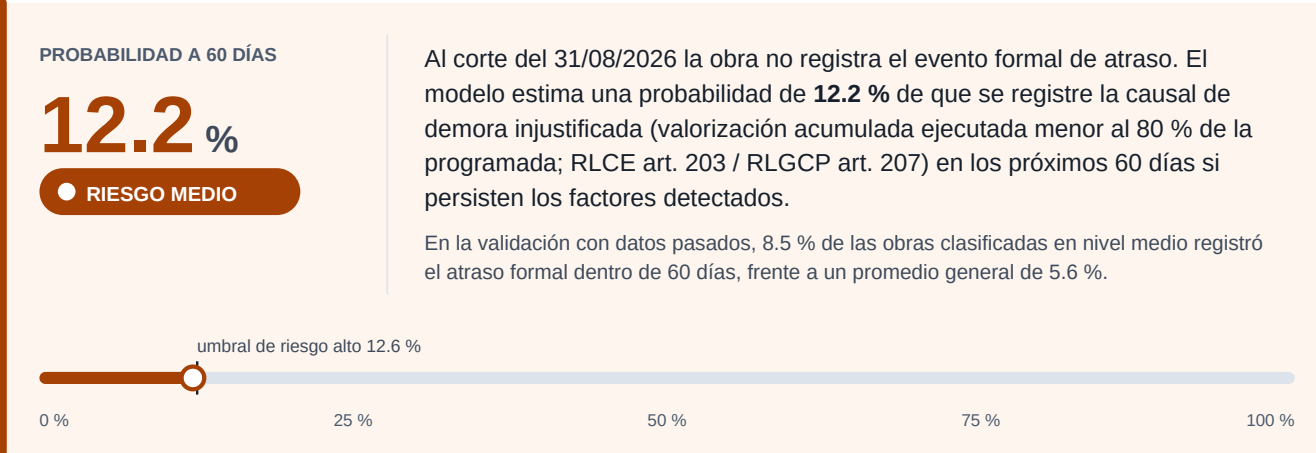


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	60 días	168 desde 21/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGUE- REDES DISTRIBUICION CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO, CUI 2142933
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR AYAVIRI
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CRUCERO / CARABAYA / PUNO
Código Único de Inversión (CUI)	2142933
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESAGUE- REDES DISTRIBUICION CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2386587
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 5,403,322.00
Cuaderno de obra digital	168 asientos entre 21/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

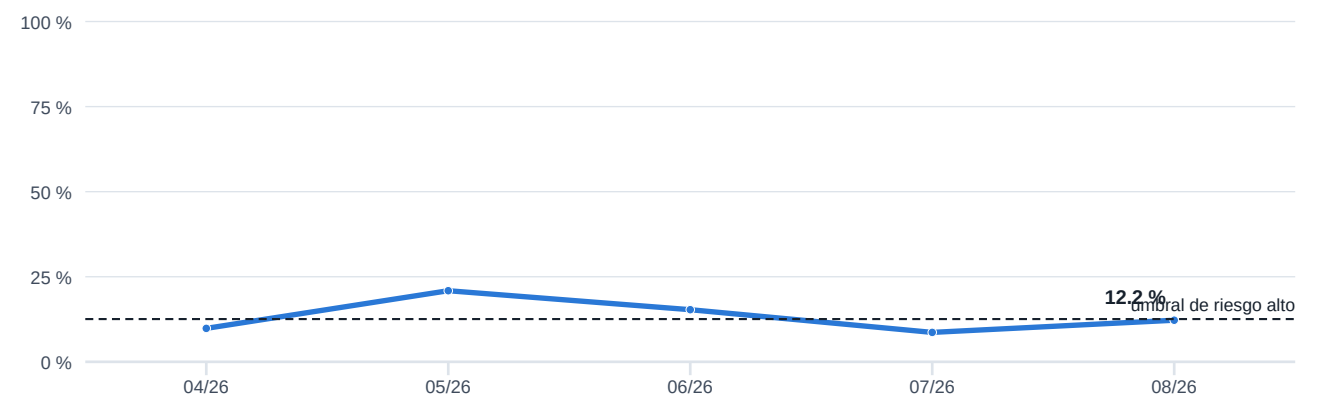

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.490
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.197
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.108
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.071
Se ha gastado el 23 % del monto aprobado de la inversión	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.066
Extensión media de los asientos recientes: 1,453 caracteres	Contenido de los asientos		-0.063
El 48 % de los asientos de los últimos 60 días menciona deficiencias del expediente técnico	Contenido de los asientos		+0.062

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.2 %	12.2 %	-0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 162 · Consultas · SOEC_RESI · 25/08/2026

CONSULTA DE INCIDENCIAS EN OBRA N°10 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO A LA POTENCIA DE GRUPO ELECTRÓGENO.: Se deja Constancia que Mediante CARTA N°072-2026-CGQ/RC del 25/08/2026 el Contratista presentó su Consulta de Incidencias en Obra N°10 – Especificaciones Técnicas respecto a la Potencia de Grupo Electrónico. En dicho documento se adjuntan los informes del residente y del especialista en mecánica eléctrica res...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 159 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

...utados en el periodo del 17 al 22 de agosto 2026 viene del asiento n 158 y por la tarde de 1:30pm a 3:30 pm y hoy sabado a ocurrido otra precipitacion de 12: 50 hasta las 3:45 pm causando atraso en los trabajos, se solicita la evaluacion del supervisor de obra, para los fines del caso.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 158 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

...1.08 puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) otras ocurrencias. el dia martes 18 /08/2026 sucedio la presencia de precipitaciones pluviales y fuertes vientos causando atraso en la ejecucion de la obra por el tiempo 8:10 am a 10:00 am . van

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 152 · Consultas · SOEC_SPV · 20/08/2026

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL PLANO DE REPLANTEO DE LA RED DE ALCANTARILLADO: En atención al Asiento N° 149 del Residente de Obra, de fecha 13/08/2026, mediante el cual se presenta a esta Supervisión el plano de replanteo correspondiente al componente Red de Alcantarillado, para su revisión y evaluación, esta Supervisión procedió a verificar la documentación técnica presentada y su correspondencia con la...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 157 · Constatación física de la obra · SOEC_SPV · 20/08/2026

VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES MEDIO AMBIENTALES: VIENE DEL ASIENTO N° 156 Finalmente, se recomienda al Contratista mantener de manera permanente las condiciones adecuadas de orden, limpieza y manejo ambiental en los frentes de trabajo, así como disponer oportunamente de los equipos y elementos necesarios para la prevención y control de posibles impactos ambientales, a fin de evit...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 129 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 09/07/2026

...0 kg/cm2 34% validado a la altura de 1.20 m. se tomaron muestras de concreto (probetas). 04.07.04.03.02 encofrado y desencofrado 34% validado para el sector vaciado. 04.07.04.03.03 acero fy=4200 kg/cm2 80% validado. corresponde al acero vertical habilitado y amarrado para la altura total/siguiente vaciado. 3. disposiciones y control de calidad efectos de proceder con la aprobacion formal y posterior va...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.° 30225, D.S. N.° 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.° 32069, D.S. N.° 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
