


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratacion para la ejecucion de la obra ¿mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y saneamiento básico de las localidades de lucmillo, el lirio y el castillo del distrito de san silvestre de cochan - provincia de san miguel - departamento de cajamarca CUI N° 2515057

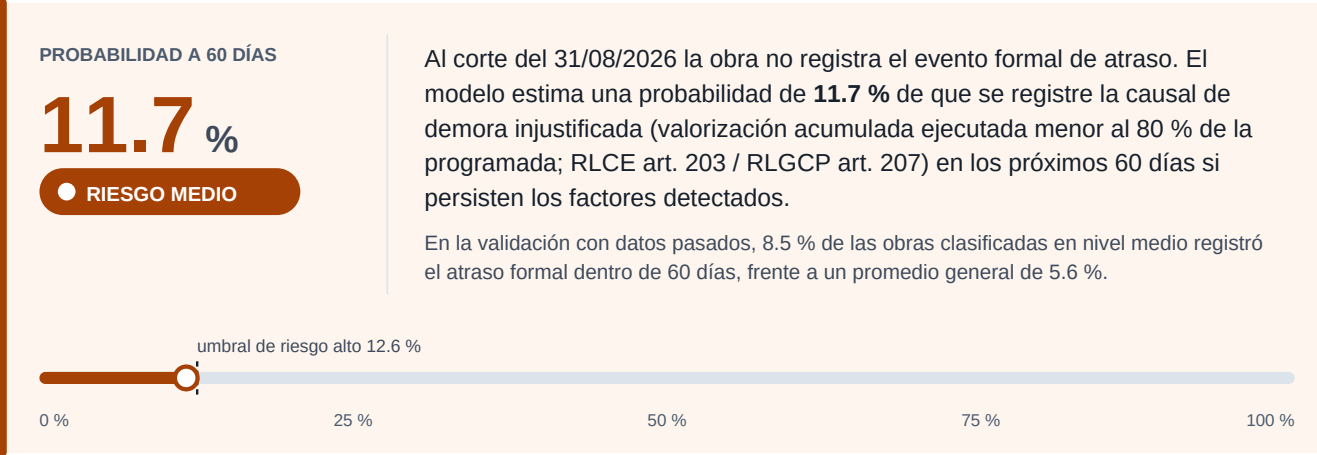


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	119 desde 30/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE LUCMILLO, EL LIRIO Y EL CASTILLO DEL DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI N° 2515057
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN
Contratista	CONSORCIO HIDROTEC PERÚ
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN SILVESTRE DE COCHAN / SAN MIGUEL / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2515057
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE LUCMILLO, EL LIRIO Y EL CASTILLO DEL DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2402611
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,626,058.96
Cuaderno de obra digital	119 asientos entre 30/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

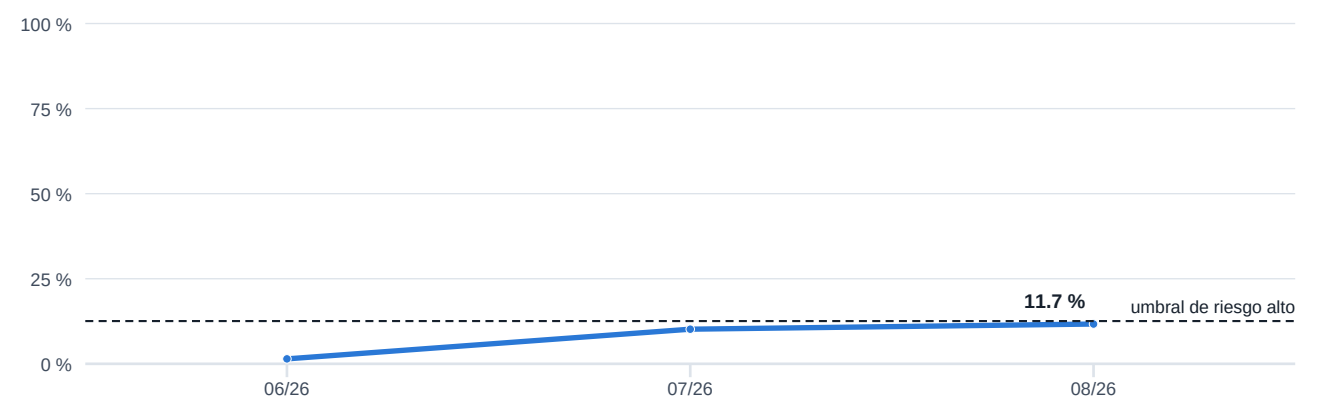

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.52 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.482
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.185
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.144
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.088
Extensión media de los asientos recientes: 1,521 caracteres	Contenido de los asientos		-0.077
Hubo registros en el cuaderno 22 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.061
Departamento: Cajamarca	Características de la obra		-0.046

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	11.7 %	11.5 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 117 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

CONTINUIDAD DE PARTIDAS DE ALBAÑILERÍA, CIMENTACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE FRENTES: En atención al Asiento N.º 113 del Residente de Obra, esta Supervisión toma conocimiento de la continuidad de los trabajos de albañilería, cimentación, sobrecimientos, acero estructural y abastecimiento de materiales en las localidades de El Castillo, Lucmillo y El Lirio. Respecto de la partida Muro de ladrillo King Kong 18 huecos, aparej...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 84 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 19/08/2026

...e la programacion de agosto debe ejecutarse con prioridad absoluta sobre las cadenas criticas de ubs y con control reforzado sobre el lirio sistema n. 01 y la definicion tecnica del sistema n. 02. el atraso de julio hace insuficiente limitarse al cumplimiento nominal del 20.39% mensual programado si se pretende recuperar la linea base acumulada. en consecuencia, corresponde requerir a la contratista un...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 75 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

...endo la disponibilidad oportuna de personal, materiales, equipos y demas recursos necesarios para el cumplimiento de las metas programadas, adoptando oportunamente las acciones necesarias para evitar atrasos. la contratista mantiene plena responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos, calidad de los materiales, procedimientos constructivos, seguridad de los trabajadores y cumplimiento del ex...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 67 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N.º 65 – PRECISIÓN SOBRE CONSULTA TÉCNICA N.º 01 – SISTEMA N.º 02 EL LIRIO: En atención al Asiento N.º 65 del Residente de Obra, mediante el cual efectúa precisiones respecto a la referencia al numeral 190.5 del Reglamento de la Ley N.º 32069 consignada por esta Supervisión en el Asiento N.º 63, se deja constancia de lo siguiente: La referencia efectuada por esta Supervisión al numeral 190.5 del R...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 66 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

... materiales, equipos y controles de calidad necesarios, debiendo ejecutar las actividades conforme al programa de ejecucion de obra vigente y adoptar oportunamente las acciones necesarias para evitar atrasos imputables a su organizacion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 61 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

...sobrecimiento.sobre lo indicado posteriormente en el asiento n. 57, de fecha 06/08/2026 a horas 21:50, respecto a que no se habria recibido pronunciamiento de la supervision y que ello podria generar retrasos en la programacion de obra, corresponde precisar que el 06 de agosto de 2026 fue feriado nacional por conmemorarse la batalla de junin.en consecuencia, no corresponde atribuir a la supervision demo...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

... de instalacion, pruebas hidraulicas, desinfeccion, relleno y compactacion.se advierte que la supervision podra disponer la paralizacion parcial de los trabajos o la correccion inmediata de cualquier incumplimiento tecnico que pudiera advertirse durante la ejecucion.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 08/07/2026

...visto por la normativa. no obstante, el contrato de obra n.002-2026-mdssc/gm, que constituye el instrumento que regula la ejecucion contractual entre las partes, establece expresamente en su tabla de penalidades que el plazo para la presentacion del citado informe es de 15 dias calendario contados desde la suscripcion del acta de inicio del plazo de ejecucion de obra. en consecuencia, existe una contradic...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
