

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las urbanizaciones los almendros, el rosario, avidge, el remanzo, linda vista, las flores e ingenieros (calle 10) distrito de cayma - provincia de arequipa - departamento de arequipa (i etapa)

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

18.8 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **18.8 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 3,716,020.66	180 días	258 desde 11/03/2026	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS URBANIZACIONES LOS ALMENDROS, EL ROSARIO, AVIDGE, EL REMANZO, LINDA VISTA, LAS FLORES E INGENIEROS (CALLE 10) DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (I ETAPA)
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA
Contratista	CONSORCIO POLUX
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CAYMA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2525695
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS URBANIZACIONES LOS ALMENDROS, EL ROSARIO, AVIDGE, EL REMANZO, LINDA VISTA, LAS FLORES E INGENIEROS, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2378779
Monto del contrato	S/ 3,716,020.66
Monto aprobado de la inversión	S/ 14,160,338.60
Cuaderno de obra digital	258 asientos entre 11/03/2026 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

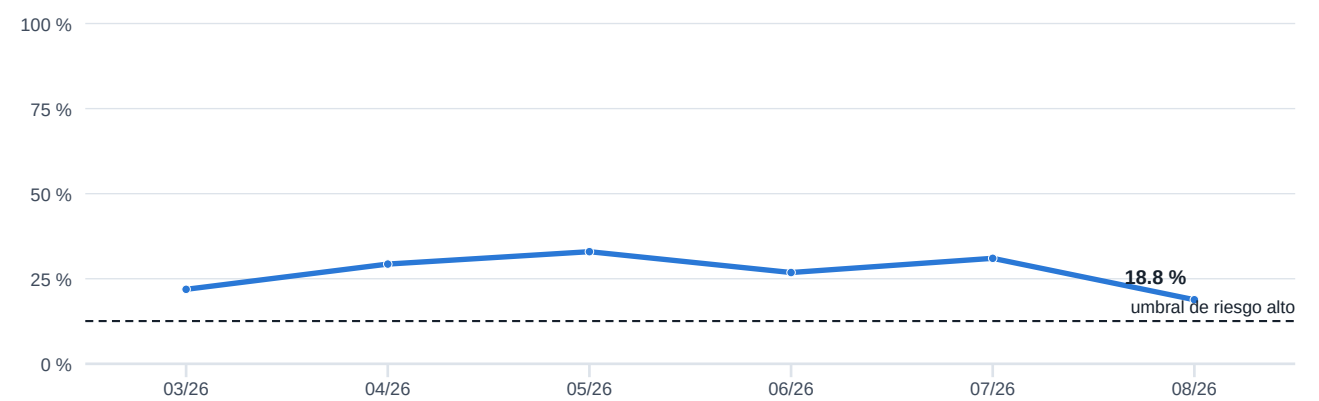

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.544
El 58 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.214
26 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.175
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.166
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.158
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,241,209	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.135
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.090
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.52 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.071

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	18.8 %	18.6 %	-0.2 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	18.8 %	18.8 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	18.8 %	18.8 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	18.8 %	18.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 256 · Órdenes · SOEC_SPV · 28/08/2026

REDUCCION DE METAS EN PRESTACION ADICIONAL N° 01: Se comunica al Contratista que la Prestación Adicional N° 01 contemplaba la ejecución de obras preliminares, entre las cuales estaba la ejecución de los componentes que correspondían a el desvío provisional del canal de riego, revestimiento provisional, control y manejo del agua, restitución, componentes que no se han ejecutado lo que genero reducción de metas de la P...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 254 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

AVANCE DE EJECUCION DE OBRA: Se supervisa los trabajos programados por la residencia de obra, en la Urb. Avidge se continúan con los trabajos de infraestructura vehicular, conformación, encofrado y desencofrado en jardineras, habilitado de acero de refuerzo y encofrado para encimado de buzones, trazo y replanteo durante la obra, Urb. Las Flores se continua con la construcción de red de drenaje, instalación de cerco m...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 243 · Órdenes · SOEC_SPV · 16/08/2026

ATORIZACION DE MODIFICACION DE JARDINERAS DE CONCRETO EN URB. AVIDGE: Se comunica al Contratista en relación a lo anotado en el asiento N° 235 del C.I.O., en el que solicita la modificación de las jardineras de concreto, la Supervisión ha revisado el informe N° 38-2026 donde el Contratista sustenta la necesidad de modificar las jardineras de concreto proyectadas en las bermas de la urbanización Avidge, opinando favora...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 242 · Órdenes · SOEC_SPV · 14/08/2026

CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL PARQUE AVIDGE: Se comunica al contratista que la Entidad ha remitido la carta N° 197-2026-MDC/SGOOPP, en la cual nos comunica diferentes pedidos de los vecinos de la urbanización Avidge, entre los cuales está la posibilidad de mantener o conservar la vereda existente ubicada junto al parque y el acceso de piedra laja actualmente existente en el parque de la mencionada urbaniza...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 237 · Órdenes · SOEC_SPV · 11/08/2026

CAMBIO DE DISEÑO JARDINERAS CIRCULARES DE CONCRETO: Se comunica al contratista en relación a lo anotado en el Asiento N° 235 del C.I.O., donde informa que en la Calle N° 03 el ancho de las bermas Proyectadas No permitirá La construcción De las jardineras circulares Debido Aquel diámetro De la jardinera es mayor que el ancho de la berma, la Supervisión ha verificado en campo lo informado por el contratista, constatand...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 217 · Órdenes · SOEC_SPV · 25/07/2026

MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 2 URB. AVIDGE: Se comunica al Contratista en relación a lo anotado en el asiento N° 213 del CIO, lo siguiente:- Respecto la solicitud de iniciar trabajos de construcción del muro de contención ubicado en la calle N° 02, el contratista deberá demarcar la zona de intervención para la construcción del muro de contención, con la finalidad de que se demuestre en campo que no se afectará el ter...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 210 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/07/2026

...g 0+00, si se ejecutara sardinel sumergido o muro como se indicaba en la solicitud vecinal, la contratista remitió informe técnico sobre dicho punto y a la fecha no se tiene respuesta, lo cual genera retraso en obra, así mismo se solicita definir la disposición del cerco de malla en dicho sector.

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 197 · Órdenes · SOEC_SPV · 18/07/2026**

COMUNICACIONES SISTEMA DE DRENAJE URB. LAS FLORES: Se Comunica al contratista que que la Supervisión le remitió la carta N° 18-2026-SO-JAEA, dónde se le solicita el informe técnico de la alternativa a plantear para la disposición final del sistema de drenaje de la Urb. Las flores, en vista de lo cual el contratista deberá informar sobre si la alternativa elegida conllevará a realizar mayores metrados y/o prestaciones...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 193 · Órdenes · SOEC_SPV · 17/07/2026**

ORDENES Y COMUNICACIONES: Se comunica al Contratista respecto a lo notado en el asiento N° 191 del CIO, sobre el daño provocado por la empresa SEDAPAR a la red a la tubería de la red de drenaje, a consecuencia de realizar reparaciones de la red de agua potable que ellos administran, la rotura de la tubería de drenaje se ha producido en el sector donde los trabajos de instalación de la tubería de drenaje ya estaban co...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
