


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra " mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vias locales del URB. Colonial ii, urb las mercedes i URB. Las cucardas y urb guardia civil iv centro poblado paucarpata distrito de paucarpata, provi

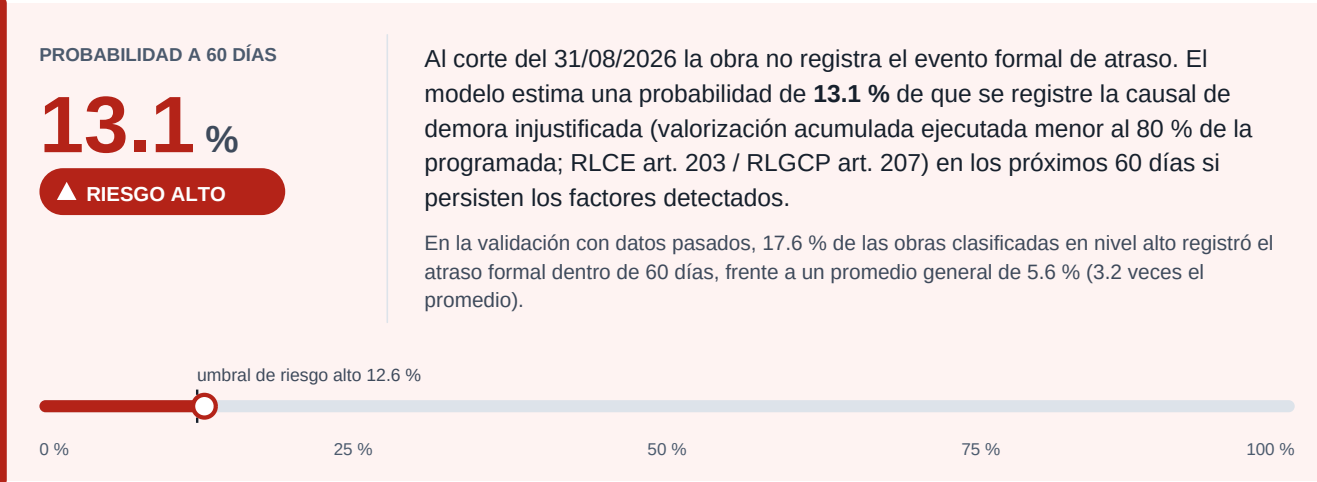


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	200 desde 07/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL URB. COLONIAL II, URB LAS MERCEDES I URB. LAS CUCARDAS Y URB GUARDIA CIVIL IV CENTRO POBLADO PAUCARPATA DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVI
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Contratista	CONSORCIO NEXOIAL
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PAUCARPATA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2653947
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. COLONIAL II, URB. LAS MERCEDES I, URB. LAS CUCARDAS. Y URB. GUARDIA CIVIL IV DISTRITO DE PAUCARPATA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2361226
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,332,866.60
Cuaderno de obra digital	200 asientos entre 07/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

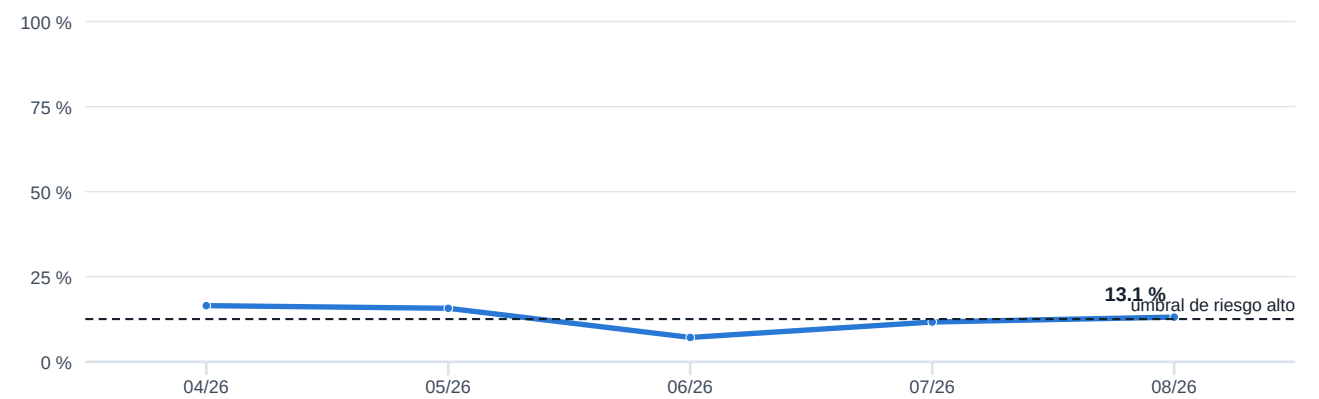

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.551
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.168
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.139
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.139
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.103
Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.093
Extensión media de los asientos recientes: 1,276 caracteres	Contenido de los asientos		-0.090
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.086

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.1 %	13.0 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.1 %	13.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 194 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 26/08/2026

...mision, deficiencia o retiro injustificado de los dispositivos de seguridad y senalizacion sera de exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo adoptar las acciones correctivas inmediatas bajo apercibimiento de comunicar el incumplimiento a la entidad para las acciones administrativas y contractuales que correspondan.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 194 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 26/08/2026

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA: Al haberse aperturado las vías del proyecto al transito peatonal y vehicular, la Supervisión deja constancia que el Contratista mantiene la obligación permanente de implementar, conservar y reforzar los dispositivos de seguridad peatonal y vehicular, así como la señalización preventiva, informativa y restrictiva en las vías intervenidas y zonas adyacentes, mientras no se haya produci...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 166 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 31/07/2026

RESPUESTA A CONSULTA: INTERSECCION AV. GUARDIA CIVIL - CALLE RUA LOS ALAMOS: En atención a la consulta formulada por el contratista mediante el asiento correspondiente del cuaderno de incidencias y la Carta N° 083-2026-CNV-MDP, referida a definir si corresponde intervenir las áreas de martillos con pavimento adoquinado ubicadas en la zona de empalme con la vía adoquinada existente ejecutada por el Gobierno Regional d...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 142 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 06/07/2026

..., por motivos de seguridad y marcha del personal quedan paralizadas todas las actividades en obra, se hace mencion que todas las partidas en ejecucion criticas y no criticas paralizadas provocaran un atraso en la ejecucion de obra por causas que no son atribuibles a la contratista por tratarse de una paralización de caracter regional convocada por el sindicato de trabajadores de construccion civil.dich...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 139 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 03/07/2026

...ace de conocimiento a la supervision, que debido a esta paralización los trabajos en obra se veran afectados , se hace mencion que todas las partidas en ejecucion criticas y no criticas provocaran un atraso en la ejecucion de obra, por causas que no son atribuibles a la contratista por tratarse de una paralización de caracter regional convocada por el sindicato de trabajadores de construccion civil.asi...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 138 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 03/07/2026

ATENCIÓN A OPINION TECNICA DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01: Se hace de conocimiento sobre la Carta N°040-2026/ACC-MDP-CUC que contiene la opinión técnica de supervisión respecto a la solicitud de la ampliación de plazo N°01 alcanzado por el contratista mediante Carta N°072-2026-CNV-MDP de fecha 26.06.2026, y que fue tramitado a la entidad de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del Reglamento de la L...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
